


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600077660 de 2018

FECHA: 7 de Febrero de 2019 – 30 de Marzo de 2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN –
Secretaría De Suministros Y Servicios

CONTRATISTA: SUMIMAS S.A.S.

NIT: 830.001.338-1

REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Robledo Velez

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 79.249.787

OBJETO: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

VALOR INICIAL: \$5.379.299.308 (cinco mil trescientos setenta y nueve millones doscientos noventa y nueve mil trescientos ocho pesos M/L)

ADICIONES: N/A

VALOR MAS ADICIONES: \$5.379.299.308 (cinco mil trescientos setenta y nueve millones doscientos noventa y nueve mil trescientos ocho pesos M/L)

DURACIÓN INICIAL: Sesenta y siete (67) días


AMPLIACIONES: Ampliación 1: Cuarenta y cinco (45) días
Del 01/01/2019 al 15/02/2019
Ampliación 2: Cuarenta y tres (43) días
Del 16/02/2019 al 30/03/2019

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: Ciento cincuenta y cinco (155) días

FECHA DE INICIO: 25/10/2018 (veinticinco de octubre de dos mil dieciocho)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/03/2019 (treinta de marzo de dos mil diecinueve)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **4600077660** de 2018 se presenta el segundo Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contrato realizado a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC- con la orden de compra 32411, ha permitido contar con los computadores de escritorio requeridos por las secretarías que hicieron parte de esa adquisición. Este contrato está compuesto por tipos de equipos ETP 1.4, ETP 1.6 y ETP 1.12, los cuales están distribuidos de la siguiente forma:

SECRETARIA	ETP 1.12	ETP 1.4	ETP 1.6	TOTAL
COMUNICACIONES	5	7		12
CULTURA CIUDADANA		9		9
DAGR		8		8
DESARROLLO ECONOMICO		45		45
EDUCACION		84	978	1.062
EVA y CONTROL	11	14		25
GESTION HUMANA Y SC		65		65
HACIENDA	6	417		423
INCLUSION SOCIAL	2	74		76
MEDIO AMBIENTE	20			20
MOVILIDAD	5	387		392
MUJERES	6	9		15
PLANEACION	2	14		16
SALUD	1	14		15
SUMINISTROS		9		9
TOTAL	58	1156	978	2.192

- Entre el 21 y el 22 de enero de 2019 fueron entregados, en cada secretaría, 769 equipos correspondientes al ETP 1.4, posteriormente se realizó la revisión técnica correspondiente.
- Entre el 1 y 5 de Febrero de 2019 fueron entregados, en cada secretaría:
 - 58 equipos correspondientes al ETP 1.12
 - 882 equipos del ETP 1.6 en la secretaría de Educación.
 - 69 equipos del ETP 1.4 en la Secretaría de Movilidad
- El 25 de Febrero de 2019 fueron entregados los 96 equipos del ETP 1.6 que faltaban por entregar a la Secretaría de Educación.
- El 27 de marzo de 2019 fueron entregados los 318 equipos del ETP 1.4 que faltaban para la Secretaría de Movilidad.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:


Fecha Documento	Fecha de cobertura de la certificación del pago realizado al sistema de seguridad social integral	Firmado por Revisor Fiscal
18/03/2019	Últimos seis (6) meses	Carlos Alberto Alvarez Arbelaez TP No. 17811-T




CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ART 376 DE LA LEY 1819 DE 2016.

En nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de **SUMIMAS S.A.S.**, identificada con NIT 830.001.338-1, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), durante los últimos seis (6) meses, y se rigen bajo la norma del impuesto sobre auto retención a título de impuesto sobre la renta de la cual la compañía es sujeto pasivo, a partir del 1 enero de 2017 según decreto 2201 del 30 de Diciembre de 2016 y lo dispuesto en el artículo 376 de la ley 1819 de 2016 que deroga el cree.


Dada en Bogotá D.C. a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2019.


JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
 C.C 79.249.787 DE SUBA
 REPRESENTANTE LEGAL.


CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ
 REVISOR FISCAL
 TARJETA PROFESIONAL No. 17.811-T
 C.C 19.178.816 de Bogotá

- A la fecha se ha registrado la solicitud de marcación para 348 equipos de las siguientes Secretarías:

SECRETARIA	ETP 1.4	ETP 1.12
Mujeres	9	6
Comunicaciones	7	5
Evaluación y Control	14	11
Hacienda	7	
Cultura Ciudadana	9	
Gestión Humana	15	
Desarrollo Económico	45	
medio Ambiente	20	
Inclusión Social	74	2
Movilidad	69	5
Gestión Humana	50	

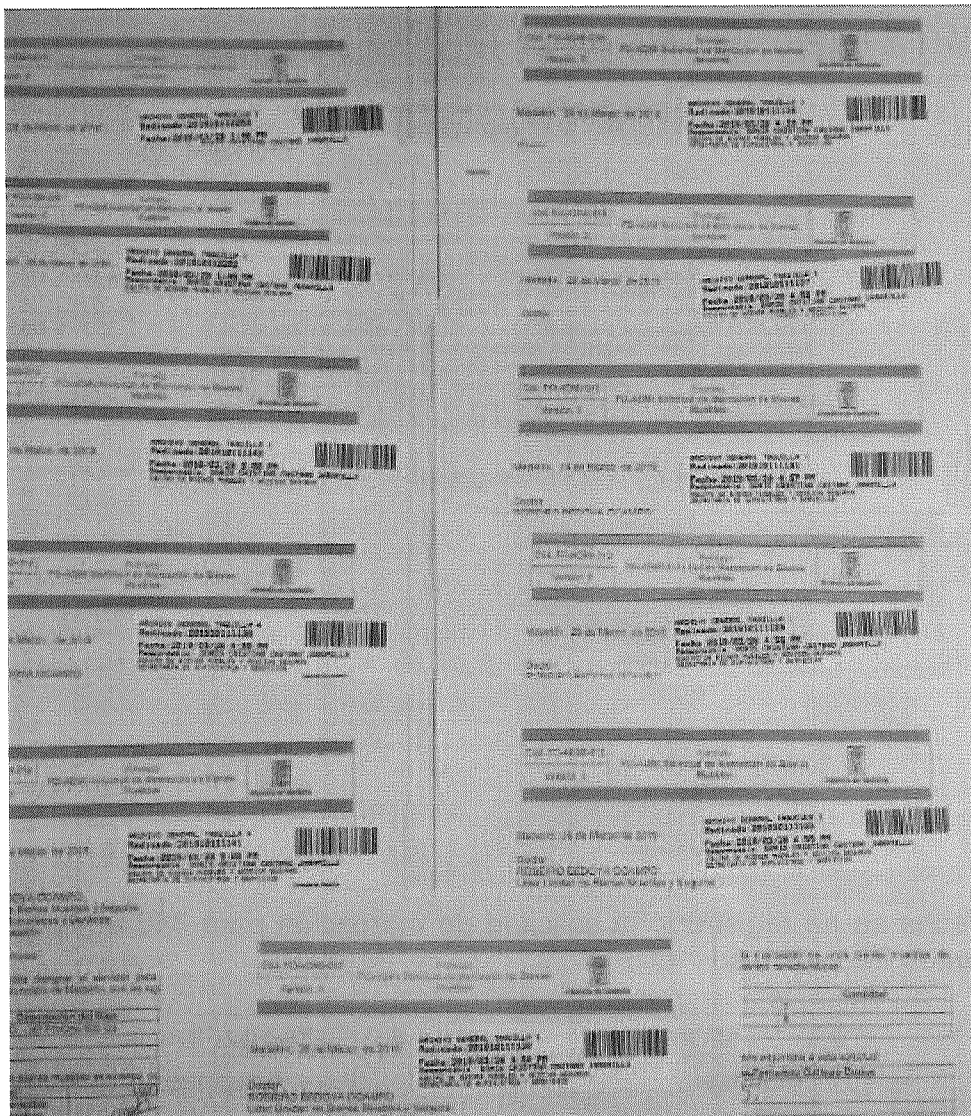

- Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos en la etapa precontractual
- A la fecha se han realizado dos modificaciones al contrato:
 - Ampliación 1: cuarenta y seis (46) días adicionales para asegurar que el contratista entregue los productos toda vez que actualmente la industria de fabricación de computadores se encuentra en presencia de un desabastecimiento de procesadores de marca INTEL a nivel mundial y por ende el contratista no tiene suficiente inventario
 - Ampliación 2: cuarenta y tres (43) días adicionales debido a la terminación del ciclo de vida de la referencia **ProOne 600 G3** y migración a la referencia **EliteOne 800 G4**, caso no imputable al contratista y con ocasión a este se ha

imposibilitado el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el tiempo y forma establecido.

- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato.
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación del contratista.

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600077660 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 4 Terminado
 Objeto del Contrato: Suministro de infraestructura tecnológica de hardware

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (sendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASESORAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARATASCALES Y SALARIOS	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ERECTIFICACIONES	4
Tecnico	DEVELOPCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	REGULARIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4

4

Ponder:	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	81,00
	17,00	16,00	16,00	32,00	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
160070118	70200000	23390520	160401	4000093235	9012933	4500012869
160000118	71300000	23450211	160087	4000093243	9012933	4500012863
160020118	73300000	23470211	160398	4000093369	9012933	4500012861
160070118	75100000	23310310	160451	4000093425	9012933	4500012867

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
160090118	75100000	23310310	160454	4000093425	9012933	4500012867
160090118	75100000	23310310	160468	4000093425	9012933	4500012867
160070118	75100000	23320310	160474	4000093425	9012933	4500012867
160070118	71100000	23360211	160347	4000093296	9012933	4500012891
160022917	71100000	23360211	160347	4000093171	9012933	4500012891
160070168	71100000	23360310	160316	4000093171	9012933	4500012891
160021517	70300000	23390520	160371	4000094414	9012933	4500012866
160000118	70600000	23390520	160191	4000093219	9012933	4500012885
160000118	70600000	23390520	160184	4000093246	9012933	4500012885
160000118	70400000	23390520	160434	4000093274	9012933	4500012880
160000118	70400000	23390520	160129	4000093273	9012933	4500012880
160022618	70400000	23390520	160390	4000093271	9012933	4500012880
160000118	70400000	23390520	160434	4000093455	9012933	4500012880
160000118	70400000	23390520	160129	4000093474	9012933	4500012880
160022618	70400000	23390520	160390	4000093443	9012933	4500012880
160000118	72200000	23370430	160315	4000093319	9012933	4500012889
160090118	72200000	23440320	160256	4000093319	9012933	4500012889
160090118	72200000	23440410	160220	4000093319	9012933	4500012889
160070118	72200000	23440320	160305	4000093319	9012933	4500012889
160070118	72200000	23440310	160320	4000093319	9012933	4500012889
160090118	72200000	23360320	160225	4000093319	9012933	4500012889
160090118	72200000	23440320	160177	4000093319	9012933	4500012889
160090118	72200000	23440320	160301	4000093319	9012933	4500012889
160000118	74300000	23350211	160185	4000093242	9012933	4500012890
160000118	74300000	23350211	160211	4000093244	9012933	4500012890
160000118	74300000	23350410	160190	4000093244	9012933	4500012890
160000118	74300000	23350520	160194	4000093244	9012933	4500012890
160090117	74300000	23350211	160185	4000093370	9012933	4500012890
160000118	74300000	23350211	160185	4000093370	9012933	4500012890
160000118	72300000	23440320	160419	4000093251	9012933	4500012872
160090118	72300000	23440320	160420	4000093251	9012933	4500012872
160000118	72300000	23440310	160421	4000093251	9012933	4500012872
160000118	72300000	23440520	160425	4000093251	9012933	4500012872
160000118	72300000	23440310	160427	4000093251	9012933	4500012872
160000118	76100000	23390430	160411	4000093252	9012933	4500012870
160000118	76100000	23390430	160415	4000093304	9012933	4500012870
160400118	72100000	23320520	160274	4000093214	9012933	4500012881
160000118	70700000	23390520	160206	4000094441	9012933	4500012893


- Información final de reservas o cambios presupuestales:

El proveedor SUMIMAS S.A.S en comunicación radicada con fecha del 06 de diciembre de 2018 solicita realizar ampliación al presente contrato en tanto que existe un evento de caso fortuito (desabastecimiento de procesadores de marca INTEL a nivel mundial) no imputable al contratista y con ocasión a este se ha imposibilitado el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el tiempo y forma establecido.

Se amplía hasta el 15/02/2019. Como es aprobada la ampliación del contrato, se procede a realizar la solicitud de constitución de reserva para los recursos destinados para este fin por cada una de las Secretarías.

• Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012869	\$ 29.188.950	SUMF45626	26/03/2019	5000565169	\$ 14.622.124	\$ 14.566.826	50%
		SUMF45889	26/03/2019	5000565036	\$ 14.566.826	\$ -	100%
4500012863	\$ 18.799.873	SUMF45626	26/03/2019	5000565172	\$ 18.799.873	\$ -	100%
4500012861	\$ 16.711.000	SUMF45626	26/03/2019	5000565173	\$ 16.711.000	\$ -	100%
4500012866	\$ 61.291.265	SUMF45626	26/03/2019	5000565193	\$ 29.244.248	\$ 32.047.017	52%
		SUMF45889	26/03/2019	5000565042	\$ 32.047.017	\$ -	100%
4500012867	\$ 93.999.375	SUMF45626	26/03/2019	5000565175	\$ 50.132.999	\$ -	100%
			26/03/2019	5000565177	\$ 33.422.001		
			26/03/2019	5000565178	\$ 6.266.625		
			26/03/2019	5000565179	\$ 2.088.876		
4500012880	\$ 888.541.065	SUMF45626	26/03/2019	5000565192	\$ 2.088.874	\$ 17.480.191	98%
			26/03/2019	5000565195	\$ 156.665.624		
		26/03/2019	5000565196	\$ 480.441.250			
		26/03/2019	5000565197	\$ 233.954.000			
		SUMF45889	26/03/2019	5000565048	\$ 11.653.461	\$ -	100%
			26/03/2019	5000565049	\$ 5.826.730		
4500012889	\$ 160.403.480	SUMF45626	26/03/2019	5000565198	\$ 31.333.125	\$ 5.825.730	96%
				5000565200	\$ 18.799.875		
				5000565201	\$ 8.355.500		
				5000565202	\$ 4.177.750		
				5000565203	\$ 2.088.875		
				5000565204	\$ 62.666.250		
				5000565205	\$ 8.355.500		
				5000565206	\$ 18.799.875		
		SUMF45889	26/03/2019	5000565050	\$ 5.826.730	\$ -	100%
4500012888	\$ 58.267.301	SUMF45889	26/03/2019	5000565051	\$ 11.653.461	\$ -	100%
			26/03/2019	5000565052	\$ 34.960.379		
			26/03/2019	5000565053	\$ 11.653.461		
4500012890	\$ 822.961.450	SUMF45626	26/03/2019	5000565208	\$ 137.865.750	\$ 678.829.075	18%
			26/03/2019	5000565209	\$ 6.266.625		
		SUMF45889	26/03/2019	5000565135	\$ 14.566.826	\$ 664.262.249	19%
4500012870	\$ 35.070.980	SUMF45626	26/03/2019	5000565211	\$ 4.177.750	\$ 5.826.730	83%
			26/03/2019	5000565235	\$ 25.066.500		
		SUMF45889	26/03/2019	5000565136	\$ 5.826.730	\$ -	100%
4500012872	\$ 36.280.064	SUMF45626	26/03/2019	5000565480	\$ 2.088.875	\$ 17.480.190	52%
			26/03/2019	5000565481	\$ 4.177.750		
			26/03/2019	5000565482	\$ 2.088.875		
			26/03/2019	5000565483	\$ 4.177.750		
			26/03/2019	5000565484	\$ 6.266.624		
			26/03/2019	5000565450	\$ 5.826.730		
		SUMF45889	26/03/2019	5000565526	\$ 2.913.365	\$ -	100%
			26/03/2019	5000565451	\$ 2.913.365		
			26/03/2019	5000565454	\$ 5.826.730		
4500012881	\$ 32.157.614	SUMF45627	26/03/2019	5000564990	\$ 32.157.614	\$ -	100%
4500012885	\$ 135.776.875	SUMF45626	26/03/2019	5000565367	\$ 31.333.125	\$ -	100%
		SUMF45626	26/03/2019	5000565380	\$ 104.443.750		
4500012891	\$ 2.971.050.138	SUMF45626	26/03/2019	5000565430	\$ 175.465.486	\$ 2.795.584.652	6%
		SUMF45889	26/03/2019	5000565431	\$ 1.803.695.409	\$ -	100%
26/03/2019	5000565432		\$ 991.889.243				
4500012893	\$ 18.799.875	SUMF45626	26/03/2019	5000565623	\$ 18.799.875	\$ -	100%
TOTAL	\$ 5.379.299.305				\$4.715.037.056		88%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$5.379.299.308
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$5.379.299.308
Pagos realizados	\$4.715.037.056
Porcentaje de ejecución financiera	88%


4. INFORME JURÍDICO:

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido va en un 88%.
- El servicio o el bien se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.
- Estado de las garantías del contrato:
 Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario." Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018.



ROCÍO DEL CARMEN ARENAS LADINO
 Supervisora

Revisó:
 Gabriel Jaime Rincon Tabares
 Apoyo Jurídico



Revisó:
 Lina María Muñoz B. *Lina IXI*
 Apoyo Administrativo, financiero y Contable
