



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA,
CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS DEL
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ
CONTRATO N°1020 DE 2019**


INFORME DE INTERVENTORÍA

PERIODO: 01/07/2020 – 30/07/2020



Bogotá D.C., agosto de 2020

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| NOMBRE DEL INFORME | Informe de interventoría 01/07/2020 – 30/07/2020 | | |
| Revisión N° | 1 | | |
| Fecha de Revisión | 10/08/2020 | | |
| Responsable por elaboración | | | |
| CARGO | Equipo de Interventoría | | |
| Responsable por revisión | | | |
| NOMBRE | Emmanuel Ospina |  | |
| CARGO | Representante Legal (S) | | |

CONTENIDO

| | Pág. |
|---|------------|
| 1. OBJETO | 16 |
| 2. CONTRATO NO. 1020 DE 2019 | 17 |
| 2.1 FICHA TÉCNICA | 17 |
| 2.2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | 18 |
| 2.2.1 Actas de reunión seguimiento | 18 |
| 2.2.2 Personal de interventoría..... | 19 |
| 2.2.3 Matriz de autocontrol | 30 |
| 2.2.4 Comunicaciones | 30 |
| 2.3 ESTADO GENERAL FINANCIERO | 73 |
| 2.3.1 Contrato No.1020-2019 – Consorcio Smarty Scain 2019..... | 73 |
| 2.3.2 Contrato No.914-2019 – Empresa Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.. | 73 |
| 2.3.3 Contrato No. 756 -2019 – CODENSA S.A. E.S.P..... | 74 |
| 2.3.4 Contrato No. 780-2019 – UT Servicios Mnto Vigilancia Ciudadana 2019..... | 75 |
| 2.3.4 Instrumento de agregación de demanda 601-1-AG Securitech..... | 76 |
| 2.3.5 Instrumento de agregación de demanda 601-1-AG UTBASC | 78 |
| 2.4 FACTURACIÓN | 79 |
| 2.4.1 Contrato No. 914-2019 – ETB | 79 |
| 2.4.2 Contrato No. 780-2019 – UT Servicios Mnto Vigilancia Ciudadana 2019..... | 90 |
| 2.4.3 CONTRATO No. 756 -2019 – CODENSA | 95 |
| 2.4.4 Instrumento de agregación de demanda 601-1-AG Securitech | 98 |
| 2.4.5 Instrumento de agregación de demanda 601-1-AG UT BASC..... | 99 |
| 2.5 SEGUIMIENTO JURÍDICO | 100 |
| 2.5.1 Contratos objeto de Interventoría | 100 |
| 2.5.2 Seguimiento a garantías..... | 101 |
| 2.5.3 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales:..... | 103 |
| 2.6 SEGUIMIENTO TÉCNICO | 103 |
| 2.7 SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y MEDIO AMBIENTE | 104 |
| 2.8 ANÁLISIS DE RIESGOS | 104 |
| 2.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. | 105 |
| 3. INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 601-1-AG-SEGURITECH | 108 |
| 3.1 FICHA TÉCNICA | 108 |
| 3.2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | 109 |
| 3.2.1 Actas de reunión seguimiento | 109 |
| 3.2.2 Comunicaciones | 110 |
| 3.3 ESTADO GENERAL FINANCIERO | 113 |
| 3.4 SEGUIMIENTO JURÍDICO | 113 |
| 3.4.1 Estado legal del contrato. | 113 |
| 3.4.2 Seguimiento a garantías | 114 |
| 3.5 SEGUIMIENTO TÉCNICO | 115 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 3.6 | RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFORMES DEL CONTRATISTA .. | 117 |
| 3.7 | ANÁLISIS DE RIESGOS. | 117 |
| 3.8 | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. | 117 |
| 4. | INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 601-1-AG- UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA..... | 118 |
| 4.1 | FICHA TÉCNICA | 118 |
| 4.2 | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO..... | 119 |
| 4.2.1 | Actas de reunión seguimiento | 119 |
| 4.2.2 | Comunicaciones | 119 |
| 4.3 | ESTADO GENERAL FINANCIERO | 122 |
| 4.4 | SEGUIMIENTO JURÍDICO | 122 |
| 4.4.1 | Estado legal del contrato. | 122 |
| 4.4.2 | Seguimiento A Garantías | 122 |
| 4.5 | SEGUIMIENTO TÉCNICO | 123 |
| 4.6 | RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFORMES DEL CONTRATISTA .. | 125 |
| 4.7 | ANÁLISIS DE RIESGOS | 125 |
| 4.8 | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. | 125 |
| 5. | CONTRATO NO. 756 DE 2019 – CODENSA S.A E.S.P. | 126 |
| 5.1 | FICHA TÉCNICA | 126 |
| 5.2 | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO..... | 127 |
| 5.2.1 | Actas de reunión seguimiento | 127 |
| 5.2.2 | Comunicaciones | 129 |
| 5.3 | ESTADO GENERAL FINANCIERO | 202 |
| 5.3.1 | SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL..... | 203 |
| 5.4 | SEGUIMIENTO JURÍDICO | 203 |
| 5.4.1 | Garantías | 204 |
| 5.5 | SEGUIMIENTO TÉCNICO | 205 |
| 5.5.1 | Actividades de mantenimiento ejecutadas frente al contrato 780 de 2019 | 206 |
| 5.6 | SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y MEDIO AMBIENTE | 208 |
| 5.6.1 | Objetivo | 208 |
| 5.6.2 | Seguridad y salud en el trabajo | 208 |
| 5.6.3 | Observaciones y/o Recomendaciones..... | 211 |
| 5.7 | RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFORMES DEL CONTRATISTA .. | 211 |
| 5.8 | ANÁLISIS DE RIESGO..... | 212 |
| 5.9 | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. | 212 |
| 6. | CONTRATO NO. 914 DE 2019 – ETB | 214 |
| 6.1 | FICHA TÉCNICA | 214 |
| 6.2 | ESTADO GENERAL FINANCIERO:..... | 215 |
| 6.3 | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO..... | 216 |
| 6.3.1 | Actas de reunión de seguimiento | 216 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 6.3.2 | Comunicaciones | 218 |
| 6.4 | SEGUIMIENTO JURÍDICO | 230 |
| 6.4.1 | Seguimiento a garantías | 230 |
| 6.5 | SEGUIMIENTO TÉCNICO | 231 |
| 6.5.1 | Topología de Red Inicial. | 232 |
| 6.5.2 | Topología de Red Final. | 232 |
| 6.5.3 | Enlace Backup C4..... | 232 |
| 6.5.4 | Topología de Red COSEC..... | 233 |
| 6.5.5 | Migración VRF COSEC..... | 234 |
| 6.5.6 | Traslados de puntos de cámara..... | 234 |
| 6.5.7 | Fase 2. Ampliación cámaras de videovigilancia de Bogotá..... | 235 |
| 6.5.8 | Fase 3. Instrumento de agregación de demanda CCE-601-1-1AG-2017 | 236 |
| 6.5.9 | Herramienta de gestión y monitoreo..... | 236 |
| 6.5.10 | Acuerdos de nivel de servicios (ANS)..... | 237 |
| 6.5.11 | Falla Enlaces de los COSEC – 25 y 26 de julio 2020..... | 237 |
| 6.5.12 | Seguimiento casos reportados a ETB..... | 238 |
| 6.6 | SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y MEDIO AMBIENTE | 241 |
| 6.6.1 | Objetivo | 241 |
| 6.6.2 | Seguridad y Salud en el Trabajo | 241 |
| 6.6.3 | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES..... | 242 |
| 6.7 | RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFORMES DEL CONTRATISTA .. | 242 |
| 6.8 | ANÁLISIS DE RIESGOS | 242 |
| 6.9 | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. | 243 |
| 7. | CONTRATO NO. 780 DE 2019 – UT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 | 244 |
| 7.1 | FICHA TÉCNICA | 244 |
| 7.2 | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO..... | 245 |
| 7.2.1 | ACTAS DE REUNIÓN SEGUIMIENTO..... | 245 |
| 7.2.2 | COMUNICACIONES..... | 248 |
| 7.3 | ESTADO GENERAL FINANCIERO | 303 |
| 7.4 | SEGUIMIENTO JURÍDICO | 305 |
| 7.4.1 | SEGUIMIENTO A GARANTÍAS | 305 |
| 7.5 | SEGUIMIENTO TÉCNICO | 307 |
| 7.5.1 | ESTADO DEL SISTEMA EN CENTROS DE MONITOREO | 311 |
| 7.5.2 | ACTIVIDADES C4 | 316 |
| 7.5.2.1 | VISITA TÉCNICA DATACENTER (02/07/2020) | 316 |
| 7.5.2.2 | ACTUALIZACIÓN CÓDIGOS CÁMARAS (03/07/2020) | 317 |
| 7.5.2.3 | TOURS PROYECTO ALCALDÍAS (14/07/2020) | 317 |
| 7.5.2.4 | REVISIÓN CÁMARAS CENTROS COMERCIALES (18/07/2020)..... | 318 |
| 7.5.2.5 | FALLA PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD (25/07/2020) | 318 |
| 7.6 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS..... | 318 |
| 7.6.1 | SUBSISTEMAS | 318 |
| 7.6.1.1 | VISITA A COLEGIOS..... | 318 |
| 7.6.1.2 | VISITA A CAI'S..... | 319 |
| 7.6.1.3 | VISITA A ESTADIO..... | 319 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | |
|-------------|--|------------|
| 7.6.1.4 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROYECTO TRANSMILENIO..... | 319 |
| 7.6.1.5 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROYECTO CTP..... | 320 |
| 7.6.1.6 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESTACIONES DE POLICÍA..... | 320 |
| 7.6.2 | VISITAS DOMOS CIUDADANOS..... | 321 |
| 7.6.2.1 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROYECTO FVS..... | 321 |
| 7.6.2.2 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROYECTO 350..... | 321 |
| 7.6.2.3 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROYECTO ESU..... | 322 |
| 7.6.2.4 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROYECTO 732..... | 323 |
| 7.6.2.5 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROYECTO ALCALDÍAS..... | 324 |
| 7.6.3 | GRÁFICAS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS..... | 324 |
| 7.6.3.1 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS POR PROYECTO JULIO 2020..... | 324 |
| 7.6.3.2 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS POR PROYECTO DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL (7 SEPTIEMBRE 2019 AL 30 JULIO DE 2020) 325 | |
| 7.6.3.3 | MANTENIMIENTOS EJECUTADOS EN LAS LOCALIDADES..... | 326 |
| 7.7 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS..... | 327 |
| 7.7.1 | GRAFICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UBICACIÓN O PUNTO DE CÁMARA..... | 329 |
| 7.7.2 | INFORMACIÓN REFERENTE A LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS EN LA PLATAFORMA ISS SECUROS Y LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS..... | 330 |
| 7.8 | LIMPIEZAS DE ACRILICO..... | 333 |
| 7.8.1 | CANTIDAD DE PUNTOS VISITADOS POR EL CONTRATISTA UTS MVC..... | 333 |
| 7.8.2 | NOVEDADES LIMPIEZA ACRÍLICO..... | 335 |
| 7.9 | VISITAS FALLIDAS DOMOS CIUDADANOS..... | 335 |
| 7.10 | VISITAS SITE SURVEY SOLICITADOS POR LA SDSCJ Y MEBOG..... | 336 |
| 7.11 | HINCADOS DE POSTE..... | 336 |
| 7.12 | PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA CON NOVEDAD DE OBRA CIVIL IDU 337 | |
| 7.13 | VISITAS PARQUE SIMÓN BOLIVAR..... | 338 |
| 7.14 | DESMONTE de puntos de videoVigilancia..... | 339 |
| 7.15 | MONTAJE DE PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA..... | 339 |
| 7.16 | INSTALACIÓN DE SPT..... | 340 |
| 7.17 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS COSEC..... | 341 |
| 7.18 | MODERNIZACIÓN PROYECTO FVS..... | 342 |
| 7.19 | PUNTOS SOLICITADOS A TRASLADAR POR EL IDU..... | 342 |
| 7.20 | EQUIPOS O REPUESTOS INSTALADOS..... | 343 |
| 7.21 | VISITAS A BODEGA..... | 343 |
| 7.21.1 | BIENES PROPIEDAD DE UTS MVC..... | 343 |
| 7.21.2 | BIENES PROPIEDAD DE LA SDSCJ..... | 344 |
| 7.21.3 | BIENES PARA INTREGAR ALMACEN DE LA SDSCJ..... | 344 |
| 7.22 | MESA DE AYUDA..... | 345 |
| 7.23 | APLICATIVO WEB..... | 346 |
| 7.24 | SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y MEDIO AMBIENTE..... | 347 |
| 7.24.1 | Objetivo..... | 347 |
| 7.24.2 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..... | 347 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 7.24.2.1 | Equipo de trabajo del implementador | 347 |
| 7.24.3 | Observaciones y/o recomendaciones. | 359 |
| 7.24.4 | Recepción y verificación de informes del contratista | 359 |
| 7.25 | Análisis De Riesgos | 359 |
| 7.26 | Conclusiones y recomendaciones..... | 361 |

LISTA DE TABLAS

| | Pág. |
|--|-------------|
| Tabla 1. Ficha técnica interventoria CONSORCIO SMARTY – SCAIN 2019..... | 18 |
| Tabla 2. Modificación No. 03, Contrato 1020-2019..... | 18 |
| Tabla 3. Modificación No. 02, Contrato 1020-2019..... | 18 |
| Tabla 4. Modificación No 01, Contrato 1020-2019..... | 18 |
| Tabla 5. Actas de seguimiento contrato 1020 de 2019 (Anexo 1). | 19 |
| Tabla 6. Listado personal interventoría a corte 30 de julio de 2020. (Anexo 2) | 20 |
| Tabla 7. Listado de personal inicial de interventoría | 21 |
| Tabla 8. Personal de interventoría cambiado a corte 30 de septiembre de 2019 | 21 |
| Tabla 9. Personal de interventoría cambiado a corte 31 de octubre de 2019 | 22 |
| Tabla 10. Personal de interventoría a corte 30 de noviembre de 2019 | 22 |
| Tabla 11. Personal cambiado..... | 23 |
| Tabla 12. Personal de interventoría a corte 31 de diciembre de 2019. | 23 |
| Tabla 13. Personal cambiado mes de enero 2020..... | 24 |
| Tabla 14. Listado personal interventoría a corte 31 de enero de 2020. | 25 |
| Tabla 15. Listado personal interventoría a corte 29 de febrero de 2020. | 26 |
| Tabla 16. Listado personal retirado de interventoría a corte 31 de marzo de 2020. | 26 |
| Tabla 17. Listado personal interventoría a corte 31 de marzo de 2020..... | 27 |
| Tabla 18. Listado personal interventoría a corte 30 de abril de 2020..... | 28 |
| Tabla 19. Listado personal interventoría a corte 31 de mayo de 2020..... | 29 |
| Tabla 20. Listado personal interventoría a corte 30 de junio de 2020..... | 29 |
| Tabla 21. Comunicaciones julio de 2020 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019. | 34 |
| Tabla 22. Comunicaciones junio de 2020 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 39 |
| Tabla 23. Comunicaciones mayo de 2020 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019..... | 42 |
| Tabla 24. Comunicaciones abril de 2020 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019..... | 46 |
| Tabla 25. Comunicaciones marzo de 2020 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019..... | 50 |
| Tabla 26. Comunicaciones febrero de 2020 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 53 |
| Tabla 27. Comunicaciones enero de 2020 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019..... | 59 |
| Tabla 28. Comunicaciones diciembre de 2019 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019..... | 63 |
| Tabla 29. Comunicaciones noviembre de 2019 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019..... | 68 |
| Tabla 30. Comunicaciones octubre de 2019 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019..... | 71 |
| Tabla 31. Comunicaciones septiembre de 2019 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019.... | 73 |
| Tabla 32. Información financiera del contrato de Interventoría No. 1020 de 2019..... | 73 |
| Tabla 33. Adición No 4, Contrato No 914 de 2019..... | 74 |
| Tabla 34. Adición No 3 contrato No 914 de 2019..... | 74 |
| Tabla 35. Información financiera del contrato No. 914-2019 | 74 |
| Tabla 36. Información de los periodos facturados contrato No. 914-2019 | 74 |
| Tabla 37. Adición No 4 contrato No 756 de 2019..... | 74 |
| Tabla 38. Adición No 3 contrato No 756 de 2019..... | 74 |
| Tabla 39. Información financiera del contrato No. 756-2019 | 75 |
| Tabla 40. Información de los periodos facturados contrato No 756-2019 | 75 |
| Tabla 41. Adición No 3 contrato No 780 de 2019..... | 75 |
| Tabla 42. Adición No 2 contrato No 780 de 2019..... | 75 |
| Tabla 43. Información financiera del contrato No. 780-2019. | 75 |
| Tabla 44. Información de los periodos facturados contrato No 780-2019 | 76 |
| Tabla 45. Información financiera 601-1-AG Securitech | 76 |
| Tabla 46. Información de lo facturado 601-1-AG Securitech | 77 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | |
|---|----|
| Tabla 47. Información financiera 601-1-AG UTBASC | 78 |
| Tabla 48. Información de lo facturado 601-1-AG UTBASC..... | 78 |
| Tabla 49. Relación facturación periodo julio 2020, Contrato 1020 de 2019. | 79 |
| Tabla 50. Relación facturación actividades de junio 2020, Contrato 914 de 2019..... | 79 |
| Tabla 51. Relación discriminada actividades junio de 2020, Contrato 914 de 2019 | 80 |
| Tabla 52. Relación facturación actividades de mayo 2020, Contrato 914 de 2019..... | 81 |
| Tabla 53. Relación discriminada actividades mayo de 2020, Contrato 914 de 2019. | 82 |
| Tabla 54. Relación facturación actividades de abril 2020, Contrato 914 de 2019..... | 82 |
| Tabla 55. Relación discriminada actividades abril de 2020, Contrato 914 de 2019. | 83 |
| Tabla 56. Relación facturación actividades de marzo 2020, Contrato 914 de 2019. | 83 |
| Tabla 57. Relación discriminada actividades marzo de 2020, Contrato 914 de 2019..... | 84 |
| Tabla 58. Relación facturación actividades de febrero 2020, Contrato 914 de 2019..... | 84 |
| Tabla 59. Relación discriminada actividades febrero de 2020, Contrato 914 de 2019. | 85 |
| Tabla 60. Relación facturación actividades de enero 2020, Contrato 914 de 2019. | 85 |
| Tabla 61. Relación discriminada de actividades de enero de 2020, Contrato 914 de 2019. | 86 |
| Tabla 62. Relación facturación actividades diciembre de 2019, Contrato 914 de 2019..... | 86 |
| Tabla 63. Relación discriminada actividades diciembre 2019, Contrato 914 de 2019. | 87 |
| Tabla 64. Relación facturación actividades noviembre 2019, Contrato 914 de 2019. | 87 |
| Tabla 65. Relación discriminada actividades noviembre 2019, Contrato 914 de 2019..... | 88 |
| Tabla 66. Relación facturación actividades octubre 2019, Contrato 914 de 2019. | 88 |
| Tabla 67. Relación discriminada actividades octubre 2019, Contrato 914 de 2019..... | 89 |
| Tabla 68. Relación facturación actividades septiembre 2019, Contrato 914 de 2019. | 89 |
| Tabla 69. Relación discriminada actividades septiembre 2019, Contrato 914 de 2019..... | 90 |
| Tabla 70. Relación facturación actividades junio 2020, Contrato 780 de 2019..... | 90 |
| Tabla 71. Relación discriminada actividades junio 2020, Contrato 780 de 2019. | 90 |
| Tabla 72. Relación facturación actividades mayo 2020, Contrato 780 de 2019..... | 90 |
| Tabla 73. Relación discriminada actividades mayo 2020, Contrato 780 de 2019. | 91 |
| Tabla 74. Relación facturación actividades abril 2020, Contrato 780 de 2019..... | 91 |
| Tabla 75. Relación discriminada actividades abril 2020, Contrato 780 de 2019. | 91 |
| Tabla 76. Relación facturación actividades marzo 2020, Contrato 780 de 2019. | 91 |
| Tabla 77. Relación discriminada actividades marzo 2020, Contrato 780 de 2019..... | 91 |
| Tabla 78. Relación facturación actividades febrero 2020, Contrato 780 de 2019..... | 92 |
| Tabla 79. Relación discriminada actividades febrero 2020, Contrato 780 de 2019. | 92 |
| Tabla 80. Relación facturación actividades enero 2020, Contrato 780 de 2019. | 92 |
| Tabla 81. Relación discriminada actividades enero 2020, Contrato 780 de 2019..... | 92 |
| Tabla 82. Relación facturación actividades diciembre 2019, Contrato 780 de 2019..... | 92 |
| Tabla 83. Relación discriminada actividades diciembre 2019, Contrato 780 de 2019. | 93 |
| Tabla 84. Relación facturación actividades diciembre 2019, Contrato 780 de 2019..... | 93 |
| Tabla 85. Relación discriminada actividades noviembre 2019, Contrato 780 de 2019..... | 93 |
| Tabla 86. Relación facturación actividades septiembre de 2019 (suministro e instalación de repuestos) y octubre 2019, Contrato 780 de 2019..... | 93 |
| Tabla 87. Relación actividades suministro e instalación de repuestos septiembre 2019, Contrato 780 de 2019..... | 94 |
| Tabla 88. Relación discriminada de actividades octubre 2019, Contrato 780 de 2019..... | 94 |
| Tabla 89. Relación discriminada actividades facturadas en noviembre de 2019..... | 94 |
| Tabla 90. Relación facturación actividades agosto y septiembre 2019 contrato 780 de 2019 | 94 |
| Tabla 91. Relación discriminada de actividades agosto 2019 contrato 780 de 2019..... | 95 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | |
|--|-----|
| Tabla 92. Relación discriminada actividades septiembre 2019 contrato 780 de 2019..... | 95 |
| Tabla 93. Relación factura periodo junio de 2020..... | 95 |
| Tabla 94. Relación discriminada de actividades junio de 2020..... | 95 |
| Tabla 95. Relación factura periodo mayo de 2020..... | 95 |
| Tabla 96. Relación discriminada de actividades mayo de 2020..... | 95 |
| Tabla 97. Relación factura periodo del 1 al 29 de abril de 2020..... | 95 |
| Tabla 98. Relación discriminada de actividades del 1 al 29 de abril de 2020..... | 96 |
| Tabla 99. Relación factura periodo del 1 de febrero al 31 de marzo de 2020..... | 96 |
| Tabla 100. Relación discriminada de actividades del 1 de febrero al 31 de marzo de 2020..... | 96 |
| Tabla 101. Relación factura periodo del 28 diciembre 2019 al 31 enero de 2020..... | 96 |
| Tabla 102. Relación discriminada de actividades del 28 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020..... | 96 |
| Tabla 103. Relación facturación actividades del 23 octubre al 27 noviembre 2019 del contrato 756 de 2019..... | 96 |
| Tabla 104. Relación discriminada de actividades del 23 de octubre 2019 al 27 de noviembre de 2019..... | 96 |
| Tabla 105. Relación factura periodo del 28 noviembre al 27 diciembre 2019..... | 97 |
| Tabla 106. Relación discriminada de actividades 28 de noviembre al 27 de diciembre 2019..... | 97 |
| Tabla 107. Relación facturación actividades 23 octubre al 27 noviembre 2019 del Contrato 756 de 2019..... | 97 |
| Tabla 108. Relación discriminada de actividades del 23 octubre al 27 noviembre 2019 del Contrato 756 de 2019..... | 97 |
| Tabla 109. Relación facturación actividades del 25 septiembre 2019 al 23 octubre 2019 del contrato 756 de 2019..... | 97 |
| Tabla 110. Relación discriminada de actividades de 25 septiembre 2019 al 23 octubre 2019, Contrato 756 de 2019..... | 97 |
| Tabla 111. Relación facturación actividades de agosto del contrato 756 de 2019..... | 98 |
| Tabla 112. Relación discriminada de actividades agosto 2019, Contrato 756 de 2019..... | 98 |
| Tabla 113. Relación de pagos localidad de Suba, Ciudad Bolívar y Bosa del contrato 601-1-AG SEGURITECH..... | 98 |
| Tabla 114. Relación de pagos de dos localidades del Contrato 601-1-AG SEGURITECH..... | 98 |
| Tabla 115. Relación de pagos de seis localidades del Contrato 601-1-AG SEGURITECH..... | 99 |
| Tabla 116. Relación de pagos de cada una de las localidades del instrumento de agregación de demanda 601-1-AG UT BASC..... | 99 |
| Tabla 117. Estado legal del contrato al 30 de julio 2020..... | 100 |
| Tabla 118. Contratos objeto de Interventoría..... | 100 |
| Tabla 119. Pólizas contrato 1020 de 2019..... | 102 |
| Tabla 120. Respuestas a derechos de petición..... | 103 |
| Tabla 121. Análisis de riegos interventoría..... | 105 |
| Tabla 122. Ficha Técnica Seguritech Privada S.A de C.V..... | 109 |
| Tabla 123. Actas de reunión de seguimiento Seguritech Privada S.A de C.V..... | 110 |
| Tabla 124. Comunicaciones Seguritech Privada S.A de C.V..... | 113 |
| Tabla 125. Estado General Financiero..... | 113 |
| Tabla 126. Facturación diciembre de 2019 Seguritech Privada S.A de C.V..... | 113 |
| Tabla 127. Información contractual Seguritech Privada S.A de C.V..... | 114 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | |
|--|-----|
| Tabla 128. Pólizas - Instrumento de agregación de demanda 601–Seguritech Privada S.A | 115 |
| Tabla 129. Consolidado general técnico – Seguritech Privada S.A de C.V | 116 |
| Tabla 130. Análisis de riesgos Seguritech Privada S.A de C.V | 117 |
| Tabla 131. Ficha técnica - Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana..... | 119 |
| Tabla 132. Actas de reunión seguimiento - Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana. | 119 |
| Tabla 133. Comunicaciones Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana... | 121 |
| Tabla 134. Valor a corte del 31 de diciembre 2019..... | 122 |
| Tabla 135. Estado legal del contrato Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana | 122 |
| Tabla 136. Pólizas - Instrumento de agregación de demanda 601 - Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana..... | 123 |
| Tabla 137. Avance técnico general - Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana. | 123 |
| Tabla 138. Análisis de riesgos - Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana. | 125 |
| Tabla 139. Ficha Técnica – CODENSA..... | 127 |
| Tabla 140. Estado financiero del contrato 756 de 2019 al 30 de junio de 2020..... | 127 |
| Tabla 141. Actas de reunión seguimiento CODENSA. | 129 |
| Tabla 142. Comunicaciones CODENSA S.A. E.S.P. | 202 |
| Tabla 143. Estado Financiero Contrato 756 de 2019 IVA incluido | 202 |
| Tabla 144. Seguimiento Presupuestal contrato 756 de 2019 para el mes de julio de 2020 | 203 |
| Tabla 145. Información Contractual CODENSA..... | 203 |
| Tabla 146. Garantías – CODENSA..... | 205 |
| Tabla 147. Acumulados puntos sin cambio de red de alumbrado público a red de uso comercial..... | 207 |
| Tabla 148. Listado de acompañamiento realizado..... | 211 |
| Tabla 149. Análisis de Riesgo – CODENSA S.A. E.S.P. | 212 |
| Tabla 150. Ficha Técnica – ETB Contrato 914 - 2019 | 215 |
| Tabla 151. Información Otrosí No. 02 – ETB..... | 215 |
| Tabla 152. Información Otrosí No. 03 – ETB..... | 215 |
| Tabla 153. Información Otrosí No. 04 – ETB..... | 215 |
| Tabla 154. Información financiera ETB..... | 215 |
| Tabla 155. ANS | 216 |
| Tabla 156. Actas de reunión de seguimiento. | 218 |
| Tabla 157. Comunicaciones..... | 230 |
| Tabla 158. Información Contractual ETB..... | 230 |
| Tabla 159. Seguimiento a Garantías | 231 |
| Tabla 160. COSEC aprovisionados por ETB..... | 234 |
| Tabla 161. Traslados de puntos de cámara | 235 |
| Tabla 162. Fase 2 Ampliación cámaras de videovigilancia de Bogotá. | 235 |
| Tabla 163. Seguimiento enlaces proyecto 732..... | 235 |
| Tabla 164. Seguimiento enlaces proyecto IAD 601 | 236 |
| Tabla 165. Tiempos de respuesta exigidos a ETB para solución de fallas | 237 |
| Tabla 166. Hallazgos encontrados MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 242 |
| Tabla 167. Análisis De Riesgos | 243 |
| Tabla 168. Ficha técnica – Mantenimiento Contrato 780-2019..... | 245 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | |
|--|-----|
| Tabla 169. Actas de reunión seguimiento mantenimiento | 248 |
| Tabla 170. Comunicaciones..... | 303 |
| Tabla 171. Adición No 2 Contrato No 780 de 2019..... | 303 |
| Tabla 172. Adición No3 Contrato No 780 de 2019..... | 304 |
| Tabla 173. Información financiera del Contrato No. 780 de 2019..... | 304 |
| Tabla 174. ANS Aplicados. | 305 |
| Tabla 175. Información contractual mantenimiento..... | 305 |
| Tabla 176. Pólizas – UT Servicios Mnto Vigilancia Ciudadana 2019. | 307 |
| Tabla 177. Fallas presentadas por proyecto. | 308 |
| Tabla 178. Cuantificación de puntos que presentan fallas atribuidas a terceros. | 308 |
| Tabla 179. Estado por Localidad | 309 |
| Tabla 180. Actualización de puntos de videovigilancia por localidades | 311 |
| Tabla 181. Puntos No visualizados - Centro de Monitoreo Chapinero | 311 |
| Tabla 182. Puntos No visualizados – Centro de Monitoreo Ciudad Bolívar | 312 |
| Tabla 183. Puntos No visualizados - Centro de Monitoreo Kennedy..... | 313 |
| Tabla 184. Puntos No visualizados – Centro de Monitoreo Puente Aranda..... | 314 |
| Tabla 185. Puntos No visualizados - Centro de Monitoreo Barrios Unidos | 314 |
| Tabla 186. Puntos No visualizados - Centro De Monitoreo Engativá | 315 |
| Tabla 187. Puntos No visualizados - Centro De Monitoreo Teusaquillo..... | 315 |
| Tabla 188. Actualización Códigos Cámaras..... | 317 |
| Tabla 189. Estado Centros Comerciales | 318 |
| Tabla 190. Mantenimientos preventivos a subsistema Colegios | 319 |
| Tabla 191. Visitas de mantenimiento correctivo subsistema CAI | 319 |
| Tabla 192. Visitas de mantenimiento correctivo subsistema ESTADIO | 319 |
| Tabla 193. Mantenimientos correctivos diarios Trasmilenio | 320 |
| Tabla 194. Mantenimientos correctivo-diarios CTP..... | 320 |
| Tabla 195. Mantenimientos correctivo diarios Estaciones de Policía. | 320 |
| Tabla 196. Mantenimientos correctivos diarios proyecto FVS | 321 |
| Tabla 197. Mantenimientos correctivos diarios Proyecto 350..... | 322 |
| Tabla 198. Mantenimientos correctivos diarios proyecto ESU..... | 323 |
| Tabla 199. Mantenimientos correctivos diarios Proyecto 732..... | 323 |
| Tabla 200. Mantenimientos correctivos diarios proyecto alcaldías..... | 324 |
| Tabla 201. Mantenimientos correctivos 1 al 30 julio de 2020 por proyecto | 325 |
| Tabla 202. Mantenimientos correctivos- 7 sep 2019 al 30 julio 2020 por proyecto..... | 325 |
| Tabla 203. Mantenimientos ejecutados en las localidades | 326 |
| Tabla 204. Total, Mantenimientos preventivos por ubicación mes de julio de 2020 | 327 |
| Tabla 205. Total, Mantenimientos preventivos, julio de 2020. | 327 |
| Tabla 206. Mantenimiento preventivo realizados por punto de cámara con carro canasta | 328 |
| Tabla 207. Total, Consolidado de mantenimientos preventivos por ubicación..... | 329 |
| Tabla 208. Observaciones - Alarmas - FVS | 330 |
| Tabla 209. Observaciones - SPT – FVS..... | 331 |
| Tabla 210. Observaciones - Alarmas - ESU..... | 331 |
| Tabla 211. Observaciones - SPT – ESU | 332 |
| Tabla 212. Observaciones - Alarmas - 350 | 332 |
| Tabla 213. Observaciones - SPT - 350..... | 333 |
| Tabla 214. Limpieza de acrílicos en puntos de cámaras diarios..... | 333 |
| Tabla 215. Limpieza de acrílicos por proyecto | 334 |
| Tabla 216. Novedades Limpieza de acrílicos puntos de cámaras..... | 335 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | |
|--|-----|
| Tabla 217. Visita site survey en el mes de julio de 2020..... | 336 |
| Tabla 218. Postes Hincados en el mes de julio de 2020..... | 336 |
| Tabla 219. Puntos videovigilancia con novedades obra civil IDU..... | 338 |
| Tabla 220. Desmonte de puntos de videovigilancia | 339 |
| Tabla 221. Montaje de puntos de videovigilancia..... | 340 |
| Tabla 222. SPT instalados en el mes de julio de 2020 | 341 |
| Tabla 223. Visita para instalación en los Cosec's Puente Aranda y Ciudad Bolivar | 341 |
| Tabla 224. Equipos instalados en Cosecs..... | 341 |
| Tabla 225. Relación de equipos y repuestos instalados en julio 2020. | 343 |
| Tabla 226. Equipos propiedad UTSMVC..... | 344 |
| Tabla 227. Equipos propiedad SDSCJ | 344 |
| Tabla 228. Elementos o equipos a reintregar almacén de la SDSCJ..... | 345 |
| Tabla 229. Reportes generados por la aplicación GLPI..... | 347 |
| Tabla 230. Actividad de mantenimiento..... | 357 |
| Tabla 231. Analisis de riesgos | 360 |
| Tabla 232. Clasificación de solicitudes de diagnostico | 361 |
| Tabla 233. Clasificación de solicitudes por diagnostico en proyecto | 362 |
| Tabla 234. Clasificación de solicitudes de diagnostico proyecto ALCALDÍAS | 363 |
| Tabla 235. Clasificación de solicitudes de diagnostico proyecto TRANSMILENIO | 364 |
| Tabla 236. Clasificación de fallas..... | 364 |

LISTA DE ILUSTRACIONES

| | Pág. |
|---|-------------|
| Ilustración 1. Evidencia Fotografica del traslado poste CCEL04_011 | 124 |
| Ilustración 2. Actividades asignadas a CODENSA S.A E.S.P., contrato 780 de 2019..... | 205 |
| Ilustración 3. Acumulativo actividades de mantenimientos ejecutados en 07septiembre de 2019 al 30 julio de 2020 | 207 |
| Ilustración 4. Topología de Red Inicial..... | 232 |
| Ilustración 5. Topología de Red Final | 232 |
| Ilustración 6. Topología de Red Final 2 | 232 |
| Ilustración 7. Topología De Red COSEC..... | 233 |
| Ilustración 8. Estado del proyecto SCJ – Alcaldías | 236 |
| Ilustración 9. Seguimiento tickets - fase mantenimiento: 7 de septiembre 2019 al 30 julio de 2020. | 238 |
| Ilustración 10. Seguimiento ANS 1 al 30 julio 2020..... | 238 |
| Ilustración 11. Relación de fallas reportadas por proyecto | 239 |
| Ilustración 12. Análisis de Falla Fase Mantenimiento | 239 |
| Ilustración 13. Seguimiento Tickets - Contrato IAD 601..... | 240 |
| Ilustración 14. Análisis de Falla IAD 601 | 240 |
| Ilustración 15. Estado General Del Sistema De Video Vigilancia | 307 |
| Ilustración 16. Estado general del sistema de videovigilancia excluyendo terceros. | 308 |
| Ilustración 17. Estado del sistema Santa Fé. | 309 |
| Ilustración 18. Estado del sistema Los Mártires. | 310 |
| Ilustración 19. Estado del sistema Puente Aranda..... | 310 |
| Ilustración 20. Estado del sistema por semanas | 310 |
| Ilustración 21. Estado del sistema de videovigilancia – Centro de Monitoreo Chapinero | 312 |
| Ilustración 22. Estado del sistema de videovigilancia – Centro de Monitoreo Ciudad Bolivar | 312 |
| Ilustración 23. Estado del sistema de videovigilancia – Centro de monitoreo Kennedy .. | 313 |
| Ilustración 24. Estado del sistema de videovigilancia – Centro de Monitoreo Puente Aranda | 314 |
| Ilustración 25. Estado Del Sistema De Videovigilancia – Centro de Monitoreo Barrios Unidos | 314 |
| Ilustración 26. Estado Del Sistema De Videovigilancia – Centro de Monitoreo Engativá | 315 |
| Ilustración 27. Estado Del Sistema De Videovigilancia – Centro de Monitoreo Teusaquillo | 316 |
| Ilustración 28. Mantenimientos correctivos del 1 al 30 julio de 2020 por proyecto..... | 325 |
| Ilustración 29. Mantenimientos correctivos del 7 de septiembre 2019 al 30 de julio 2020 | 326 |
| Ilustración 30. Correctivos por localidad | 327 |
| Ilustración 33. Mantenimiento preventivo realizados por punto de cámara con carro canasta | 328 |
| Ilustración 31. Mantenimiento preventivo por ubicación..... | 329 |
| Ilustración 32. Mantenimiento preventivo por punto de cámara | 329 |
| Ilustración 34. Novedades de alarmas y SPT - Proyecto FVS..... | 330 |
| Ilustración 35. Novedades alarmas y SPT - Proyecto ESU | 331 |
| Ilustración 36. Novedades alarmas y SPT - Proyecto 350..... | 332 |
| Ilustración 37. Limpieza acrilicos puntos de videovigilancia 1 la 30 julio de 2020..... | 334 |

| | |
|--|-----|
| Ilustración 38. Limpiezas de acrílico del 7 septiembre 2019 al 30 de julio de 2020 | 334 |
| Ilustración 39. Evidencia fotografica de la novedad – señal desgaste..... | 358 |
| Ilustración 40. Evidencia fotografica de la novedad | 358 |
| Ilustración 41. Solicitudes de diagnostico | 362 |
| Ilustración 42. Solicitudes de diagnostico por proyecto..... | 363 |
| Ilustración 43. Solicitudes de diagnostico proyecto ALCALDÍAS..... | 363 |
| Ilustración 44. Solicitudes de diagnostico proyecto TRANSMILENIO | 364 |

1. OBJETO

Informar sobre el estado de la ejecución de los contratos y proyectos asociados al Sistema de Videovigilancia de Bogotá D.C., relativos al suministro de bienes y servicios de implementación Instrumento de agregación de demanda, energía, conectividad y mantenimiento, para el período del **1 al 30 de julio del 2020.**

2. CONTRATO NO. 1020 DE 2019

En este capítulo se presenta el resumen de las actividades realizadas, resultados obtenidos, análisis, estadísticas y hallazgos, entre otros.

2.1 FICHA TÉCNICA

| A. INFORMACIÓN GENERAL | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| NIT | 901.319.163-1 | | |
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | | |
| CIUDAD | BOGOTÁ D.C | | |
| DIRECCIÓN | Av. CII 26 N° 59 - 65 Ofc. 704 | | |
| TELÉFONO | 4862030 | | |
| I. DATOS DEL CONTRATO | | | |
| CONTRATO No. | 1020 DE 2019 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 06/09/2019 |
| FECHA ACTA DE INICIO CONTRATO | 06/09/2019 | FECHA DE TERMINACIÓN | 28/01/2020 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$1.807.867.953 incluido IVA del 19% | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$1.807.867.953 incluido IVA del 19% |
| OBJETO | Interventoría administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica y ambiental, para los proyectos del sistema de videovigilancia de Bogotá. | | |
| FECHA FIRMA ACTA DE INICIO | 07/09/2019 | | |
| II. Modificación N° 01 | | | |
| PRORROGA | 2 MESES Y 10 DIAS | FECHA FINAL | 6/04/2020 |
| ADICIÓN | \$865.599.859 | VALOR TOTAL | \$2.673.467.812 |
| III. Modificación N° 02 | | | |
| PRORROGA | 24 días | FECHA FINAL | 30/07/2020 |
| ADICIÓN | \$ 1.047.624.354 | VALOR TOTAL | \$3.721.092.166 |
| IV. Modificación N° 03 | | | |
| PRORROGA | 3 MESES | FECHA FINAL | 6/07/2020 |
| ADICIÓN | \$ 279.366.494 | VALOR TOTAL | \$4.000.458.660 |
| PLAZO EJECUCION TOTAL | 10 MESES y 24 DIAS | | |
| V. DATOS DEL CONTRATISTA | | | |
| NOMBRE CONTACTO | ROL | CORREO ELECTRÓNICO | |
| Camilo Andrés Velasco Triana | Supervisor | camilo.velasco@scj.gov.co | |
| VI. DATOS DE INTERVENTORÍA | | | |
| NOMBRE CONTACTO | ROL | CORREO ELECTRÓNICO | |
| Oscar Fajardo | Director General | oscar.fajardo@smartycolombia.com | |
| Emmanuel Ospina | Asesor Técnico | proyectos@smartycolombia.com | |
| Milena Bermúdez | Asesor financiero, contable y administrativo | jbermudez@scain.co | |
| Clara Álzate | Asesor Jurídico | calzate@scain.co | |
| B. ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) |
| 1 | Valor inicial del Contrato | \$1.807.867.953 | 45% |
| 2 | Valor Adición 1 | \$865.599.859 | 22% |
| 3 | Valor adición 2 | \$ 1.047.624.354 | 26% |
| 4 | Valor adición 3 | \$ 279.366.494 | 7% |
| 5 | Valor Total | \$4.000.458.660 | 100% |
| 6 | Valor ejecutado antes del presenta pago | \$3.651.250.542 | 91% |
| 7 | Valor Facturado | \$349.208.118 | 9% |
| 8 | Valor Ejecutado | \$3.651.250.542 | 91% |
| 9 | Valor pendiente por ejecutar | \$349.208.118 | 9% |
| 10 | Valor a Facturar (*) | \$349.208.118 | 9% |
| 11 | PAC proyectado (**) | \$349.208.118 | 9% |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Observaciones: Información obtenida del control financiero y presupuestal de la Interventoría.

(*) Facturación a realizar en el mes de agosto de 2020,
(**) El PAC proyectado corresponde a la facturación del periodo del periodo del 1 al 30 de julio de 2020

| C. INFORMACIÓN JURÍDICA | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|--------------------|--------------------------|
| I. GARANTÍAS DEL CONTRATO | | | | |
| ASEGURADORA | No. DE PÓLIZA | TIPO DE AMPARO | VALOR | PERÍODO DE COBERTURA |
| SEGUROS GENERARES SURAMERICANA S.A. | 2323843-6 | Cumplimiento del Contrato | \$1.120.672.561,00 | 18/03/2019 A 06/01/2021 |
| | 2323843-6 | Pago Salario y Prestaciones Sociales | \$280.168.140,25 | 18/03/2019 A 06/07/2023 |
| | 2323843-6 | Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | \$1.120.672.561,00 | 04/04/2020 A 06/07/2022 |
| | 2323843-6 | Calidad del servicio | \$1.120.672.561,00 | 18/03/2019 A 06/07/2022 |
| | 617694-0 | Responsabilidad civil Extracontractual | \$ 438.901.500,00 | 18/03//2019 A 06/07/2020 |

Tabla 1. Ficha técnica interventoria CONSORCIO SMARTY – SCAIN 2019

2.2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el Consorcio SMARTY-SCAIN 2019 a los contratos y proyectos objeto de Interventoría:

Durante el mes de julio de 2020, se suscribió la modificación No 3 del Contrato 1020 de 2019:

| MODIFICACION No 03. Consorcio SMARTY -SCAIN 2019 | | | |
|--|----------------|-------------|-----------------|
| PRORROGA | 24 DIAS | FECHA FINAL | 30/07/2020 |
| ADICION | \$ 279.366.494 | VALOR TOTAL | \$4.000.458.660 |

Tabla 2. Modificación No. 03, Contrato 1020-2019

Modificaciones contrato 1020 de 2019:

| MODIFICACION No 02. Consorcio SMARTY -SCAIN 2019 | | | |
|--|------------------|-------------|-----------------|
| PRORROGA | 3 MESES | FECHA FINAL | 6/07/2020 |
| ADICION | \$ 1.047.624.354 | VALOR TOTAL | \$3.721.092.166 |

Tabla 3. Modificación No. 02, Contrato 1020-2019

| MODIFICACION No 01. Consorcio SMARTY -SCAIN 2019 | | | |
|--|-------------------|-------------|-----------------|
| PRORROGA | 2 MESES Y 10 DIAS | FECHA FINAL | 6/04/2020 |
| ADICION | \$865.599.859 | VALOR TOTAL | \$2.673.467.812 |

Tabla 4. Modificación No 01, Contrato 1020-2019

2.2.1 Actas de reunión seguimiento

Como instrumento para seguimiento y control a la ejecución del Contrato No. 1020, la interventoría CONSORCIO SMARTY – SCAIN 2019, estableció de común acuerdo con la entidad contratante SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, reuniones periódicas cuyas decisiones y compromisos se documentan en el formato “FO-GIP-P136-F1 ACTA DE SEGUIMIENTO”.

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
Contrato 1020 de 2019
Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
01/07/2020– 30/07/2020
Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Junto con el presente informe se hace entrega formal y en original de las ACTAS DE SEGUIMIENTO pertenecientes al mes del mismo a la Supervisión de la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. Ver Tabla 5. (Anexo No. 1) *

| ACTA | FECHA | TEMAS PRINCIPALES | CONTRATO |
|--|------------|--|--------------|
| 0053 – SCJ CONSORCIO SMARTY – SCAIN 2019 | 02/07/2020 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1020 DE 2019 Y A LOS CONTRATOS OBJETO DE INTERVENTORIA | 1020 DE 2019 |
| 0054 – SCJ CONSORCIO SMARTY – SCAIN 2019 | 03/07/2020 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS 13 PUNTOS VISITADOS EN CAMPO PARA LA ACTIVIDAD DE SITE-SURVEY Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR. | 1020 DE 2019 |
| 0055 – SCJ CONSORCIO SMARTY – SCAIN 2019 | 09/07/2020 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1020 DE 2019 Y A LOS CONTRATOS OBJETO DE INTERVENTORIA | 1020 DE 2019 |
| 0056 – SCJ CONSORCIO SMARTY – SCAIN 2019 | 14/07/2020 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS 5 PUNTOS VISITADOS EN CAMPO PARA LA ACTIVIDAD DE SITE-SURVEY Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR. | 1020 DE 2019 |
| 0057 – SCJ CONSORCIO SMARTY – SCAIN 2019 | 16/07/2020 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1020 DE 2019 Y A LOS CONTRATOS OBJETO DE INTERVENTORIA | 1020 DE 2019 |
| 0058 – SCJ CONSORCIO SMARTY – SCAIN 2019 | 23/07/2020 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1020 DE 2019 Y A LOS CONTRATOS OBJETO DE INTERVENTORIA | 1020 DE 2019 |
| 0059 – SCJ CONSORCIO SMARTY – SCAIN 2019 | 30/07/2020 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1020 DE 2019 Y A LOS CONTRATOS OBJETO DE INTERVENTORIA | 1020 DE 2019 |

Tabla 5. Actas de seguimiento contrato 1020 de 2019 (Anexo 1).

(*) Listado de actas de seguimiento contrato No 1020 de 2019 (Anexo 1)

2.2.2 Personal de interventoría

Durante el mes de julio de 2020, no se realizaron cambios de personal

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | CEDULA |
|------|--|-----------------------|---------------|
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | OSCAR FAJARDO | 97.470.859 |
| 2 | ASESOR FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO | MILENA BERMÚDEZ | 52.957.153 |
| 3 | ASESOR JURÍDICO | CLARA ÁLZATE | 52.967.071 |
| 4 | ASESOR TÉCNICO | EMMANUEL OSPINA | 10.030.485 |
| 5 | COORDINADOR TÉCNICO 1 | JUAN FERNANDO BARRERO | 5.826.043 |
| 6 | COORDINADOR TÉCNICO 2 | RAFAEL BERRIO | 88.263.338 |
| 7 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 1 | PEDRO CARDENAS | 80.013.975 |
| 8 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 2 | VÍCTOR VARGAS | 6.663.061 |
| 9 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 3 | MANUEL MEJÍA | 5.166.600 |
| 10 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 4 | DANY SOLARTE | 15.817.010 |
| 11 | INGENIERO PROYECTO DE ADQUISICIÓN 1 | NO REQUERIDO | NA |
| 12 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 1 | DEISY XIOMARA RIVERA | 1.094.248.794 |
| 13 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 2 | CESAR POVEDA | 80.758.088 |
| 14 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 1 | MAURICIO SIERRA | 9.873.158 |
| 15 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 2 | ERNESTO GALEANO | 10.014.624 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | CEDULA |
|------|---|------------------------|---------------|
| 16 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 1 | MARIO FREDY PRIETO | 80.122.702 |
| 17 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 2 | KATHERINE MENDEZ | 39.047.961 |
| 18 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 3 | ANDRÉS ENRIQUE MAYORGA | 80.543.218 |
| 19 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 4 | FRANCISCO SOLARTE | 16.658.896 |
| 20 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 5 | FRANCISCO PENAGOS | 79.152.749 |
| 21 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 6 | LUIS FERNANDO PINZÓN | 80.249.697 |
| 22 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 7 | MAGLA LICED PINTO | 1.092.346.668 |
| 23 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 8 | STEFHANIE ARCHOBOLD | 55.312.167 |
| 24 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 9 | YULY CARREÑO | 1.098.657.335 |
| 25 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 10 | FREDY MARTINEZ | 1.022.351.408 |
| 26 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 11 | LUIS MAURICIO MUÑOZ | 80.068.764 |
| 27 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 12 | HENRY RODRIGUEZ | 79.840.789 |
| 28 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 13 | PAOLA BORDA | 1.032.450.542 |
| 29 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 14 | ANDERSON PARADA | 79.891.117 |
| 30 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 15 | JORGE ORTIZ | 72.311.537 |
| 31 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 16 | CARLOS MORALES | 14.395.560 |
| 32 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 1 | MARY LUZ BUITRAGO | 52.528.868 |
| 33 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 2 | NO REQUERIDO | NA |
| 34 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 3 | PIEDAD AREVALO | 52.814.221 |

Tabla 6. Listado personal interventoría a corte 30 de julio de 2020. (Anexo 2)

A continuación, se presentan los cambios de personal que se han realizado durante la ejecución del contrato de interventoría 1020 de 2019:

Mediante oficio del 6 de septiembre de 2019 con consecutivo CSS-P136-001-2019 se presentó el personal del equipo de trabajo de contrato de interventoría 1020 de 2019 (Anexo 3 oficio CSS-P136-001-2019)

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | CEDULA |
|------|--|-----------------------|---------------|
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | OSCAR FAJARDO | 97.470.859 |
| 2 | ASESOR FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO | MILENA BERMÚDEZ | 52.957.153 |
| 3 | ASESOR JURÍDICO | CLARA ÁLZATE | 52.967.071 |
| 4 | ASESOR TÉCNICO | EMMANUEL OSPINA | 10.030.485 |
| 5 | COORDINADOR TÉCNICO 1 | JUAN FERNANDO BARRERO | 5.826.043 |
| 6 | COORDINADOR TÉCNICO 2 | RAFAEL BERRIO | 88.263.338 |
| 7 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 1 | HÉCTOR RUBIANO | 73.575.049 |
| 8 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 2 | VÍCTOR VARGAS | 6.663.061 |
| 9 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 3 | MANUEL MEJÍA | 5.166.600 |
| 10 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 4 | DANY SOLARTE | 15.817.010 |
| 11 | INGENIERO PROYECTO DE ADQUISICIÓN 1 | NÉSTOR SALAMANCA | 91.506.912 |
| 12 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 1 | DEISY XIOMARA RIVERA | 1.094.248.794 |
| 13 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 2 | CESAR POVEDA | 80.758.088 |
| 14 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 1 | MAURICIO SIERRA | 9.873.158 |
| 15 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 2 | ERNESTO GALEANO | 10.014.624 |
| 16 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 1 | MARIO FREDY PRIETO | 80.122.702 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | CEDULA |
|------|---|------------------------|---------------|
| 17 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 2 | JESSICA PAOLA LARA | 1.013.624.170 |
| 18 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 3 | ANDRÉS ENRIQUE MAYORGA | 80.543.218 |
| 19 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 4 | FRANCISCO SOLARTE | 16.658.896 |
| 20 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 5 | GUBER ALFONSO LEÓN | 1.022.325.506 |
| 21 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 6 | LUIS FERNANDO PINZÓN | 80.249.697 |
| 22 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 7 | MAGLA LICED PINTO | 1.092.346.668 |
| 23 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 8 | STEFHANIE ARCHOBOLD | 55.312.167 |
| 24 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 9 | CARLOS MORALES | 14.395.650 |
| 25 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 10 | HELLBERT RIVERA | 1.121.845.609 |
| 26 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 11 | LUIS MAURICIO MUÑOZ | 80.068.764 |
| 27 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 12 | DIDIA ESTER ROMERO | 52.400.205 |
| 28 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 13 | ALBERTO PINZÓN VALERO | 1.024.471.582 |
| 29 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 14 | ANDERSON PARADA | 79.891.117 |
| 30 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 15 | JORGE ORTIZ | 72.311.537 |
| 31 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 16 | PEDRO CÁRDENAS | 80.013.975 |
| 32 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 1 | MARY LUZ BUITRAGO | 52.528.868 |
| 33 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 2 | EDWIN SABOGAL | 1.023.891.333 |
| 34 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 3 | PIEDAD AREVALO | 52.814.221 |

Tabla 7. Listado de personal inicial de interventoría

El 7 de septiembre de 2019 se realizó reunión con el personal para el inicio de actividades y se formalizó el acta No 01 con la SDSCJ en la cual se presentaron las hojas de vida del equipo mínimo de interventoría.

El 9 de septiembre de 2019 se solicitó a la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, realizar el primer cambio de personal el cual se formalizó mediante acta No 02, para los siguientes cargos:

- Ingeniero proyecto de mantenimiento 1
- Inspector técnico/tecnológico 12
- Inspector técnico/tecnológico 16

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | C.C. | CONTRATO |
|------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 1 | PEDRO CARDENAS | 80.013.975 | CSS-003-2019 |
| 2 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 12 | OMAR MAFLA TANGARIFE | 1.012.350.311 | CSS-022-2019 |
| 3 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 16 | JHONATAN URUEÑA OCHOA | 72.292.968 | CSS-033-2019 |

Tabla 8. Personal de interventoría cambiado a corte 30 de septiembre de 2019

El 01 de octubre de 2019 se solicitó a la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, realizar el segundo cambio el cual se realizó mediante acta No 03 para los siguientes cargos:

- Inspector técnico/tecnológico 9
- Inspector técnico/tecnológico 10

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | C.C. | CONTRATO |
|------|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 1 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 9 | YULY CARREÑO | 1.098.657.335 | CSS-034-2019 |
| 2 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 10 | FREDY MARTINEZ | 1.022.351.408 | CSS-032-2019 |

Tabla 9. Personal de interventoría cambiado a corte 31 de octubre de 2019

Durante el mes de noviembre, no se realizaron cambios de personal se relacionó el personal a corte 30 de noviembre de 2019.

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | C.C. |
|------|---|------------------------|---------------|
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | OSCAR FAJARDO | 97.470.859 |
| 2 | ASESOR FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO | MILENA BERMÚDEZ | 52.957.153 |
| 3 | ASESOR JURÍDICO | CLARA ÁLZATE | 52.967.071 |
| 4 | ASESOR TÉCNICO | EMMANUEL OSPINA | 10.030.485 |
| 5 | COORDINADOR TÉCNICO 1 | JUAN FERNANDO BARRERO | 5.826.043 |
| 6 | COORDINADOR TÉCNICO 2 | RAFAEL BERRIO | 88.263.338 |
| 7 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 1 | PEDRO CARDENAS | 80.013.975 |
| 8 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 2 | VÍCTOR VARGAS | 6.663.061 |
| 9 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 3 | MANUEL MEJÍA | 5.166.600 |
| 10 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 4 | DANY SOLARTE | 15.817.010 |
| 11 | INGENIERO PROYECTO DE ADQUISICIÓN 1 | NÉSTOR SALAMANCA | 91.506.912 |
| 12 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 1 | DEISY XIOMARA RIVERA | 1.094.248.794 |
| 13 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 2 | CESAR POVEDA | 80.758.088 |
| 14 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 1 | MAURICIO SIERRA | 9.873.158 |
| 15 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 2 | ERNESTO GALEANO | 10.014.624 |
| 16 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 1 | MARIO FREDY PRIETO | 80.122.702 |
| 17 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 2 | JESSICA PAOLA LARA | 1.013.624.170 |
| 18 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 3 | ANDRÉS ENRIQUE MAYORGA | 80.543.218 |
| 19 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 4 | FRANCISCO SOLARTE | 16.658.896 |
| 20 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 5 | GUBER ALFONSO LEÓN | 1.022.325.506 |
| 21 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 6 | LUIS FERNANDO PINZÓN | 80.249.697 |
| 22 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 7 | MAGLA LICED PINTO | 1.092.346.668 |
| 23 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 8 | STEFHANIE ARCHOBOLD | 55.312.167 |
| 24 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 9 | YULY CARREÑO | 1.098.657.335 |
| 25 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 10 | FREDY MARTINEZ | 1.022.351.408 |
| 26 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 11 | LUIS MAURICIO MUÑOZ | 80.068.764 |
| 27 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 12 | OMAR MAFLA TANGARIFE | 1.012.350.311 |
| 28 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 13 | ALBERTO PINZÓN VALERO | 1.024.471.582 |
| 29 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 14 | ANDERSON PARADA | 79.891.117 |
| 30 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 15 | JORGE ORTIZ | 72.311.537 |
| 31 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 16 | JHIONATAN URUEÑA OCHOA | 72.292.968 |
| 32 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 1 | MARY LUZ BUITRAGO | 52.528.868 |
| 33 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 2 | EDWIN SABOGAL | 1.023.891.333 |
| 34 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 3 | PIEDAD AREVALO | 52.814.221 |

Tabla 10. Personal de interventoría a corte 30 de noviembre de 2019

Durante el mes de diciembre de 2019 solicitó a la Secretaria de Seguridad Convivencia y Justicia, realizar el tercer cambio de personal el cual se formalizo mediante acta No 04, para los siguientes cargos:

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

- Ingeniero proyecto de adquisición 1
- Inspector técnico /tecnológico 15

En la Tabla 11 se relacionó el personal mínimo de interventoría corte 31 de diciembre de 2019.

Personal cambiado:

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | C.C. |
|------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 1 | INGENIERO PROYECTO DE ADQUISICIÓN 1 | NÉSTOR SALAMANCA | 91.506.912 |
| 2 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 15 | JORGE ORTIZ | 72.311.537 |

Tabla 11. Personal cambiado

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | C.C. |
|------|---|------------------------|---------------|
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | OSCAR FAJARDO | 97.470.859 |
| 2 | ASESOR FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO | MILENA BERMÚDEZ | 52.957.153 |
| 3 | ASESOR JURÍDICO | CLARA ÁLZATE | 52.967.071 |
| 4 | ASESOR TÉCNICO | EMMANUEL OSPINA | 10.030.485 |
| 5 | COORDINADOR TÉCNICO 1 | JUAN FERNANDO BARRERO | 5.826.043 |
| 6 | COORDINADOR TÉCNICO 2 | RAFAEL BERRIO | 88.263.338 |
| 7 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 1 | PEDRO CARDENAS | 80.013.975 |
| 8 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 2 | VÍCTOR VARGAS | 6.663.061 |
| 9 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 3 | MANUEL MEJÍA | 5.166.600 |
| 10 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 4 | DANY SOLARTE | 15.817.010 |
| 11 | INGENIERO PROYECTO DE ADQUISICIÓN 1 | JORGE ORTIZ | 72.311.537 |
| 12 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 1 | DEISY XIOMARA RIVERA | 1.094.248.794 |
| 13 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 2 | CESAR POVEDA | 80.758.088 |
| 14 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 1 | MAURICIO SIERRA | 9.873.158 |
| 15 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 2 | ERNESTO GALEANO | 10.014.624 |
| 16 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 1 | MARIO FREDY PRIETO | 80.122.702 |
| 17 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 2 | JESSICA PAOLA LARA | 1.013.624.170 |
| 18 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 3 | ANDRÉS ENRIQUE MAYORGA | 80.543.218 |
| 19 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 4 | FRANCISCO SOLARTE | 16.658.896 |
| 20 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 5 | GUBER ALFONSO LEÓN | 1.022.325.506 |
| 21 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 6 | LUIS FERNANDO PINZÓN | 80.249.697 |
| 22 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 7 | MAGLA LICED PINTO | 1.092.346.668 |
| 23 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 8 | STEFHANIE ARCHOBOLD | 55.312.167 |
| 24 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 9 | YULY CARREÑO | 1.098.657.335 |
| 25 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 10 | FREDY MARTINEZ | 1.022.351.408 |
| 26 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 11 | LUIS MAURICIO MUÑOZ | 80.068.764 |
| 27 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 12 | OMAR MAFLA TANGARIFE | 1.012.350.311 |
| 28 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 13 | ALBERTO PINZÓN VALERO | 1.024.471.582 |
| 29 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 14 | ANDERSON PARADA | 79.891.117 |
| 30 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 15 | OSCAR RODRIGO MORALES | 80.209.344 |
| 31 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 16 | JHIONATAN URUEÑA OCHOA | 72.292.968 |
| 32 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 1 | MARY LUZ BUITRAGO | 52.528.868 |
| 33 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 2 | EDWIN SABOGAL | 1.023.891.333 |
| 34 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 3 | PIEDAD AREVALO | 52.814.221 |

Tabla 12. Personal de interventoría a corte 31 de diciembre de 2019.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Durante el mes de enero de 2020, se solicitó a la Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, realizar el cuarto cambio de personal el cual se formalizo mediante acta No 05, para los siguientes cargos:

- INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 2
- INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 12
- INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 13
- INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 15

Mediante acta No 07 se formalizo el personal requerido por dos meses en la modificación No 01 que dará inicio desde el 1 de febrero de 2020:

- INGENIERO DE MANTENIMIENTO 5
- INSPECTOR TECNICO/TECNOLOGICO17

Personal cambiado durante el mes de enero de 2020:

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | C.C. |
|------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 2 | JESSICA PAOLA LARA | 1.013.624.170 |
| 2 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 12 | OMAR MAFLA TANGARIFE | 1.012.350.311 |
| 3 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 13 | ALBERTO PINZON VALERO | 1.024.471.582 |
| 4 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 15 | OSCAR RODRIGUEZ MORALES | 80.209.344 |

Tabla 13. Personal cambiado mes de enero 2020

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | C.C. |
|------|--|------------------------|-------------------|
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | OSCAR FAJARDO | 97.470.859 |
| 2 | ASESOR FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO | MILENA BERMÚDEZ | 52.957.153 |
| 3 | ASESOR JURÍDICO | CLARA ÁLZATE | 52.967.071 |
| 4 | ASESOR TÉCNICO | EMMANUEL OSPINA | 10.030.485 |
| 5 | COORDINADOR TÉCNICO 1 | JUAN FERNANDO BARRERO | 5.826.043 |
| 6 | COORDINADOR TÉCNICO 2 | RAFAEL BERRIO | 88.263.338 |
| 7 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 1 | PEDRO CARDENAS | 80.013.975 |
| 8 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 2 | VÍCTOR VARGAS | 6.663.061 |
| 9 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 3 | MANUEL MEJÍA | 5.166.600 |
| 10 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 4 | DANY SOLARTE | 15.817.010 |
| 11 | INGENIERO PROYECTO DE ADQUISICIÓN 1 | JORGE ORTIZ | 72.311.537 |
| 12 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 1 | DEISY XIOMARA RIVERA | 1.094.248.794 |
| 13 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 2 | CESAR POVEDA | 80.758.088 |
| 14 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 1 | MAURICIO SIERRA | 9.873.158 |
| 15 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 2 | ERNESTO GALEANO | 10.014.624 |
| 16 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 1 | MARIO FREDY PRIETO | 80.122.702 |
| 17 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 2 | KATHERIN MENDEZ | 39.047.961 |
| 18 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 3 | ANDRÉS ENRIQUE MAYORGA | 80.543.218 |
| 19 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 4 | FRANCISCO SOLARTE | 16.658.896 |
| 20 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 5 | GUBER ALFONSO LEÓN | 1.022.325.506 |
| 21 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 6 | LUIS FERNANDO PINZÓN | 80.249.697 |
| 22 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 7 | MAGLA LICED PINTO | 1.092.346.668 |
| 23 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 8 | STEFHANIE ARCHOBOLD | 55.312.167 |
| 24 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 9 | YULY CARREÑO | 1.098.657.335 |
| 25 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 10 | FREDY MARTINEZ | 1.022.351.408 |
| 26 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 11 | LUIS MAURICIO MUÑOZ | 80.068.764 |
| 27 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 12 | HENRY RODRIGUEZ | 79.840.789 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | C.C. |
|------|---|------------------------|---------------|
| 28 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 13 | PAOLA BORDA | 1.032.450.542 |
| 29 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 14 | ANDERSON PARADA | 79.891.117 |
| 30 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 15 | HORACIO RAMOS | 1.098.639.462 |
| 31 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 16 | JHIONATAN URUEÑA OCHOA | 72.292.968 |
| 32 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 1 | MARY LUZ BUITRAGO | 52.528.868 |
| 33 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 2 | EDWIN SABOGAL | 1.023.891.333 |
| 34 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 3 | PIEDAD AREVALO | 52.814.221 |

Tabla 14. Listado personal interventoría a corte 31 de enero de 2020.

Mediante acta No 07, se formalizo personal requerido por dos (2) meses (febrero y marzo del 2020), en la modificación No 01 del Contrato 1020 de 2019, el cual inicio el 1 de febrero de 2020.

- INGENIERO DE MANTENIMIENTO 5
- INSPECTOR TECNICO/TECNOLOGICO17

En la Tabla 15, se relaciona el personal mínimo de interventoría a corte 29 de febrero de 2020, se adjuntaron los contratos correspondientes al mes del informe y el pago seguridad social del personal.

| Ítem | CARGO | NOMBRE | CEDULA |
|------|--|------------------------|---------------|
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | OSCAR FAJARDO | 97.470.859 |
| 2 | ASESOR FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO | MILENA BERMÚDEZ | 52.957.153 |
| 3 | ASESOR JURÍDICO | CLARA ÁLZATE | 52.967.071 |
| 4 | ASESOR TÉCNICO | EMMANUEL OSPINA | 10.030.485 |
| 5 | COORDINADOR TÉCNICO 1 | JUAN FERNANDO BARRERO | 5.826.043 |
| 6 | COORDINADOR TÉCNICO 2 | RAFAEL BERRIO | 88.263.338 |
| 7 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 1 | PEDRO CARDENAS | 80.013.975 |
| 8 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 2 | VÍCTOR VARGAS | 6.663.061 |
| 9 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 3 | MANUEL MEJÍA | 5.166.600 |
| 10 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 4 | DANY SOLARTE | 15.817.010 |
| 11 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 5 | FRANCISCO PENAGOS | 79.152.749 |
| 12 | INGENIERO PROYECTO DE ADQUISICIÓN 1 | NO REQUERIDO | NA |
| 13 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 1 | DEISY XIOMARA RIVERA | 1.094.248.794 |
| 14 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 2 | CESAR POVEDA | 80.758.088 |
| 15 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 1 | MAURICIO SIERRA | 9.873.158 |
| 16 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 2 | ERNESTO GALEANO | 10.014.624 |
| 17 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 1 | MARIO FREDY PRIETO | 80.122.702 |
| 18 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 2 | KATHERINE MENDEZ | 39.047.961 |
| 19 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 3 | ANDRÉS ENRIQUE MAYORGA | 80.543.218 |
| 20 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 4 | FRANCISCO SOLARTE | 16.658.896 |
| 21 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 5 | GUBER ALFONSO LEÓN | 1.022.325.506 |
| 22 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 6 | LUIS FERNANDO PINZÓN | 80.249.697 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| Ítem | CARGO | NOMBRE | CEDULA |
|------|---|-----------------------|-------------------|
| 23 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 7 | MAGLA LICED PINTO | 1.092.346.668 |
| 24 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 8 | STEFHANIE ARCHOBOLD | 55.312.167 |
| 25 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 9 | YULY CARREÑO | 1.098.657.335 |
| 26 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 10 | FREDY MARTINEZ | 1.022.351.408 |
| 27 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 11 | LUIS MAURICIO MUÑOZ | 80.068.764 |
| 28 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 12 | HENRY RODRIGUEZ | 79.840.789 |
| 29 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 13 | PAOLA BORDA | 1.032.450.542 |
| 30 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 14 | ANDERSON PARADA | 79.891.117 |
| 31 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 15 | JORGE ORTIZ | 72.311.537 |
| 32 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 16 | JHONATAN URUEÑA OCHOA | 72.292.968 |
| 33 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 17 | CARLOS MORALES | 14.395.560 |
| 34 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 1 | MARY LUZ BUITRAGO | 52.528.868 |
| 35 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 2 | NO REQUERIDO | NA |
| 36 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 3 | PIEDAD AREVALO | 52.814.221 |

Tabla 15. Listado personal interventoría a corte 29 de febrero de 2020.

En el mes de marzo de 2020, se envió correo con fecha 30 de marzo de 2020 en el cual se informó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el personal que continuara hasta la finalización del contrato 1020 de 2019, lo anterior de acuerdo a la finalización de actividades correspondientes a estaciones de policía las cuales se desarrollaron en los meses de febrero y marzo de 2020, y a los requerimientos del otro sí No 01 del contrato 1020 de 2019, frente a la contratación de personal por dos (2) meses que correspondían a febrero y marzo de 2020:

Personal retirado a partir del 31 de marzo de 2020:

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | CEDULA |
|------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 5 | FRANCISCO PENAGOS | 79.152.749 |
| 2 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 16 | JHONATAN URUEÑA OCHOA | 72.292.968 |

Tabla 16. Listado personal retirado de interventoría a corte 31 de marzo de 2020.

En la Tabla 17, se relacionó el personal mínimo de interventoría a corte 31 de marzo de 2020, se adjuntaron los contratos correspondientes al mes del informe y el pago seguridad social del personal:

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | CEDULA |
|------|--|-----------------------|------------|
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | OSCAR FAJARDO | 97.470.859 |
| 2 | ASESOR FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO | MILENA BERMÚDEZ | 52.957.153 |
| 3 | ASESOR JURÍDICO | CLARA ÁLZATE | 52.967.071 |
| 4 | ASESOR TÉCNICO | EMMANUEL OSPINA | 10.030.485 |
| 5 | COORDINADOR TÉCNICO 1 | JUAN FERNANDO BARRERO | 5.826.043 |
| 6 | COORDINADOR TÉCNICO 2 | RAFAEL BERRIO | 88.263.338 |
| 7 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 1 | PEDRO CARDENAS | 80.013.975 |
| 8 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 2 | VÍCTOR VARGAS | 6.663.061 |
| 9 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 3 | MANUEL MEJÍA | 5.166.600 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | CEDULA |
|------|---|------------------------|---------------|
| 10 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 4 | DANY SOLARTE | 15.817.010 |
| 11 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 5 | FRANCISCO PENAGOS | 79.152.749 |
| 12 | INGENIERO PROYECTO DE ADQUISICIÓN 1 | NO REQUERIDO | NA |
| 13 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 1 | DEISY XIOMARA RIVERA | 1.094.248.794 |
| 14 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 2 | CESAR POVEDA | 80.758.088 |
| 15 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 1 | MAURICIO SIERRA | 9.873.158 |
| 16 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 2 | ERNESTO GALEANO | 10.014.624 |
| 17 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 1 | MARIO FREDY PRIETO | 80.122.702 |
| 18 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 2 | KATHERINE MENDEZ | 39.047.961 |
| 19 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 3 | ANDRÉS ENRIQUE MAYORGA | 80.543.218 |
| 20 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 4 | FRANCISCO SOLARTE | 16.658.896 |
| 21 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 5 | GUBER ALFONSO LEÓN | 1.022.325.506 |
| 22 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 6 | LUIS FERNANDO PINZÓN | 80.249.697 |
| 23 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 7 | MAGLA LICED PINTO | 1.092.346.668 |
| 24 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 8 | STEFHANIE ARCHOBOLD | 55.312.167 |
| 25 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 9 | YULY CARREÑO | 1.098.657.335 |
| 26 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 10 | FREDY MARTINEZ | 1.022.351.408 |
| 27 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 11 | LUIS MAURICIO MUÑOZ | 80.068.764 |
| 28 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 12 | HENRY RODRIGUEZ | 79.840.789 |
| 29 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 13 | PAOLA BORDA | 1.032.450.542 |
| 30 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 14 | ANDERSON PARADA | 79.891.117 |
| 31 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 15 | JORGE ORTIZ | 72.311.537 |
| 32 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 16 | JHONATAN URUEÑA OCHOA | 72.292.968 |
| 33 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 17 | CARLOS MORALES | 14.395.560 |
| 34 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 1 | MARY LUZ BUITRAGO | 52.528.868 |
| 35 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 2 | NO REQUERIDO | NA |
| 36 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 3 | PIEDAD AREVALO | 52.814.221 |

Tabla 17. Listado personal interventoría a corte 31 de marzo de 2020.

Durante el mes de abril de 2020 no se presentaron cambios de personal:

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | CEDULA |
|------|--|-----------------------|---------------|
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | OSCAR FAJARDO | 97.470.859 |
| 2 | ASESOR FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO | MILENA BERMÚDEZ | 52.957.153 |
| 3 | ASESOR JURÍDICO | CLARA ÁLZATE | 52.967.071 |
| 4 | ASESOR TÉCNICO | EMMANUEL OSPINA | 10.030.485 |
| 5 | COORDINADOR TÉCNICO 1 | JUAN FERNANDO BARRERO | 5.826.043 |
| 6 | COORDINADOR TÉCNICO 2 | RAFAEL BERRIO | 88.263.338 |
| 7 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 1 | PEDRO CARDENAS | 80.013.975 |
| 8 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 2 | VÍCTOR VARGAS | 6.663.061 |
| 9 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 3 | MANUEL MEJÍA | 5.166.600 |
| 10 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 4 | DANY SOLARTE | 15.817.010 |
| 11 | INGENIERO PROYECTO DE ADQUISICIÓN 1 | NO REQUERIDO | NA |
| 12 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 1 | DEISY XIOMARA RIVERA | 1.094.248.794 |
| 13 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 2 | CESAR POVEDA | 80.758.088 |
| 14 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 1 | MAURICIO SIERRA | 9.873.158 |
| 15 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 2 | ERNESTO GALEANO | 10.014.624 |
| 16 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 1 | MARIO FREDY PRIETO | 80.122.702 |
| 17 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 2 | KATHERINE MENDEZ | 39.047.961 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | CEDULA |
|------|---|------------------------|---------------|
| 18 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 3 | ANDRÉS ENRIQUE MAYORGA | 80.543.218 |
| 19 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 4 | FRANCISCO SOLARTE | 16.658.896 |
| 20 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 5 | GUBER ALFONSO LEÓN | 1.022.325.506 |
| 21 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 6 | LUIS FERNANDO PINZÓN | 80.249.697 |
| 22 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 7 | MAGLA LICED PINTO | 1.092.346.668 |
| 23 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 8 | STEFHANIE ARCHOBOLD | 55.312.167 |
| 24 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 9 | YULY CARREÑO | 1.098.657.335 |
| 25 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 10 | FREDY MARTINEZ | 1.022.351.408 |
| 26 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 11 | LUIS MAURICIO MUÑOZ | 80.068.764 |
| 27 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 12 | HENRY RODRIGUEZ | 79.840.789 |
| 28 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 13 | PAOLA BORDA | 1.032.450.542 |
| 29 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 14 | ANDERSON PARADA | 79.891.117 |
| 30 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 15 | JORGE ORTIZ | 72.311.537 |
| 31 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 16 | CARLOS MORALES | 14.395.560 |
| 32 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 1 | MARY LUZ BUITRAGO | 52.528.868 |
| 33 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 2 | NO REQUERIDO | NA |
| 34 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 3 | PIEDAD AREVALO | 52.814.221 |

Tabla 18. Listado personal interventoría a corte 30 de abril de 2020.

Durante el mes de mayo de 2020, no se presentaron cambios de personal:

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | CEDULA |
|------|--|------------------------|---------------|
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | OSCAR FAJARDO | 97.470.859 |
| 2 | ASESOR FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO | MILENA BERMÚDEZ | 52.957.153 |
| 3 | ASESOR JURÍDICO | CLARA ÁLZATE | 52.967.071 |
| 4 | ASESOR TÉCNICO | EMMANUEL OSPINA | 10.030.485 |
| 5 | COORDINADOR TÉCNICO 1 | JUAN FERNANDO BARRERO | 5.826.043 |
| 6 | COORDINADOR TÉCNICO 2 | RAFAEL BERRIO | 88.263.338 |
| 7 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 1 | PEDRO CARDENAS | 80.013.975 |
| 8 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 2 | VÍCTOR VARGAS | 6.663.061 |
| 9 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 3 | MANUEL MEJÍA | 5.166.600 |
| 10 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 4 | DANY SOLARTE | 15.817.010 |
| 11 | INGENIERO PROYECTO DE ADQUISICIÓN 1 | NO REQUERIDO | NA |
| 12 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 1 | DEISY XIOMARA RIVERA | 1.094.248.794 |
| 13 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 2 | CESAR POVEDA | 80.758.088 |
| 14 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 1 | MAURICIO SIERRA | 9.873.158 |
| 15 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 2 | ERNESTO GALEANO | 10.014.624 |
| 16 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 1 | MARIO FREDY PRIETO | 80.122.702 |
| 17 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 2 | KATHERINE MENDEZ | 39.047.961 |
| 18 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 3 | ANDRÉS ENRIQUE MAYORGA | 80.543.218 |
| 19 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 4 | FRANCISCO SOLARTE | 16.658.896 |
| 20 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 5 | GUBER ALFONSO LEÓN | 1.022.325.506 |
| 21 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 6 | LUIS FERNANDO PINZÓN | 80.249.697 |
| 22 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 7 | MAGLA LICED PINTO | 1.092.346.668 |
| 23 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 8 | STEFHANIE ARCHOBOLD | 55.312.167 |
| 24 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 9 | YULY CARREÑO | 1.098.657.335 |
| 25 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 10 | FREDY MARTINEZ | 1.022.351.408 |
| 26 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 11 | LUIS MAURICIO MUÑOZ | 80.068.764 |
| 27 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 12 | HENRY RODRIGUEZ | 79.840.789 |
| 28 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 13 | PAOLA BORDA | 1.032.450.542 |
| 29 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 14 | ANDERSON PARADA | 79.891.117 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | CEDULA |
|------|---|-------------------|------------|
| 30 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 15 | JORGE ORTIZ | 72.311.537 |
| 31 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 16 | CARLOS MORALES | 14.395.560 |
| 32 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 1 | MARY LUZ BUITRAGO | 52.528.868 |
| 33 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 2 | NO REQUERIDO | NA |
| 34 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 3 | PIEDAD AREVALO | 52.814.221 |

Tabla 19. Listado personal interventoría a corte 31 de mayo de 2020.

Durante el mes de junio de 2020, se realizó un cambio de personal el cual se formalizo mediante acta No 08, para el siguiente cargo:

Inspector técnico/tecnológico 5:
 Personal inicial: Guber Alfonso León
 Cambio: Francisco Penagos

| ÍTEM | CARGO | NOMBRE | CEDULA |
|-----------|---|--------------------------|-------------------|
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | OSCAR FAJARDO | 97.470.859 |
| 2 | ASESOR FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO | MILENA BERMÚDEZ | 52.957.153 |
| 3 | ASESOR JURÍDICO | CLARA ÁLZATE | 52.967.071 |
| 4 | ASESOR TÉCNICO | EMMANUEL OSPINA | 10.030.485 |
| 5 | COORDINADOR TÉCNICO 1 | JUAN FERNANDO BARRERO | 5.826.043 |
| 6 | COORDINADOR TÉCNICO 2 | RAFAEL BERRIO | 88.263.338 |
| 7 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 1 | PEDRO CARDENAS | 80.013.975 |
| 8 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 2 | VÍCTOR VARGAS | 6.663.061 |
| 9 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 3 | MANUEL MEJÍA | 5.166.600 |
| 10 | INGENIERO PROYECTO DE MANTENIMIENTO 4 | DANY SOLARTE | 15.817.010 |
| 11 | INGENIERO PROYECTO DE ADQUISICIÓN 1 | NO REQUERIDO | NA |
| 12 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 1 | DEISY XIOMARA RIVERA | 1.094.248.794 |
| 13 | INGENIERO PROYECTO DE CONECTIVIDAD 2 | CESAR POVEDA | 80.758.088 |
| 14 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 1 | MAURICIO SIERRA | 9.873.158 |
| 15 | INGENIERO PROYECTO DE ENERGIZACIÓN 2 | ERNESTO GALEANO | 10.014.624 |
| 16 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 1 | MARIO FREDY PRIETO | 80.122.702 |
| 17 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 2 | KATHERINE MENDEZ | 39.047.961 |
| 18 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 3 | ANDRÉS ENRIQUE MAYORGA | 80.543.218 |
| 19 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 4 | FRANCISCO SOLARTE | 16.658.896 |
| 20 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 5 | FRANCISCO PENAGOS | 79.152.749 |
| 21 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 6 | LUIS FERNANDO PINZÓN | 80.249.697 |
| 22 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 7 | MAGLA LICED PINTO | 1.092.346.668 |
| 23 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 8 | STEFHANIE ARCHOBOLD | 55.312.167 |
| 24 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 9 | YULY CARREÑO | 1.098.657.335 |
| 25 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 10 | FREDY MARTINEZ | 1.022.351.408 |
| 26 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 11 | LUIS MAURICIO MUÑOZ | 80.068.764 |
| 27 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 12 | HENRY RODRIGUEZ | 79.840.789 |
| 28 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 13 | PAOLA BORDA | 1.032.450.542 |
| 29 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 14 | ANDERSON PARADA | 79.891.117 |
| 30 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 15 | JORGE ORTIZ | 72.311.537 |
| 31 | INSPECTOR TÉCNICO/TECNOLÓGICO 16 | CARLOS MORALES | 14.395.560 |
| 32 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 1 | MARY LUZ BUITRAGO | 52.528.868 |
| 33 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 2 | NO REQUERIDO | NA |
| 34 | INTERV. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 3 | PIEDAD AREVALO | 52.814.221 |

Tabla 20. Listado personal interventoría a corte 30 de junio de 2020.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Se adjunta certificado expedido por el Ministerio de Trabajo del personal en condiciones de discapacidad de cada una de las empresas que conforma el consorcio SMARTY-SCAIN 2019 (Anexo No. 3).

2.2.3 Matriz de autocontrol

La matriz de autocontrol de la interventoría se anexa al presente informe (Anexo No. 4).

2.2.4 Comunicaciones

Durante el periodo del 1 al 30 de julio de 2020, esta interventoría realizó las siguientes comunicaciones a la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, las cuales se relacionan en la Tabla 21. (Anexo No. 5):

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | ENVIADO | ASUNTO |
|--------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|
| OFICIO | CSS-P136-00186-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 1-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN PRÓRROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 914 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00187-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 1-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | : RESPUESTA AL OFICIO CON RADICADO NÚMERO: 20205410296011-1- SOLICITUD TRASLADO CÁMARAS UBICADAS EN: 1.) CALLE 10 CON CARRERA 89 Y 2.) AVENIDA CIUDAD DE CALI CON CALLE 12, COSTADO OCCIDENTAL. |
| OFICIO | CSS-P136-00188-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 3-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL OFICIO CON RADICADO NÚMERO: 20205410296011-1- SOLICITUD TRASLADO CÁMARAS UBICADAS EN: 1.) CALLE 10 CON CARRERA 89 Y 2.) AVENIDA CIUDAD DE CALI CON CALLE 12, COSTADO OCCIDENTAL. |
| OFICIO | CSS-P136-00189-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 3-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | REPORTE ESTADO PAGOS DEL FDL ANTONIO NARIÑO Y RAFAEL URIBE URIBE |
| OFICIO | CSS-P136-00191-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 7-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA A LA SOLICITUD RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN CIUDADANO - 20205410316011 |
| OFICIO | CSS-P136-00192-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 7-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE TRASLADO DEL PUNTO CCEL04_011 LOCALIDAD DE SANTA FE |
| OFICIO | CSS-P136-00194-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 8-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | ENVIADO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|
| CORREO | P136-SSCJ-01139-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 10-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORMACIÓN DEL TRASLADO PROVISIONAL DE LOS PUNTOS PAQ62 DEL PROYECTO ALCALDÍAS Y SCJ17E070048 DEL PROYECTO 732 |
| OFICIO | CSS-P136-00195-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 10-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ACLARACIONES DEL INSTALACIÓN DEL REPUESTO DE VIDEO WALL |
| OFICIO | CSS-P136-00196-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 10-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA A SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE LOS 6 BIENES DE LA SDSCJ, SI CORRESPONDE AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. |
| CORREO | P136-SSCJ-01142-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 11-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SEGUIMIENTO A SOLICITUDES REALIZADAS POR LA MEBOG ESTACIONES DE POLICÍA |
| CORREO | P136-SSCJ-01146-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 13-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ESTUDIO DE MERCADO SOBRE PORTE DE 46", CONVERTIDORES DE CONEXIÓN DE VISUALIZACIÓN Y UNIDAD DE DVD. |
| CORREO | P136-SSCJ-01148-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 13-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO EN LA ACE PRINCIPAL C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00197-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 14-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO DE 2020 CONTRATO 756 DE 2019 CODENSA. |
| OFICIO | CSS-P136-00198-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 14-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA CODENSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2020 PAGO NO 13 CONTRATO 756 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00199-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 14-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA PARA DÉCIMO TERCER PAGO CONTRATISTA ETB CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO 914 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00200-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 14-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 CONTRATISTA ETB CONTRATO 914 DE 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | ENVIADO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|
| OFICIO | CSS-P136-00201-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 15-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA NO 10 PARA TRAMITE DEL DÉCIMO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019. |
| OFICIO | CSS-P136-00202-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 15-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN DEL INFORME NO 10 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 PARA TRAMITE DEL DÉCIMO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019. |
| CORREO | P136-SSCJ-01167-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 16-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | AUTORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CAI MODELO Y BACHUÉ PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |
| CORREO | P136-SSCJ-01170-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 16-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS ROBOTIZACIÓN SERVIDOR SUBA |
| CORREO | P136-SSCJ-01177-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 16-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PROYECCIÓN PAC AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 |
| OFICIO | CSS-P136-00203-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 16-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO 2020, UT SERVICIOS MNT VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CONTRATO 780 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00204-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 16-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA UT SERVICIOS MNT VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO 780 DE 2019 |
| CORREO | P136-SSCJ-01182-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 18-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS VERIFICACIÓN CONFIGURACIÓN TOURS |
| CORREO | P136-SSCJ-01183-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 18-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS CONFIGURACIÓN EQUIPO PROCERA |
| CORREO | P136-SSCJ-01184-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 20-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | REVISIÓN CENTROS COMERCIALES |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | ENVIADO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|
| OFICIO | CSS-P136-00205-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 20-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN SERGIO VALDÉS BELTRÁN. DERECHO DE PETICIÓN NÚMERO: 20205410331061 |
| CORREO | P136-SSCJ-01187-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 22-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PRESENTACIÓN INTERVENTORÍA 21-07-2020. |
| OFICIO | CSS-P136-00206-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 22-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 914 DE 2019. |
| CORREO | P136-SSCJ-01189-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 22-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE UNIFICACIÓN DEL ENLACE DE ETB DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA (SCJ18ESP00008_1 Y SCJ17FJ 0021) (SCJ18ES P00007_1 Y SCJ17FJ 0002) CORRESPONDIENTE ALPROYECTO 732 |
| CORREO | P136-SSCJ-01190-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 23-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORME PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA CON FALLAS |
| OFICIO | CSS-P136-00207-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 23-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL CORREO PROPOSICIÓN 575 - SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. |
| OFICIO | CSS-P136-00208-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 24-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 780 DE 2019 - MODIFICACIÓN 3. |
| OFICIO | CSS-P136-00209-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 24-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INSUMO PARA DAR RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN DE LA LOCALIDAD CHAPINERO CON RADICADO 2020-5410333651. |
| OFICIO | CSS-P136-00210-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 24-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN: DIAGNOSTICO SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA - CONCEJAL JUAN JAVIER BAENA MERLANO. |
| CORREO | P136-SSCJ-01206-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 27-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS CONFIGURACIÓN EQUIPO PROCERA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | ENVIADO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|
| CORREO | P136-SSCJ-01208-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 28-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | VENTANA DE MANTENIMIENTO - ETB - CRQ000000064109 |
| CORREO | P136-SSCJ-01209-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 28-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ENVIÓ DE INFORMACIÓN DE LAS ACTAS REALIZADAS EN CAMPO DE LOS POSTES DE CÁMARA ENTREGADOS EN CUSTODIA A LOS CONTRATISTAS DEL IDU |
| OFICIO | CSS-P136-00211-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 29-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 756 DE 2019. |
| OFICIO | CSS-P136-00212-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 30-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN NUMERAL 6 – YEFFER YESID VEGA BOBADILLA CONCEJAL DE BOGOTÁ. |
| OFICIO | CSS-P136-00213-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 30-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA A LOS COMUNICADOS: - S-2020-233302/SUBCO-CAD 1.10 – SOLICITUD BLOQUEAR E IMPEDIR EL ACCESO A SITIOS Y PÁGINAS WEB DE INTERNET. - S-2020-235433/SUBCO-CAD 1.10 – SOLICITUD SERVICIO WEB DE ARCGIS MAPAS CÁMARAS EN CADA PUESTO DE TRABAJO. |
| OFICIO | CSS-P136-00214-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 30-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL COMUNICADO: S-2020-235439/SUBCO-CAD 1.10 – SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. |
| OFICIO | CSS-P136-00215-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 30-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL COMUNICADO: S-2020-235455/SUBCO-CAD 1.10 – SOLICITUD AVANCE DE ACTUALIZACIÓN SALA DE VIDEO DE CHAPINERO |
| OFICIO | CSS-P136-00216-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 30-JUL-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA A LOS COMUNICADOS: - S-2020-235422/SUBCO-CAD1.10 – SOLICITUD ARREGLO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DATA CENTER. - S-2020-235470/SUBCO-CAD1.10 – SOLICITUD TRASLADO TRANSFORMADOR SALA DE VIDEO PUENTE ARANDA. |

Tabla 21. Comunicaciones julio de 2020 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Comunicaciones junio 2020:

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|
| CORREO | P136-SSCJ-00997-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 1-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | REPORTE DE NOVEDAD PRESENTADA EN EL PUNTO 5243 UBICADO EN LA PLAZA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 350. |
| CORREO | P136-SSCJ-00998-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 1-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | VISUALIZACIÓN CÁMARAS EN CENTROS DE MONITOREO |
| OFICIO | CSS-P136-00161-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 2-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA A SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE LOS 5 BIENES DE LA SDSCJ, SI CORRESPONDE AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. |
| OFICIO | CSS-P136-00162-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 4-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN NÚMERO 04 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y CODENSA S.A E.S.P. |
| OFICIO | CSS-P136-00163-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 4-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ALERTA SOBRE POSIBLE DAÑO Y PERDIDA DE GARANTÍA DE EQUIPOS INSTALADOS EN DATACENTER (BOMBEROS) Y C4, |
| CORREO | P136-SSCJ-01006-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 4-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN NÚMERO 04 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y CODENSA S.A E.S.P. |
| CORREO | P136-SSCJ-01009-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 5-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE INSTALACIÓN DEL PANEL SOLAR PARA EL PUNTO SCJ17E100019 PROYECTO 732 |
| OFICIO | CSS-P136-00164-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 6-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORMACIÓN DE 2 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA, LOS CUALES PRESENTAN LA NOVEDAD DE POSTE DESAPLOMADO. |
| OFICIO | CSS-P136-00165-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 7-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL CORREO CON ASUNTO: CONCEJAL PEDRO JULIÁN LÓPEZ. |
| CORREO | P136-SSCJ-01022-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 8-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|
| CORREO | P136-SSCJ-01027-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 9-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00167-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 11-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | CONCEPTO TÉCNICO ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE TAPA ANTIVANDÁLICA, PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. |
| OFICIO | CSS-P136-00168-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 11-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2020 CONTRATO 756 DE 2019 CODENSA |
| OFICIO | CSS-P136-00169-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 11-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA CODENSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2020 PAGO NO 12 CONTRATO 756 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00170-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 11-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA NO 9 PARA TRÁMITE DEL NOVENO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019. |
| OFICIO | CSS-P136-00171-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 11-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN INFORME NO 9 MES DE MAYO DE 2020 PARA TRÁMITE DEL NOVENO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019. |
| OFICIO | CSS-P136-00172-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 11-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA PARA DECIMO SEGUNDO PAGO CONTRATISTA ETB CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 CONTRATO 914 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00173-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 11-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 CONTRATISTA ETB CONTRATO 914 DE 2019 |
| CORREO | P136-SSCJ-01039-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 12-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ESTUDIO DE MERCADO VIDEO WALL C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-01041-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 12-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: MIGRACIÓN VRF COSEC CIUDAD BOLÍVAR Y PUENTE ARANDA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|
| OFICIO | CSS-P136-00174-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 12-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 PAGO NO 14 CONTRATO 780 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00175-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 13-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES MAYO 2020, UT SERVICIOS MNT VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CONTRATO 780 DE 2019. |
| CORREO | P136-SSCJ-01046-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 16-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | APROBACIÓN DE COSTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE TAPAS ESPECIALES (ANTI - VANDALISMO). |
| CORREO | P136-SSCJ-01047-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 16-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO DE FABRICANTE BOSCH EN LA NOVEDAD PRESENTADA EN EL COSEC DE KENNEDY (TOURS) |
| CORREO | P136-SSCJ-01048-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 16-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: MIGRACIÓN VRF COSEC BARRIOS UNIDOS |
| OFICIO | CSS-P136-00176-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 16-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DOCUMENTO RADICADO EN LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ CON NUMERO: 2020EE292227 – SINPROC: 2758659. – DENUNCIA PRESENTADA POR EL H. CONCEJAL JORGE LUIS COLMENARES, ACTUACIONES DE LA SDSCJ FRENTE AL FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA DE B |
| CORREO | P136-SSCJ-01058-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 18-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESULTADO DE LA REVISIÓN PARA LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR EL IDU, CON RESPECTO A LA OBRA DE LA AVENIDA GUAYACANES |
| CORREO | P136-SSCJ-01060-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 18-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | MATERIALES Y EQUIPOS IDENTIFICADOS PARA REEMPLAZO DE LA TERCERA RONDA DE COSECS. |
| CORREO | P136-SSCJ-01061-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 18-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ENTREGA DE INFORME DE EQUIPOS A INSTALAR Y SERVICIOS A REALIZAR EN EL SUBSISTEMA CTP |
| CORREO | P136-SSCJ-01065-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 18-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ENTREGA DE INFORME DE EQUIPOS A INSTALAR Y SERVICIOS A REALIZAR EN EL SUBSISTEMA TRANSMILENIO |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|
| CORREO | P136-SSCJ-01068-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 18-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: MIGRACIÓN VRF COSEC |
| CORREO | P136-SSCJ-01072-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 19-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | CAIDA DE SERVIDORES DATACENTER |
| CORREO | P136-SSCJ-01073-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 19-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INGRESO DATACENTER BOMBEROS |
| OFICIO | CSS-P136-00177-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 23-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN DE PRÓRROGA NO. 3 AL CONTRATO 780 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LA UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019. |
| OFICIO | CSS-P136-00178-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 23-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA A ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GENERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRA. |
| OFICIO | CSS-P136-00179-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 23-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL COMUNICADO S-2020-185892 – INFORME NOVEDAD SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MEBOG. |
| CORREO | P136-SSCJ-01080-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 24-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: MIGRACIÓN VRF COSEC |
| CORREO | P136-SSCJ-01083-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 24-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SEGUIMIENTO A SOLICITUDES REALIZADAS POR LA MEBOG EN EL PROYECTO CAI |
| CORREO | P136-SSCJ-01085-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 25-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA APROBADOS POR LA OAIEE PARA TRASLADO POR OBRAS DEL IDU |
| OFICIO | CSS-P136-00180-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 25-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE TRASLADO DEL PUNTO CCEL04_011 LOCALIDAD DE SANTA FE. |
| OFICIO | CSS-P136-00181-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 25-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA | RESPUESTA AL OFICIO NÚMERO: 20205410249881 REMITIDO POR LA UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ MÁS SEGURA 2017 - NOVEDAD PUNTOS |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|
| | | | | Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | VIDEO VIGILANCIA SCJ17FJ0002 Y SCJ18ESP00007_1 |
| CORREO | P136-SSCJ-01092-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 26-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD INGRESO VERIFICACIÓN FALLA ENLACE DATACENTER BOMBEROS |
| CORREO | P136-SSCJ-01095-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 27-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENLACE PRINCIPAL Y BACKUP |
| CORREO | P136-SSCJ-01100-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 27-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD INGRESO VERIFICACIÓN FALLA ENLACE DATACENTER BOMBEROS |
| CORREO | P136-SSCJ-01102-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 29-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ACTUALIZACIÓN PERMISOS DE INGRESO C4 - MENSUAL |
| CORREO | P136-SSCJ-01103-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 29-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO DATACENTER BOMBEROS |
| OFICIO | CSS-P136-00182-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 30-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIONES ORIENTADAS HACIA UNA MEJORA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y ESTADO DEL CONTRATO 780 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00183-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 30-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN NÚMERO 04 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y CODENSA S.A E.S.P. |
| OFICIO | CSS-P136-00184-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 30-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN DE PRÓRROGA 3 AL CONTRATO 780 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LA UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019. |
| OFICIO | CSS-P136-00185-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 30-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DP CONCEJAL ROLANDO GONZÁLEZ GARCÍA. |
| CORREO | P136-SSCJ-01110-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 30-JUN-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | VISITA TÉCNICA DATACENTER C4 |

Tabla 22. Comunicaciones junio de 2020 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Comunicaciones mayo 2020:

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|
| OFICIO | CSS-P136-00146-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 5-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 756 DE 2019. |
| CORREO | P136-SSCJ-00908-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 7-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO DATACENTER BOMBEROS |
| CORREO | P136-SSCJ-00909-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 7-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: RE-CONFIGURACIÓN DEL DISEÑO LAN |
| CORREO | P136-SSCJ-00910-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 8-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | VENTANAS DE MANTENIMIENTO - ETB |
| OFICIO | CSS-P136-00147-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 11-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN NUMERO: 875132020 PETICIONARIO: PEDRO ADELMO MELO CETINA, GESTOR SOCIAL Y COMUNITARIO. |
| OFICIO | CSS-P136-00148-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 12-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA CODENSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DE 2020 PAGO NO 11 CONTRATO 756 DE 2019. |
| OFICIO | CSS-P136-00149-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 12-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DE 2020 CONTRATO 756 DE 2019 CODENSA. |
| OFICIO | CSS-P136-00150-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 13-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA NO 8 PARA TRÁMITE DEL OCTAVO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019. |
| OFICIO | CSS-P136-00151-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 13-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA PARA DECIMO PRIMER PAGO CONTRATISTA ETB CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 CONTRATO 914 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00152-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 13-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 CONTRATISTA ETB CONTRATO 914 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00153-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 13-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN INFORME NO 8 MES DE ABRIL DE 2020 PARA TRÁMITE DEL OCTAVO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019. |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|
| CORREO | P136-SSCJ-00931-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 14-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: PRUEBA DE ENLACE BACKUP C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00154-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 14-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 PAGO NO 13 CONTRATO 780 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00155-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 14-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL 2020, UT SERVICIOS MNT VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CONTRATO 780 DE 2019 |
| CORREO | P136-SSCJ-00936-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 16-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ENTREGA DE COTIZACIONES DE LA CÁMARA DE INDIGOVISION VANDALIZADA EN LAS ESTACIONES DE RICAURTE Y JIMÉNEZ CORRESPONDIENTES AL PROYECTO TRANSMILENIO |
| CORREO | P136-SSCJ-00946-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 18-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PAC JUNIO Y JULIO DE 2020 |
| OFICIO | CSS-P136-00156-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 20-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL CORREO CON ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN DP. 20205410247671 |
| CORREO | P136-SSCJ-00959-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 21-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE PRINCIPAL C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00960-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 21-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | P136-SSCJ-00517-2020 SOLICITUD DE INSTALACIÓN DEL PANEL SOLAR PENDIENTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE 22 PANELES SOLARES EN EL PUNTO 191 DEL PROYECTO ESU |
| CORREO | P136-SSCJ-00963-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 22-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO DE MEBOG PARA ACTIVIDADES CÁMARA AL1716 |
| OFICIO | CSS-P136-00159-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 22-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL RADICADO - 20205410258211. DAÑO DE TAPA DE CAJA DE INSPECCIÓN UBICADA EN LA CARRERA 13 NO. 58-83 (LOCALIDAD DE CHAPINERO). |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|
| CORREO | P136-SSCJ-00967-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 22-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORMACIÓN DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA DOMOS CIUDADANOS (FVS, ESU Y 350) Y LOS SUBSISTEMAS (CTP, CAI, TRANSMILENIO, COSEC ESTADIO, C4 Y DATA CENTER BOMBEROS) |
| OFICIO | CSS-P136-00160-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 23-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | CONCEPTO TÉCNICO PARA LA CONTINUIDAD DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA CON EL OPERADOR DE RED CODENSA S.A E.S.P., DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA DE BOGOTÁ. |
| CORREO | P136-SSCJ-00981-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 28-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD INFORMACIÓN SOPORTES DE LCD DE COSECS DE PUENTE ARANDA Y CIUDAD BOLIVAR. |
| CORREO | P136-SSCJ-00992-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 31-MAY-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ACTUALIZACIÓN PERMISOS DE INGRESO C4 - MENSUAL |

Tabla 23. Comunicaciones mayo de 2020 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019.

Comunicaciones abril 2020:

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|
| CORREO | P136-SSCJ-00827-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 1-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ALCANCE AL RADICADO 2020-541-0022211-1: RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN - 2020-541-020760-1. (INSUMO PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN FUNCIONAMIENTO CÁMARAS DE SEGURIDAD - USME). |
| CORREO | P136-SSCJ-00831-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 3-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORMACIÓN HOJA DE VIDA CÁMARAS VIDEO VIGILANCIA BOGOTÁ |
| CORREO | P136-SSCJ-00835-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 3-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | NOVEDAD COVID-19 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|
| OFICIO | CSS-P136-00127-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 3-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN PRÓRROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 914 DE 2019, CONTRATISTA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. |
| OFICIO | CSS-P136-00128-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 6-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN NÚMERO 03 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y CODENSA S.A E.S.P. |
| CORREO | P136-SSCJ-00840-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 9-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ACTUALIZACIÓN PERMISOS DE INGRESO C4 - MENSUAL |
| OFICIO | CSS-P136-00129-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 14-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | REPORTE NOVEDADES PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA UT BOGOTÁ MAS SEGURA |
| OFICIO | CSS-P136-00130-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 15-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA NO 7 PARA TRÁMITE DEL SÉPTIMO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019. |
| OFICIO | CSS-P136-00131-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 15-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA PARA DECIMO PAGO CONTRATISTA ETB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 CONTRATO 914 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00132-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 15-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A MARZO 2020 CONTRATISTA ETB CONTRATO 914 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00133-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 15-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA CODENSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020 PAGO NO 10 CONTRATO 756 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00134-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 15-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020 CONTRATO 756 DE 2019 CODENSA. |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|
| OFICIO | CSS-P136-00135-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 15-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 PAGO NO 12 CONTRATO 780 DE 2019. |
| OFICIO | CSS-P136-00136-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 15-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2020, UT SERVICIOS MNT VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CONTRATO 780 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00137-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 15-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN INFORME NO.7 PERIODO MARZO DE 2020 PARA TRÁMITE DEL SÉPTIMO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019. |
| OFICIO | CSS-P136-00138-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 16-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 756 DE 2019. |
| OFICIO | CSS-P136-00139-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 16-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 914 DE 2019. |
| CORREO | P136-SSCJ-00857-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 16-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RETIRO PROVISIONAL DE LOSEQUIPOS DEL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA 148 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ESUUBICADO EN LA CALLE 11 CON CARRERA 8 PLAZA DE BOLIVAR |
| CORREO | P136-SSCJ-00858-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 16-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE REINICIO DE ACTIVIDADES PARA EL CANAL BACKUP, MIGRACION VRF COSEC Y CAMBIO DEL ROUTER PRINCIPAL. |
| CORREO | P136-SSCJ-00859-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 17-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | AUTORIZACIÓN CONEXIÓN EN CENTROS DE MONITOREO |
| CORREO | P136-SSCJ-00863-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 18-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA SOBRE EL CONCEPTO TÉCNICO DE LOS BIENES SOLICITADOS POR EL ALMACÉN DE LA SDSCJ |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|
| CORREO | P136-SSCJ-00865-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 18-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA SOBRE EL CONCEPTO TÉCNICO DE LOS BIENES SOLICITADOS POR EL ALMACÉN DE LA SDSCJ |
| CORREO | P136-SSCJ-00867-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 20-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN S-2020-109124/MEBOG-SUBCO-CAD 1.10 |
| CORREO | P136-SSCJ-00870-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 20-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA A SOLICITUD DE VIABILIDAD DE UTILIZACIÓN DE BIENES DISPONIBLES EN EL ALMACÉN DE LA SDSCJ EN EL CONTRATO 780 DE 2019 |
| CORREO | P136-SSCJ-00879-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 23-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DEL ROUTER PRINCIPAL |
| CORREO | P136-SSCJ-00880-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 23-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00882-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 24-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | MATRICES EXCEL VALIDACIÓN DE CAMPOS DE GLPI |
| CORREO | P136-SSCJ-00886-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 25-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA A LOS 3 PUNTOS DEVIDEOVIGILANCIA DEL PROYECTO FVS, QUE CUENTAN CON OBSERVACIONES POR PARTE DE LAOAIIE |
| CORREO | P136-SSCJ-00887-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 26-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PUNTOS DEVIDEOVIGILANCIA PENDIENTE DE APROBACIÓN DE LA OAIIE PARA TRASLADO POR OBRAS DELIDU |
| CORREO | P136-SSCJ-00890-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 27-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DEL ROUTER PRINCIPAL |
| CORREO | P136-SSCJ-00891-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 27-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ENTREGA DE COTIZACIONES DE LA CÁMARA MOBOTIX VANDALIZADA EN EL CTP. |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA SOLICITUD | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|
| CORREO | P136-SSCJ-00894-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 28-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ACTUALIZACIÓN PERMISOS DE INGRESO C4 - MENSUAL |
| OFICIO | CSS-P136-00140-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 29-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN – REMITIDO POR LA CONCEJAL DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETA. |
| OFICIO | CSS-P136-00141-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 29-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL RADICADO - 20203100029971. SOLICITUD COPIA DE LOS PERMISOS DE INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO, PARA LA INSTALACIÓN DE POSTE DE VIGILANCIA UBICADO EN LA INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE 33 A, DIAGONAL 33 BIS A Y CARRERA 16 AL COSTADO ORIENTAL |
| OFICIO | CSS-P136-00142-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 29-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ANÁLISIS PROPUESTA EMITIDA POR CODENSA S.A E.S.P., FRENTE A LOS CASOS DE VANDALISMO QUE SE PRESENTAN EN LA CÁMARA AL1716., PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. |
| OFICIO | CSS-P136-00143-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 29-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | CONCEPTO TÉCNICO PROPUESTA TAPA ANTI VANDALISMO EMITIDO POR CODENSA S.A E.S.P., PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. |
| OFICIO | CSS-P136-00144-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 29-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ROBOTIZACIONES Y CALIDAD DE IMÁGENES EN RESOLUCIONES FULLHD (1920*1080P) |
| CORREO | P136-SSCJ-00899-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 30-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD |
| OFICIO | CSS-P136-00145-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 30-ABR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 780 DE 2019. |

Tabla 24. Comunicaciones abril de 2020 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Comunicaciones marzo de 2020:

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|----------|---|---|
| OFICIO | CSS-P136-00110-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 2-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PAGO NO 10 CONTRATO 780 DE 2019. |
| CORREO | P136-SSCJ-00738-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 2-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00111-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 3-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN NÚMERO: 2020-541-014177-1. VERIFICACIÓN Y CONEXIÓN DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA UPZ 25 |
| CORREO | P136-SSCJ-00739-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 3-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS |
| CORREO | P136-SSCJ-00741-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 3-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00749-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 6-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00751-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 6-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESULTADO PROTOCOLO DE CAMBIO CÁMARAS SAMSUNG 732-2017 |
| CORREO | P136-SSCJ-00752-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 6-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | TRÁMITE DE LA PRÓRROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1020 - 2019. |
| CORREO | P136-SSCJ-00753-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 9-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS |
| OFICIO | CSS-P136-00112-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 9-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA CODENSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020 PAGO NO 09 CONTRATO 756 DE 2019. |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------|---|---|
| CORREO | P136-SSCJ-00760-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 9-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00763-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 10-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO DATACENTER BOMBEROS |
| CORREO | P136-SSCJ-00764-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 10-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO DATACENTER BOMBEROS |
| CORREO | P136-SSCJ-00766-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 11-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS |
| CORREO | P136-SSCJ-00767-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 11-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORME REVISIÓN DE LA GRABACIÓN QUE NO SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LO MANIFESTADO POR MEBOG |
| OFICIO | CSS-P136-00113-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 11-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | TRAMITE SEXTO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019 Y ENTREGA SEXTO INFORME DE ACTIVIDADES. |
| OFICIO | CSS-P136-00114-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 12-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA PARA NOVENO PAGO CONTRATISTA ETB CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO 914 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00115-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 12-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INSUMO PARA DAR RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN DE LA LOCALIDAD CHAPINERO CON RADICADO 2020- 541-015188-1 CON REFERENCIA AL RADICADO 20205210012472. |
| CORREO | P136-SSCJ-00771-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 13-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | CAMBIO EN LA SUPERVISIÓN INTERNA DE CODENSA S.A E.S.P., PARA EL CONTRATO 756 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00117-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 13-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 PAGO NO 11 CONTRATO 780 DE 2019. |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------|---|---|
| OFICIO | CSS-P136-00118-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 16-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA CONCEJAL JORGE LUIS COLMENARES: "ETB COBRA POR MANTENIMIENTO DE CÁMARAS QUE NO SIRVEN EN LA CIUDAD" |
| CORREO | P136-SSCJ-00779-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 17-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE ROUTER PRINCIPAL. |
| CORREO | P136-SSCJ-00780-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 17-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO DATACENTER BOMBEROS |
| OFICIO | CSS-P136-00119-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 18-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INSUMO PARA DAR RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN DE LA LOCALIDAD CHAPINERO CON RADICADO 2020- 541-017367-1. |
| OFICIO | CSS-P136-00120-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 18-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INSUMO PARA RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN - 2020-541-020760-1. (SOLICITUD DE INFORMACIÓN FUNCIONAMIENTO CÁMARAS DE SEGURIDAD). |
| CORREO | P136-SSCJ-00792-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 18-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE LAS 7 CÁMARAS DE TRANSMILENIO ESTACIÓN RICAURTE Y JIMÉNEZ QUE FUERON OBJETO DE VANDALISMO |
| OFICIO | CSS-P136-00121-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 18-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INSUMO PARA DAR RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN DE LA LOCALIDAD CHAPINERO CON RADICADO 2020- 541-017367-1. |
| OFICIO | CSS-P136-00122-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 18-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INSUMO PARA DAR RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN DE LA LOCALIDAD CHAPINERO CON RADICADO 2020- 541-015188-1 CON REFERENCIA AL RADICADO 20205210012472. |
| CORREO | P136-SSCJ-00793-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 19-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PAC ABRIL Y MAYO DE 2020 |
| CORREO | P136-SSCJ-00795-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 19-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DEL ROUTER PRINCIPAL |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-------------------------------|-----------|---|---|
| CORREO | P136-SSCJ-00799-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 19-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERSONAL DE ETB DISPONIBLE DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2020. |
| CORREO | P136-SSCJ-00801-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 20-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS |
| OFICIO | CSS-P136-00123-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 24-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INSUMO PARA DAR RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA DEL PROYECTO, CONTRATO DE OBRA NO. 1640 DE 2019, CON RADICADO 2020- 541-018576-1. |
| CORREO | P136-SSCJ-00809-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 24-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | CORRESPONDENCIA DESDE EL 24 DE MARZO HASTA EL 13 DE ABRIL DE 2020 |
| OFICIO | CSS-P136-00124-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 27-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN - 2020541020557-1 MEBOG |
| OFICIO | CSS-P136-00125-2020 | CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019 | 27-MAR-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN DE PRÓRROGA 2 Y ADICIÓN AL CONTRATO 780 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LA UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |

Tabla 25. Comunicaciones marzo de 2020 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019.

Comunicaciones febrero 2020:

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|----------|---|---|
| CORREO | P136-SSCJ-00644-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 3-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ALCANCE AL RADICADO 2020-541-008806-1: RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN - 2020-541-007712-1. (SOLICITUD DE INFORMACIÓN FUNCIONAMIENTO) |
| OFICIO | CSS-P136-00096-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 3-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS - ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO 1020 -2019. |
| CORREO | P136-SSCJ-00646-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 4-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, | HISTORICO CONTRATO 780 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|---|
| | | | | CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | |
| CORREO | P136-SSCJ-00647-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 4-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS |
| CORREO | P136-SSCJ-00649-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 5-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS SEGURITECH |
| CORREO | P136-SSCJ-00651-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 5-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: PRUEBA DE ENLACE BACKUP C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00097-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 5-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA SOLICITUD DE VIABILIDAD DE UTILIZACIÓN DE BIENES DISPONIBLES EN EL ALMACÉN DE LA SDSCJ EN EL CONTRATO 780 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00098-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 5-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL RADICADO - 2020-541-007851-1. (TRASLADO POR COMPETENCIA - REPORTE DAÑOS EN SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA ENGATIVÁ). |
| CORREO | P136-SSCJ-00655-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 6-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES AFINAMIENTO DEL SISTEMA CONTRATO 732-2017. |
| CORREO | P136-SSCJ-00660-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 9-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS UTBASC |
| OFICIO | CSS-P136-00100-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 10-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 914 DE 2019. |
| CORREO | P136-SSCJ-00664-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 10-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | REPROGRAMACIÓN VENTANA DE MANTENIMIENTO: PRUEBA DE ENLACE BACKUP C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00101-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 12-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA CODENSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 PAGO NO 08 CONTRATO 756 DE 2019. |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|---|
| OFICIO | CSS-P136-00102-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 12-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA PARA OCTAVO PAGO CONTRATISTA ETB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 CONTRATO 914 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00103-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 13-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | TRAMITE QUINTO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019 Y ENTREGA QUINTO INFORME DE ACTIVIDADES. |
| OFICIO | CSS-P136-00104-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 13-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA LA ATENCIÓN DEL SUBSISTEMA COLEGIOS |
| CORREO | P136-SSCJ-00678-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 14-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SUBSANACIÓN DE OBSERVACIÓN REALIZADA POR LA OFICINA DE LA OAIEE, PARA LOS 2 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADOS CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA GUAYACANES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1,2 Y 5 DEL IDU. |
| CORREO | P136-SSCJ-00683-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 16-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00105-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 17-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | NOTIFICACIÓN CAMBIO DE NÚMERO DE OFICINA CONSORCIO. |
| CORREO | P136-SSCJ-00689-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 17-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | DAÑOS POR VANDALISMO A INFRAESTRUCTURA DE LA CÁMARA AL1716 LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES. |
| OFICIO | CSS-P136-00106-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 18-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN NO. 20205410122261, PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA A REUBICAR POR SOLICITUD DEL IDU UBICADA EN LA DIRECCIÓN CARRERA 91 CON CALLE 131A |
| CORREO | P136-SSCJ-00697-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 20-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|--|
| OFICIO | CSS-P136-00107-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 20-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN - 2020-541-012249-1. (DERECHO DE PETICIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN – CÁMARAS DE SEGURIDAD). |
| OFICIO | CSS-P136-00108-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 20-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL RADICADO - 2020-541-010195-1-1. NOVEDAD FUGA DE INFORMACIÓN FÍLMICA DE VIDEO VIGILANCIA. |
| CORREO | P136-SSCJ-00707-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 24-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PROGRAMACIÓN REVISIÓN ESTADO DEL SISTEMA NOCTURNO EN SALAS DE MONITOREO |
| OFICIO | CSS-P136-00109-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 25-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORME SOBRE LOS HECHOS PRESENTADOS CON ENLACE DE BACKUP C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00730-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 27-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ACTUALIZACIÓN PERMISOS DE INGRESO C4 - MENSUAL |
| CORREO | P136-SSCJ-00731-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 27-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS |
| CORREO | P136-SSCJ-00732-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 28-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SEGUIMIENTO PARÁMETROS PARA CÁMARAS HANWHA PROYECTO 732 |
| CORREO | P136-SSCJ-00733-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 28-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO DATACENTER BOMBEROS |
| CORREO | P136-SSCJ-00737-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 29-FEB-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |

Tabla 26. Comunicaciones febrero de 2020 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Comunicaciones enero 2020:

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|----------|---|---|
| CORREO | P136-SSCJ-00537-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 2-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORMACIÓN DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA DE CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS, FVS, ESU,350,732 Y ALCALDÍAS, CON NOVEDAD EN LOS SI |
| CORREO | P136-SSCJ-00538-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 2-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORME CONTRATISTA - FALLAS MASIVAS PLATAFORMA DE VIDEOVIGILANCIA EN C4. |
| CORREO | P136-SSCJ-00540-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 3-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE TRASLADO DE 11 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA DEL PROYECTO FVS, POR MOTIVO DE MODERNIZACIÓN Y POR ENCO |
| CORREO | P136-SSCJ-00541-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 3-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORMACIÓN DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA DE CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FVS, LOS CUALES SERAN OBJETO DE MODERNIZACIÓN |
| CORREO | P136-SSCJ-00544-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 4-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00548-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 7-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORME SINIESTROS DE LAS 7 CÁMARAS DE TRANSMILENIO CORRESPONDIENTES A LA ESTACIÓN RICAURTE Y JIMÉNEZ |
| CORREO | P136-SSCJ-00549-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 7-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORMACIÓN DE POSTES DESPLOMADOS, DETECTADOS POR EL CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 780 DE 2019 |
| CORREO | P136-SSCJ-00552-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 8-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE PRINCIPAL C4 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|--|
| CORREO | P136-SSCJ-00553-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 8-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00556-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 8-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ENVIÓ PAC ENERO DE 2020 |
| CORREO | P136-SSCJ-00557-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 9-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE COSEC BARRIOS UNIDOS |
| CORREO | P136-SSCJ-00559-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 9-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: PRUEBA DE ENLACE BACKUP |
| CORREO | P136-SSCJ-00563-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 10-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PLACAS NVTS ESTACIONES DE POLICÍA. |
| OFICIO | CSS-P136-00081-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 13-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN PRÓRROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 914 DE 2019, CONTRATISTA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. |
| CORREO | P136-SSCJ-00566-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 13-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO DATACENTER BOMBEROS |
| OFICIO | CSS-P136-00082-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 14-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | TRAMITE CUARTO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019 Y ENTREGA CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES. |
| CORREO | P136-SSCJ-00573-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 14-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO DATACENTER BOMBEROS |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|--|
| CORREO | P136-SSCJ-00576-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 14-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE PRINCIPAL C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00083-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 15-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA CODENSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2019 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 PAGO NO 0 |
| CORREO | P136-SSCJ-00579-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 15-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD HISTORIAL CONTRATO 780 - 2019 |
| CORREO | P136-SSCJ-00582-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 15-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL CORREO NOVEDADES ARCHIVO INTERVENTORÍA FDL, ENVIADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019. |
| OFICIO | CSS-P136-00084-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 16-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA PARA SÉPTIMO PAGO CONTRATISTA ETB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 914 DE 2019 |
| CORREO | P136-SSCJ-00584-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 16-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL CORREO, ASUNTO CÁMARAS SECUROS VS. OAIEE. |
| OFICIO | CSS-P136-00085-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 16-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN:2020-541-0000088-1 |
| CORREO | P136-SSCJ-00586-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 16-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | REITERACIÓN USUARIOS EN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA AL PERSONAL DE CALIDAD |
| CORREO | P136-SSCJ-00590-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 17-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORMES Y CUADRO ECONOMICOS RESTAURACIÓN COSECS. |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|--|
| CORREO | P136-SSCJ-00591-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 17-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORME SINIESTROS DE LAS 4 CÁMARAS MOBOTIX CORRESPONDIENTES AL CTP |
| CORREO | P136-SSCJ-00601-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 20-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ESTADO DE LAS CÁMARAS ULTRA 2K DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN |
| OFICIO | CSS-P136-00086-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 20-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN: 2020-541-005540-1 |
| OFICIO | CSS-P136-00087-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 20-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN: 2019-541-077562-1 |
| OFICIO | CSS-P136-00088-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 20-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PAGO NO 0 |
| OFICIO | CSS-P136-00090-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 21-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORMACIÓN EQUIPOS DESINSTALADOS DE COLEGIOS Y QUE NO SE ENCUENTRAN EN GARANTÍA. |
| CORREO | P136-SSCJ-00608-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 22-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | REITERACIÓN USUARIOS EN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA AL PERSONAL DE CALIDAD |
| OFICIO | CSS-P136-00091-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 22-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN DE PRORROGA CONTRATO 780 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LA UT SERVICI |
| CORREO | P136-SSCJ-00609-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 22-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | CAPACITACIÓN INTERNA INTERVENTORÍA |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|--|
| CORREO | P136-SSCJ-00611-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 22-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: PRUEBA DE ENLACE BACKUP C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00612-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 22-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | TRAMITE PERMISOS DE INGRESO A LA CÁRCEL DISTRITAL CARRERA 8 CON CALLE 1C |
| CORREO | P136-SSCJ-00617-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 25-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO DATACENTER BOMBEROS |
| OFICIO | CSS-P136-00092-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 27-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ALCANCE AL RADICADO 2020-541-006530-1 RECOMENDACIÓN DE PRÓRROGA CONTRATO 780 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD |
| OFICIO | CSS-P136-00093-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 27-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORME DE LA VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DATACENTER SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA REFERENTE AL ESTADO ACTUAL DE LAS REDES ELÉCTRI |
| CORREO | P136-SSCJ-00619-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 27-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORMACIÓN DE LA NO ATENCIÓN DEL SUBSISTEMA COLEGIOS, POR FALTA DE EQUIPOS O REPUESTOS. |
| CORREO | P136-SSCJ-00626-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 29-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00630-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 29-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ENVIÓ PAC FEBRERO Y MARZO DE 2020 |
| CORREO | P136-SSCJ-00631-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 29-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESULTADO DE VISITAS DE SITE SURVEY PARA LOS 11 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADOS CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA GUAYACANES Y OBRAS |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|--|
| OFICIO | CSS-P136-00094-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 30-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 756 DE 2019. |
| CORREO | P136-SSCJ-00633-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 30-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ACTUALIZACIÓN PERMISOS DE INGRESO C4 - MENSUAL |
| OFICIO | CSS-P136-00095-2020 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 30-ENE-20 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN - 2020-541-007712-1. (SOLICITUD DE INFORMACIÓN FUNCIONAMIENTO CÁMARAS DE SEGURIDAD). |

Tabla 27. Comunicaciones enero de 2020 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019.

Comunicaciones diciembre 2019:

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|----------|---|--|
| CORREO | P136-SSCJ-00406-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 2-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | VENTANAS DE MANTENIMIENTO - EQUIPO TARIFICADOR CUNI |
| CORREO | P136-SSCJ-00407-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 2-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD INFORMACIÓN CONTRATO 809 - AIRES Y UPS |
| CORREO | P136-SSCJ-00409-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 2-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00062-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 3-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA PUNTO VANDALIZADO AL857 - USME |
| CORREO | P136-SSCJ-00413-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 3-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00414-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 4-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PERMISOS DE ACCESO WI-FI EN C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00417-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 4-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA | ACTA ACLARATORIA ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|--|
| | | | | Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | |
| OFICIO | CSS-P136-00064-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 4-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1020 DE 2019 SMARTY-SCAIN 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00065-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 4-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | TRAMITE TERCER PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019 Y ENTREGA TERCER INFORME DE ACTIVIDADES. |
| OFICIO | CSS-P136-00066-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 5-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA CODENSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019 PAGO NO 06 CONTR |
| CORREO | P136-SSCJ-00431-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 6-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE PRINCIPAL C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00067-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 6-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 PAGO NO 0 |
| OFICIO | CSS-P136-00068-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 9-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NÚMERO 756 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGU |
| CORREO | P136-SSCJ-00443-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 9-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DE LOS 31 PUNTOS DE PANEL SOLAR CORRESPONDIENTES AL PROYECTO ESU |
| CORREO | P136-SSCJ-00444-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 9-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE COSEC BARRIOS UNIDOS |
| CORREO | P136-SSCJ-00445-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 9-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA EL CONTRATO 756 DE 2019 |
| CORREO | P136-SSCJ-00452-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 10-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00453-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 10-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, | REUNIÓN INTERNA INTERVENTORÍA |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|---|
| | | | | CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | |
| CORREO | P136-SSCJ-00459-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 12-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00071-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 12-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA PARA SEXTO PAGO CONTRATISTA ETB CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 914 DE 2019 |
| CORREO | P136-SSCJ-00460-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 12-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ENVIO PUNTOS ESU, 732 Y CCE. |
| CORREO | P136-SSCJ-00463-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 12-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ACTUALIZACION RADICADO 20191000373732 - CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENID |
| CORREO | P136-SSCJ-00472-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 15-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00477-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 17-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00479-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 18-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESULTADODE VISITAS DE SITE SURVEY PARA LOS 2 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADOS CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL DES |
| OFICIO | CSS-P136-00072-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 18-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ALCANCE AL OFICIO NO. CSS-P136-00068-2019 |
| CORREO | P136-SSCJ-00484-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 18-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICTUD DE 1 PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LAS DOS CÁMARAS DEL REDENTOR QUE FUERON DESINSTALADAS POR ADECU |
| OFICIO | CSS-P136-00074-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 18-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO 1020 DE 2019 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|--|
| OFICIO | CSS-P136-00075-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 18-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN PRÓRROGA NO. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 914 DE 2019, CONTRATISTA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOT |
| CORREO | P136-SSCJ-00495-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 20-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00497-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 20-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS |
| CORREO | P136-SSCJ-00499-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 22-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE VISITAS DE SITE SURVEY PARA LOS 2 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA DESMONTADOS DEL REDENTOR SCJ18ESP00007_1 Y SCJ |
| OFICIO | CSS-P136-00078-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 23-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN: 2019-541-079026-1 |
| CORREO | P136-SSCJ-00514-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 24-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN |
| CORREO | P136-SSCJ-00517-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 24-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA A SOLICITUD DE VIABILIDAD DE UTILIZACIÓN DE BIENES DISPONIBLES EN EL ALMACÉN DE LA SDSCJ EN EL CONTRATO 780 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00079-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 25-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DERECHA DE PETICIÓN - 2019-541-080527-1 |
| OFICIO | CSS-P136-00080-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 26-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESULTADO DE VISITAS DE SITE SURVEY PARA LOS 2 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADOS CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVE |
| CORREO | P136-SSCJ-00522-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 27-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD INFORMACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO BARRIO MARÍA PAZ |
| CORREO | P136-SSCJ-00526-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 30-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA | ACTUALIZACIÓN PERMISOS DE INGRESO C4 - MENSUAL |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|-------------------------------|
| | | | | Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | |
| CORREO | P136-SSCJ-00531-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 31-DIC-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA SOLICITUDES DEL C4. |

Tabla 28. Comunicaciones diciembre de 2019 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019.

Comunicaciones noviembre 2019:

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|----------|---|--|
| CORREO | P136-SSCJ-00279-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 5-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00284-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 6-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | TRAMITAR PERMISOS DE ACCESO WI-FI EN C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00285-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 6-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO PEM ENLACE BACKUP C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00287-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 6-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE TRASLADO DE EQUIPOS DE LOS PUNTOS DE CÁMARA 204,205 Y 249, SOLICITADOS POR LA MEBOG |
| OFICIO | CSS-P136-00033-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 7-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN - 2019-541-065600-1 |
| CORREO | P136-SSCJ-00291-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 8-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | DERECHO DE PETICIÓN VEEDURIA DISTRITAL |
| CORREO | P136-SSCJ-00292-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 8-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | FACTURACIÓN CONTRATO 914 |
| CORREO | P136-SSCJ-00294-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 8-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE BACKUP C4 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|---|
| CORREO | P136-SSCJ-00296-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 8-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00298-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 8-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES DE APOYO AL NUSE |
| CORREO | P136-SSCJ-00299-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 8-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00303-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 12-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ESTADO DETALLADO DEL CONTRATO 756 DE 2019 CON CORTE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019 |
| CORREO | P136-SSCJ-00312-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 13-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ACTA PARA APROBACION PROYECTO MIGRACION SECUROS |
| CORREO | P136-SSCJ-00316-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 13-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00040-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 14-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN - 2019-541-065408-1 - REDENTOR |
| OFICIO | CSS-P136-00041-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 14-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PUNTOS DE CÁMARA CONECTADOS A RED DE ALUMBRADO PUBLICO |
| OFICIO | CSS-P136-00042-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 14-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INTERVENTORÍAS DURANTE EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 832 DE 2017. |
| OFICIO | CSS-P136-00043-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 14-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | TRAMITE SEGUNDO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019 Y ENTREGA SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES. |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|--|
| CORREO | P136-SSCJ-00318-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 14-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO DATACENTER |
| OFICIO | CSS-P136-00044-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 15-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DP 2019541069816-1 - TAPA CODENSA |
| CORREO | P136-SSCJ-00321-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 15-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO PEM ENLACE BACKUP C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00045-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 18-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA PARA QUINTO PAGO CONTRATISTA ETB CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 CONTRATO 914 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00046-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 18-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN - 2019-541-070682-1 |
| OFICIO | CSS-P136-00047-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 18-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 PAGO NO 07 |
| CORREO | P136-SSCJ-00340-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 18-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00048-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 19-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN PRÓRROGA DE LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 24393 - LOCALIDAD BOSA, PERTENECIENTE AL CONTRATO CCE-601-1-AG-2017, SUSCRIT |
| OFICIO | CSS-P136-00049-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 19-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN PRÓRROGA DE LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 24362 - LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR, PERTENECIENTE AL CONTRATO CCE-601-1-AG-201 |
| CORREO | P136-SSCJ-00346-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 19-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ENLACE BACKUP C4 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|---|
| CORREO | P136-SSCJ-00348-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 20-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ENLACE BACKUP C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00350-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 20-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO AL CAE REDENTOR |
| CORREO | P136-SSCJ-00351-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 20-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD COMUNICACION EQUIPOS C4 HACIA PROVEEDOR SEGURITECH. |
| CORREO | P136-SSCJ-00352-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 20-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DE LOS 31 PUNTOS DE PANEL SOLAR CORRESPONDIENTES AL PROYECTO ESU |
| CORREO | P136-SSCJ-00353-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 20-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE TRÁMITE DE PERMISOS DE INGRESO PARTE EXTERNA BANCO REPÚBLICA |
| CORREO | P136-SSCJ-00355-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 20-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | TRAMITE DE PERMISOS AL DATA CENTER DE BOMBEROS DEL C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00051-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 21-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN 2019-541-69816-1 |
| OFICIO | CSS-P136-00052-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 21-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN - 2019-541-072540-1. |
| CORREO | P136-SSCJ-00359-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 21-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | DERECHO DE PETICIÓN USME |
| OFICIO | CSS-P136-00057-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 22-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PRESENTACIÓN COTIZACIÓN ADICIÓN PERSONAL |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|---|
| CORREO | P136-SSCJ-00360-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 22-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RETIRO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA DEL C4 POR PARTE DE MEBOG. |
| CORREO | P136-SSCJ-00361-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 23-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00362-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 23-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00363-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 24-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | CAPACITACIÓN INTERNA INTERVENTORÍA |
| CORREO | P136-SSCJ-00370-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 25-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00377-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 25-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD REPORTE CAMARAS FUERA DE LINEA |
| CORREO | P136-SSCJ-00379-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 25-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00380-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 26-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO SEGURITECH PRIVADA S. A DE C.V. |
| CORREO | P136-SSCJ-00383-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 26-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ENVIÓ PAC DICIEMBRE DE 2019 |
| CORREO | P136-SSCJ-00387-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 26-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PUESTOS DE TRABAJO EN C4 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|--|
| CORREO | P136-SSCJ-00390-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 27-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN: INGRESO Y APOYO DE ISS EN PREMIER ONE |
| CORREO | P136-SSCJ-00398-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 28-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00399-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 28-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | VENTANAS DE MANTENIMIENTO - ETB |
| CORREO | P136-SSCJ-00400-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 28-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ACTUALIZACIÓN DE PERMISOS DE INGRESO C4 - MENSUAL |
| OFICIO | CSS-P136-00060-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 29-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN – 20195410734861 |
| OFICIO | CSS-P136-00061-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 29-NOV-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN – 2019541073529-1 |

Tabla 29. Comunicaciones noviembre de 2019 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019

Comunicaciones octubre 2019:

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|----------|---|--|
| CORREO | P136-SSCJ-00108-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 2-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | GESTIONES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA- LOCALIDAD DE BOSA. |
| CORREO | P136-SSCJ-00114-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 2-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | CAPACITACIÓN INTERNA INTERVENTORÍA |
| CORREO | P136-SSCJ-00118-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 3-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO AL CAE REDENTOR |
| CORREO | P136-SSCJ-00126-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 4-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00128-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 4-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ENVÍO A LA SDSCJ PLAN DE TRABAJO MANTENIMIENTO CORRECTIVO COSEC CHAPINERO, CIUDAD |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|--|
| | | | | | BOLIVAR Y PUENTE ARANDA. CONTRATO 780 DE 2019 |
| CORREO | P136-SSCJ-00129-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 4-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ESTADO DE CÁMARAS SEMANAL DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ |
| CORREO | P136-SSCJ-00133-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 8-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00137-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 9-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO AL CAE REDENTOR |
| CORREO | P136-SSCJ-00139-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 9-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN - 2019-541-062970-1 BARRIO UNIDOS |
| CORREO | P136-SSCJ-00142-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 9-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN - 2019-541-060776-1 - SUBA |
| CORREO | P136-SSCJ-00144-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 9-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE COSECS |
| OFICIO | CSS-P136-00018-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 9-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | DOCUMENTACIÓN CONTRATOS OBJETO DE INTERVENTORÍA. |
| CORREO | P136-SSCJ-00149-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 10-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00150-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 10-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00019-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 10-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN PRÓRROGA DE LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 24293 LOCALIDAD LA CANDELARIA, PERTENECIENTE AL CONTRATO CCE-601-1-AG-2017, |
| OFICIO | CSS-P136-00020-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 10-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN PRÓRROGA DE LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 24367 LOCALIDAD SANTA FÉ, PERTENECIENTE AL CONTRATO CCE-601-1-AG-2017, SUSCR |
| OFICIO | CSS-P136-00021-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 11-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | TRAMITE DE PAGO NO 01 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019 Y ENTREGA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES |
| CORREO | P136-SSCJ-00158-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 11-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO C4 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|--|
| CORREO | P136-SSCJ-00160-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 11-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | CONCEPTO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |
| CORREO | P136-SSCJ-00169-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 15-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN - 2019-541-062927-1 - PROCESO HOMICIDIO AGRAVADO |
| CORREO | P136-SSCJ-00176-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 16-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00183-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 16-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD SALA DE REUNIONES C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00023-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 17-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA PARA CUARTO PAGO CONTRATISTA ETB CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO 914 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00024-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 17-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA UT SERVICIOS MNTD VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO |
| CORREO | P136-SSCJ-00186-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 17-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| OFICIO | CSS-P136-00025-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 17-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN - 2019-541-062970-1 BARRIO UNIDOS |
| OFICIO | CSS-P136-00026-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 17-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN - 2019-541-060776-1 - SUBA |
| CORREO | P136-SSCJ-00203-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 18-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00209-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 21-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00211-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 21-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00213-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 21-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00218-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 22-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE COSECS. |
| CORREO | P136-SSCJ-00220-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 22-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, | ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|---|
| | | | | CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | OAIEE DE LA SDSCJ SOBRE PUNTOS DE VÍDEO VIGILANCIA IMPLEMENTADOS EN EL CONTR |
| CORREO | P136-SSCJ-00231-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 24-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD DE GESTIÓN DE RETIRO PARA EL SERVIDOR INDIGO VISIÓN UBICADO EN EL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR-CONTRATO 780 DE 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00027-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 25-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | HECHOS PRESENTADOS EN EL PUNTO CCEL11_156 |
| CORREO | P136-SSCJ-00240-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 25-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | HECHOS PRESENTADOS EN EL PUNTO CCEL11_156 |
| CORREO | P136-SSCJ-00241-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 25-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO AL CAE REDENTOR |
| CORREO | P136-SSCJ-00242-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 25-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ESTADO DE CÁMARAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ PROYECTO 350 |
| CORREO | P136-SSCJ-00252-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 28-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ACTUALIZACIÓN DE PERMISOS DE INGRESO C4 - MENSUAL |
| CORREO | P136-SSCJ-00256-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 29-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00268-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 30-OCT-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PROYECTO MIGRACION PLATAFORMA SECUROS |

Tabla 30. Comunicaciones octubre de 2019 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019.

Comunicaciones septiembre 2019:

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|--|
| OFICIO | CSS-P136-00001-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 6-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | LISTADO DEL PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1020 2019 |
| OFICIO | CSS-P136-00002-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 10-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN FICIO - UDAP - CTI - NO. 1167. |
| CORREO | P136 -SSCJ-00008-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 13-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SOLICITUD CONTRATOS OBJETO DE INTERVENTORÍA E INFORME FINAL INTERVENTORÍA ANTERIOR |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|--|
| OFICIO | CSS-P136-00003-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 13-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | PLAN DE INTERVENTORÍA |
| CORREO | P136-SSCJ-00014-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 16-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA A SOLICITUD DE REUBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ESU 204,205 Y 249 CÁMARAS MOVILES |
| CORREO | P136-SSCJ-00015-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 16-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA A SOLICITUD DE GESTIÓN PARA EL TRASLADO DEL PUNTO AL 1620 |
| CORREO | P136-SSCJ-00031-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 18-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | GARANTIAS DEL DERIVADO 4 (PROYECTO ESU) |
| CORREO | P136-SSCJ-00048-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 19-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DEL REPORTE NOVEDADES MEBOG |
| OFICIO | CSS-P136-00009-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 23-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN - 2019-541-0578118-1- |
| CORREO | P136-SSCJ-00066-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 25-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ENVIÓ PAC OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019 |
| CORREO | P136-SSCJ-00070-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 25-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | TRAMITAR PERMISOS DE ACCESO WI-FI EN C4 |
| CORREO | P136-SSCJ-00072-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 25-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | TRAMITE DE PERMISOS DE INGRESO AL CAE REDENTOR |
| CORREO | P136-SSCJ-00075-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 26-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | INFORMACIÓN DE AUTORIZACIÓN INICIO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEGUNDA RONDA EN CAÍS |
| OFICIO | CSS-P136-00010-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 26-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN PRÓRROGA NÚMERO 01, DE LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 28393 LOCALIDAD USAQUÉN, PERTENECIENTE AL CONTRATO CCE-601-1-AG-2 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| TIPO | CONSECUTIVO | ORIGEN | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|---|--|
| CORREO | P136-SSCJ-00085-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 27-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA A SOLICITUD DE QUEJA PMT EN EL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA SCJ17FJ0005_1, UBICADO EN LA DIRECCIÓN AUTO NORTE - CALLE 200(|
| OFICIO | CSS-P136-00011-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 27-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO ETB - RADIO ENLACE |
| CORREO | P136-SSCJ-00088-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 27-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | ACTUALIZACIÓN DE PERMISOS DE INGRESO C4 - MENSUAL |
| CORREO | P136-SSCJ-00097-2019 | CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 30-SEP-19 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN - 2019-541-059837-1 |

Tabla 31. Comunicaciones septiembre de 2019 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019

2.3 ESTADO GENERAL FINANCIERO

2.3.1 Contrato No.1020-2019 – Consorcio Smarty Scain 2019

A continuación, se presenta la información financiera del Contrato de Interventoría No. 1020 de 2019, a corte 30 de julio de 2020:

| DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) |
|---|-------------------------|-------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO | \$ 1.807.867.953 | 45% |
| VALOR ADICION NO 01 | \$ 865.599.859 | 22% |
| VALOR ADICION NO 02 | \$ 1.047.624.354 | 26% |
| VALOR ADICION NO 03 | \$ 279.366.494 | 7% |
| VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | \$ 4.000.458.660 | 100% |
| VALOR FACTURADO | \$ 3.651.250.542 | 91% |
| VALOR A FACTURAR PERIODO DE JULIO DE 2020 * | \$ 349.208.118 | 9% |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$ 0 | 0% |

Tabla 32. Información financiera del contrato de Interventoría No. 1020 de 2019.

*Teniendo en cuenta que el ccontrao finalizo el 30 de julio 2020 y se encuentra en proceso de liquidación la factura correspondiente al mes de julio 2020 sera radicada junto con la liquidación.

Información financiera de los contratos objeto de Interventoría a corte 30 de julio de 2020:

2.3.2 Contrato No.914-2019 – Empresa Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.

Durante el mes de julio 2020, se suscribió la modificación No 4 del Contrato 914 de 2019:

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| MODIFICACION No 04, CONTRATO 914 DE 2019 ETB | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| PRORROGA | 24 DIAS | FECHA FINAL | 30/07/2020 |
| ADICION | \$ 1.898.211.814 | VALOR TOTAL | \$33.046.830.041 |

Tabla 33. Adición No 4, Contrato No 914 de 2019.

| MODIFICACION No 03 CONTRATO 914 DE 2019 ETB | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|
| PRORROGA | 3 MESES | FECHA FINAL | 6/07/2020 |
| ADICION | \$ 7.716.755.283 | VALOR TOTAL | \$31.148.618.227 |

Tabla 34. Adición No 3 contrato No 914 de 2019

| DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) |
|------------------------------|--------------------------|-------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 18.475.048.538 | 56% |
| VALOR ADICIÓN 1 | \$ 4.956.814.406 | 15% |
| VALOR ADICIÓN 3 | \$ 7.716.755.283 | 23% |
| VALOR ADICIÓN 4 | \$ 1.898.211.814 | 6% |
| VALOR TOTAL | \$ 33.046.830.041 | 100% |
| VALOR FACTURADO | \$ 28.322.120.125 | 86% |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$ 4.724.709.916 | 14% |

Tabla 35. Información financiera del contrato No. 914-2019

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR FACTURADO |
|-------------------------|---|--------------------------|
| 1 | PERIODO FACTURADO DEL 19 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2019 | \$ 753.249.417 |
| 2 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2019 | \$ 1.941.354.587 |
| 3 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2019 | \$ 2.099.895.394 |
| 4 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 | \$ 2.200.877.940 |
| 5 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2019 | \$ 2.285.495.748 |
| 6 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 | \$ 2.360.850.004 |
| 7 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$ 2.419.209.343 |
| 8 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020 | \$ 2.418.279.167 |
| 9 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 | \$ 2.414.260.566 |
| 10 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020 | \$ 2.374.812.170 |
| 11 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020 | \$ 2.360.425.522 |
| 12 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020 | \$ 2.366.594.063 |
| 13 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020 | \$ 2.326.816.204 |
| VALOR FACTURADO* | | \$ 28.322.120.125 |

Tabla 36. Información de los periodos facturados contrato No. 914-2019

*Los valores relacionados en los periodos de junio, julio, agosto y los 6 primeros días de septiembre de 2019 son tomados del informe final del Consorcio Seguridad Capital y de los estados de los RP suministrados por la SDSCJ, teniendo en cuenta que el Consorcio SMARTY- SCAIN 2019, inicio sus actividades el 7 de septiembre de 2019.

2.3.3 Contrato No. 756 -2019 – CODENSA S.A. E.S.P.

En el mes de julio 2020, se suscribió la modificación No 4 del contrato 756 de 2019:

| MODIFICACION No 04. CONTRATO 756 DE 2019 CODENSA | | | |
|--|---------|-------------|-----------------|
| PRORROGA | 24 DIAS | FECHA FINAL | 30/07/2020 |
| ADICION | \$ 0 | VALOR TOTAL | \$5.603.362.790 |

Tabla 37. Adición No 4 contrato No 756 de 2019

| MODIFICACION No 03. CONTRATO 756 DE 2019 CODENSA | | | |
|--|----------------|-------------|-----------------|
| PRORROGA | 3 MESES | FECHA FINAL | 6/07/2020 |
| ADICION | \$ 582.749.450 | VALOR TOTAL | \$5.603.362.790 |

Tabla 38. Adición No 3 contrato No 756 de 2019

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) |
|---|------------------|------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO | \$ 5.020.613.340 | 90% |
| VALOR ADICION 1 | \$ 582.749.450 | 10% |
| VAOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 5.603.362.790 | 100% |
| VALOR FACTURADO | \$ 5.087.892.881 | 91% |
| VALOR LIBERADO A LOS FONDOS DE LA SDSCJ | \$ 328.786.492 | 6% |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$ 186.683.417 | 3% |

Tabla 39. Información financiera del contrato No. 756-2019

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR FACTURADO |
|------------------|--|------------------|
| 1 | PERIODO FACTURADO DEL 19 DE MARZO DE 2019 AL 24 DE ABRIL 2019 | \$ 515.786.529 |
| 2 | PERIODO FACTURADO DEL 25 DE ABRIL 27 DE MAYO DE 2019 | \$ 721.562.089 |
| 3 | PERIODO FACTURADO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2019 | \$ 686.225.866 |
| 4 | PERIODO FACTURADO DEL 28 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2019 | \$ 938.589.816 |
| 5 | PERIODO FACTURADO DEL 25 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2019 | \$ 1.186.455.323 |
| 6 | PERIODO FACTURADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 23 DE OCTUBRE DE 2019 | \$ 205.533.558 |
| 7 | PERIODO FACTURADO DEL 23 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 | \$ 175.034.255 |
| 8 | PERIODO FACTURADO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$ 85.449.169 |
| 9 | PERIODO FCATURADO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020 | \$ 55.680.195 |
| 10 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020 | \$ 55.227.930 |
| 11 | PERIODO FACTURDO DEL 1 AL 29 DE ABRIL DE 2020 | \$ 61.201.677 |
| 12 | PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020 | \$ 204.122.105 |
| 13 | PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020 | \$ 197.024.369 |
| VALOR FACTURADO* | | \$ 5.087.892.881 |

Tabla 40. Información de los periodos facturados contrato No 756-2019

*Los valores relacionados en los periodos de marzo - abril, abril- mayo, mayo - junio, junio – julio y julio- agosto son tomados del informe final del Consorcio Seguridad Capital y de los estados de los RP suministrados por la SDSCJ, teniendo en cuenta que el consorcio SMARTY- SCAIN 2019, inicio sus actividades el 7 de septiembre de 2019.

2.3.4 Contrato No. 780-2019 – UT Servicios Mnto Vigilancia Ciudadana 2019

En el mes de julio 2020, se suscribió la modificación No 3 del contrato 780 de 2019:

| MODIFICACION No 03. CONTRATO 780 DE 2019 MANTENIMIENTO | | | |
|--|---------|-------------|------------------|
| PRORROGA | 24 DIAS | FECHA FINAL | 30/07/2020 |
| ADICION | \$ 0 | VALOR TOTAL | \$13.981.419.108 |

Tabla 41. Adición No 3 contrato No 780 de 2019.

| MODIFICACION No 02 CONTRATO 780 DE 2019 MANTENIMIENTO | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|
| PRORROGA | 3 MESES | FECHA FINAL | 6/07/2020 |
| ADICION | \$ 3.981.419.108 | VALOR TOTAL | \$13.981.419.108 |

Tabla 42. Adición No 2 contrato No 780 de 2019.

| DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) |
|---|------------------|------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO | \$10.000.000.000 | 72% |
| VALOR ADICION 1 | \$ 3.981.419.108 | 28% |
| VALOR TOTAL CONTRATO | \$13.981.419.108 | 100% |
| VALOR FACTURADO | \$12.957.551.633 | 93% |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$1.023.867.475 | 7% |

Tabla 43. Información financiera del contrato No. 780-2019.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR FACTURADO |
|-------------------------|---|--------------------------|
| 1 | PERIODO FACTURADO DEL 02 DE ABRIL Y EL AL 30 DE ABRIL 2019 | \$ 2.860.200 |
| 2 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2019 | \$ 122.495.485 |
| 3 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2019 | \$ 341.840.219 |
| 4 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2019 | \$ 519.301.515 |
| 5 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2019 | \$ 610.126.487 |
| 6 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 | \$ 233.247.342 |
| 7 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 (SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PAGADOS EN NOVIEMBRE) | \$ 66.216.300 |
| 8 | PERIODO FACTURADO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2019 | \$ 1.027.038.785 |
| 9 | PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 | \$ 797.283.324 |
| 10 | PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$ 2.032.695.719 |
| 11 | PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020 | \$ 1.481.011.977 |
| 12 | PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 | \$ 1.572.633.810 |
| 13 | PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2020 | \$ 647.067.542 |
| 14 | PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020 | \$ 484.111.285 |
| 15 | PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2020 | \$ 1.510.236.964 |
| 16 | PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 | \$ 1.509.384.679 |
| VALOR FACTURADO* | | \$ 12.957.551.633 |

Tabla 44. Información de los periodos facturados contrato No 780-2019

*Los valores relacionados en los periodos de abril, mayo, junio, julio, agosto y los 6 primeros días de septiembre de 2019, son tomados del informe final del Consorcio Seguridad Capital y de los estados de los RP suministrados por la SDSCJ, teniendo en cuenta que el consorcio SMARTY- SCAIN 2019, inicio sus actividades el 7 de septiembre de 2019.

2.3.4 Instrumento de agregación de demanda 601-1-AG Securitech

| DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) |
|---------------------------------|------------------|--------|
| VALOR DEL CONTRATO IVA INCLUIDO | \$31.610.733.450 | 100% |
| VALOR FACTURADO | \$31.483.592.722 | 99.60% |
| VALOR LIBERADO POR CADA FONDO* | \$127.140.728 | 0,40% |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$0 | 0% |

Tabla 45. Información financiera 601-1-AG Securitech

*Este valor corresponde al saldo reintegrado a cada uno de los fondos de desarrollo local FDL (Fondos de Desarrollo Locales). A corte del presente informe se culminó con la facturación de las localidades relacionadas en la Tabla 45.

| FDL | ORDEN DE COMPRA | VALOR O.C | PRIMER PAGO DEL 25% | SEGUNDO PAGO DEL 15% | TERCER PAGO DEL 30% | CUARTO PAGO DEL 30% | SALDO A LIBERAR | EJECUTADO A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | LIBERADO A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|---|
| FDL CHAPINERO | 24283 | \$698.283.000 | \$174.570.750 | \$ 104.742.450 | \$ 204.960.222 | \$ 204.960.222 | \$9.049.356 | \$ 689.233.644 | \$ 9.049.356 |
| FDL SAN CRISTÓBAL | 24358 | \$2.496.695.880 | \$624.173.970 | \$ 374.504.382 | \$ 749.008.764 | \$ 747.432.965 | \$1.575.799 | \$ 2.495.120.081 | \$ 1.575.799 |
| FDL USME | 24281 | \$2.154.203.923 | \$ 538.550.980 | \$ 323.130.588 | \$ 646.261.177 | \$ 628.848.074 | \$17.413.104 | \$ 2.136.790.819 | \$ 17.413.104 |
| FDL TUNJUELITO | 24380 | \$1.080.470.000 | \$ 270.117.500 | \$ 162.070.500 | \$ 324.141.000 | \$ 318.044.600 | \$6.096.400 | \$ 1.074.373.600 | \$ 6.096.400 |
| FDL SUBA | 24383 | \$4.433.115.991 | \$1.108.278.998 | \$ 664.967.399 | \$ 1.329.934.797 | \$ 1.326.268.586 | \$3.666.211 | \$ 4.429.449.780 | \$ 3.666.211 |
| FDL PUENTE ARANDA | 24307 | \$1.034.676.000 | \$ 258.669.000 | \$ 155.201.400 | \$ 310.402.800 | \$ 305.387.890 | \$5.014.910 | \$ 1.029.661.090 | \$ 5.014.910 |
| FDL CIUDAD BOLÍVAR | 24362 | \$3.600.000.000 | \$ 900.000.000 | \$ 540.000.000 | \$ 1.080.000.000 | \$1.063.057.040,36 | \$16.942.960 | \$ 3.583.057.040 | \$ 16.942.960 |
| FDL BOSA | 24393 | \$5.090.903.404 | \$1.272.725.851 | \$ 763.635.511 | \$ 1.527.271.020 | \$1.526.239.845,48 | \$1.031.188 | \$ 5.089.872.227 | \$1.031.177 |
| FDL KENNEDY | 24287 | \$3.622.654.322 | \$ 905.663.580 | \$ 543.398.148 | \$ 1.086.796.297 | \$1.074.445.823 | \$12.350.474 | \$ 3.610.303.848 | \$12.350.474 |
| FDL FONTIBÓN | 24303 | \$1.300.000.000 | \$ 325.000.000 | \$ 195.000.000 | \$ 390.000.000 | \$377.510.753 | \$12.489.247 | \$ 1.287.510.753 | \$ 12.489.247 |
| FDL ENGATIVÁ | 24413 | \$3.131.774.035 | \$782.943.509 | \$ 469.766.105 | \$ 939.532.211 | \$ 927.081.038 | \$12.451.172 | \$ 3.119.322.863 | \$ 12.451.172 |
| FDL LOS MÁRTIRES | 24295 | \$1.080.034.561 | \$ 270.008.640 | \$ 162.005.184 | \$ 324.010.368 | \$ 306.186.396 | \$17.823.973 | \$ 1.062.210.588 | \$ 17.823.973 |
| FDL RAFAEL URIBE URIBE | 24292 | \$1.887.922.334 | \$ 471.980.584 | \$ 283.188.350 | \$ 566.376.700 | \$ 555.140.755 | \$11.235.945 | \$ 1.876.686.389 | \$ 11.235.945 |
| TOTALES * | | | | | | | | \$ 31.483.592.723 | \$127.140.727 |

Tabla 46. Información de lo facturado 601-1-AG Securitech

*Los valores facturados que se relacionan son tomados del informe final del Consorcio Seguridad Capital y de las facturas radicadas en cada fondo las cuales fueron suministradas por el contratista, teniendo en cuenta que el Consorcio SMARTY- SCAIN 2019 inicio sus actividades el 7 de septiembre de 2019.

2.3.5 Instrumento de agregación de demanda 601-1-AG UTBASC

| DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) |
|---------------------------------|-----------------|------|
| VALOR DEL CONTRATO IVA INCLUIDO | \$4.096.185.035 | 100% |
| VALOR FACTURADO | \$4.011.099.063 | 98% |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$0 | 0% |
| VALOR LIBERADO POR CADA FONDO* | \$85.085.972.77 | 2% |

Tabla 47. Información financiera 601-1-AG UTBASC

*Este valor corresponde al saldo reintegrado a cada uno de los fondos de desarrollo local FDL (Fondos de Desarrollo Locales).

| FDL | ORDEN DE COMPRA | VALOR O.C | PRIMER PAGO DEL 25% | SEGUNDO PAGO DEL 15% | TERCER PAGO DEL 30% | CUARTO PAGO DEL 30% | SALDO A LIBERAR | EJECUTADO A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | LIBERADO A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--|--|
| FDL SANTA FE | 24367 | \$867.224.000 | \$216.806.000 | \$130.083.600 | \$248.421.762 | \$255.133.441 | \$ 16.779.197 | \$850.444.803 | \$16.779.197 |
| FDL BARRIOS UNIDOS | 24388 | \$439.336.000 | \$109.834.000 | \$65.900.400 | \$129.312.340 | \$129.312.340 | \$ 4.976.920 | \$434.359.080 | \$4.976.920 |
| FDL TEUSAQUILLO | 24288 | \$622.599.000 | \$155.649.750 | \$93.389.850 | \$180.768.078 | \$180.768.078 | \$ 12.023.244 | \$610.575.756 | \$12.023.244 |
| FDL ANTONIO NARIÑO | 24304 | \$710.158.350 | \$177.539.587,5 | \$106.523.752,5 | \$205.102.301 | \$205.102.302 | \$ 15.890.406 | \$694.267.943 | \$15.890.407 |
| FDL CANDELARIA | 24293 | \$474.633.000 | \$ 118.658.250 | \$71.194.950 | \$129.462.550 | \$136.849.607 | \$ 18.467.643 | \$456.165.357 | \$18.467.643 |
| FDL USAQUÉN | 28393 | \$982.234.685 | \$245.558.672 | \$147.335.203 | \$286.196.125 | \$286.196.124 | \$16.948.561 | \$965.256.124 | \$16.948.560.77 |
| TOTALES* | | | | | | | | \$4.011.099.063 | \$ 85.085.972 |

Tabla 48. Información de lo facturado 601-1-AG UTBASC

*Los valores facturados relacionados son tomados del informe final del Consorcio Seguridad Capital y de las facturas radicadas en cada fondo, las cuales fueron suministradas por el contratista, teniendo en cuenta que el Consorcio SMARTY- SCAIN 2019 inicio sus actividades el 7 de septiembre de 2019. Se culminó con la facturación de las 6 localidades relacionadas en la Tabla 48 por parte del proveedor UTBASC.

2.4 FACTURACIÓN

Para el período comprendido entre el 1 al 30 de julio de 2020, fecha de corte del presente informe, se estimó el valor a facturar de acuerdo con la oferta económica presentada y aprobada por la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. A continuación, se presenta el valor informado el 16 de julio de 2020 mediante correo electrónico a la Supervisión del contrato con consecutivo P136-SSCJ-1177-2020 (ANEXO 6), se remitió correo con el PAC del agosto y septiembre de 2020, teniendo en cuenta que el contrato finalizó el 30 de julio 2020 y se procede a liquidación del mismo, con el fin de que se realizara la reserva en el PAC así mismo se informó para los contratos objeto de interventoría:

La correspondiente factura por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$349.208.118) será radicada con la liquidación del contrato.

Del 1 al 30 de julio de 2020 (30 días): a continuación, se relacionan los valores para facturar (Anexo 6):

| ITEM | CONTROL FACTURACIÓN | JULIO DE 2020 |
|--------------|--|----------------------|
| 1 | ENERGIZACIÓN | \$85.805.307 |
| 2 | CONECTIVIDAD | \$87.459.407 |
| 3 | MANTENIMIENTO | \$175.943.404 |
| 4 | AMPLIACIÓN FASE 3 GRUPO ADMINISTRATIVO | \$0 |
| 5 | AMPLIACIÓN FASE 3 BOSA | \$0 |
| 6 | AMPLIACIÓN FASE 3 CIUDAD BOLÍVAR | \$0 |
| 7 | AMPLIACIÓN FASE 3 KENNEDY | \$0 |
| 8 | AMPLIACIÓN FASE 3 SUBA | \$0 |
| 9 | ESTACIONES DE POLICIA | \$0 |
| TOTAL | | \$349.208.118 |

Tabla 49. Relación facturación periodo julio 2020, Contrato 1020 de 2019.

Durante el periodo del presente informe la interventoría gestiona el trámite técnico y administrativo para la facturación de los siguientes contratos:

2.4.1 Contrato No. 914-2019 – ETB

Facturación realizada en julio 2020

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|--|---|------------------|
| ETB | 914 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020 | 281623950 281623957 281623956 281623960 281623958 281623959 281623955 281623953 281623951 281623949 281623952 | \$ 2.326.816.204 |

Tabla 50. Relación facturación actividades de junio 2020, Contrato 914 de 2019.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL CON IVA |
|---|-----------|----------------|------------------|
| INGENIERO RESIDENTE | 1 | N/A | \$ 11.677.480 |
| ALCALDIAS | 1667 | 8 Mbps | \$ 890.670.454 |
| | 9 Rurales | 8 Mbps | |
| BOGOTA MAS SEGURA | 1634 | 8 Mbps | \$ 751.386.243 |
| | 4 Rurales | 8 Mbps | |
| C4 | 1 | 30 G | \$ 70.388.500 |
| | 1 | 20 G | |
| COLEGIOS | 95 | 8 Mbps | \$ 51.884.298 |
| | 1 | 10 Mbps | |
| COSEC N°1 CENTRO DE MONITOREO DE CHAPINERO | 1 | 2 G | \$ 35.290.640 |
| COSEC N° 2 - CIUDAD BOLÍVAR | 1 | 2 G | |
| COSEC N° 3 - KENNEDY | 1 | 2 G | |
| COSEC N° 4 CENTRO DE MONITOREO PUENTE ARANDA512 | 1 | 2 G | |
| COSEC ENGATIVA PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC ENGATIVA BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| ESU | 316 | 8 Mbps | \$ 136.759.954 |
| ESU ROUTER | 9 | 100 G | \$ 5.919.760 |
| INDIGO | 203 | 8 Mbps | \$ 88.274.101 |
| SITECSYS | 431 | 8 Mbps | \$ 190.568.042 |
| | 1 | 64 Mbps | |
| TRANSMILENIO | 1 | 10 Mbps | \$ 16.071.188 |
| | 1 | 34 Mbps | |
| | 3 | 60 Mbps | |
| | 1 | 50 Mbps | |
| | 1 | 64 Mbps | |
| UT ANTERIOR | 166 | 8 Mbps | \$ 77.925.544 |
| | 1 | 56 Mbps | |
| | 1 | 64 Mbps | |
| TOTAL | | | \$ 2.326.816.204 |

Tabla 51. Relación discriminada actividades junio de 2020, Contrato 914 de 2019

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Facturación realizada en junio de 2020:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|---|---|------------------|
| ETB | 914 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020 | 279956347 279956354 279956353 279956357 279956355 279956356 279956352 279956351 279956349 279956346 279956350 | \$ 2.366.594.063 |

Tabla 52. Relación facturación actividades de mayo 2020, Contrato 914 de 2019.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL, CON IVA | |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|
| INGENIERO RESIDENTE | 1 | N/A | \$ 11.677.480 | |
| ALCALDIAS | 1667 | 8 Mbps | \$ 910.104.091 | |
| | 9 Rurales | 8 Mbps | | |
| BOGOTA MAS SEGURA | 1634 | 8 Mbps | \$ 772.143.206 | |
| | 4 Rurales | 8 Mbps | | |
| C4 | 1 | 30 G | \$ 61.666.952 | |
| | 1 | 20 G | | |
| COLEGIOS | 95 | 8 Mbps | \$ 51.884.298 | |
| | 1 | 10 Mbps | | |
| COSEC N°1 CENTRO DE MONITOREO DE CHAPINERO | 1 | 2 G | \$ 35.290.640 | |
| COSEC N° 2 - CIUDAD BOLÍVAR | 1 | 2 G | | |
| COSEC N° 3 - KENNEDY | 1 | 2 G | | |
| COSEC N° 4 CENTRO DE MONITOREO PUENTE ARANDA512 | 1 | 2 G | | |
| COSEC ENGATIVA PPAL | 1 | 512 Mbps | | |
| COSEC ENGATIVA BACKUP | 1 | 512 Mbps | | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS PPAL | 1 | 512 Mbps | | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS BACKUP | 1 | 512 Mbps | | |
| COSEC TEUSAQUILLO PPAL | 1 | 512 Mbps | | |
| COSEC TEUSAQUILLO BACKUP | 1 | 512 Mbps | | |
| ESU | 316 | 8 Mbps | | \$ 138.671.708 |
| ESU ROUTER | 9 | 100 G | | \$ 5.919.760 |
| INDIGO | 203 | 8 Mbps | \$ 89.560.924 | |
| SITECSYS | 431 | 8 Mbps | \$ 193.890.233 | |
| | 1 | 64 Mbps | | |
| TRANSMILENIO | 1 | 10 Mbps | \$ 16.071.188 | |
| | 1 | 34 Mbps | | |
| | 3 | 60 Mbps | | |
| | 1 | 50 Mbps | | |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL, CON IVA |
|--------------|----------|----------------|-------------------------|
| | 1 | 64 Mbps | |
| UT ANTERIOR | 166 | 8 Mbps | \$ 79.713.583 |
| | 1 | 56 Mbps | |
| | 1 | 64 Mbps | |
| TOTAL | | | \$ 2.366.594.063 |

Tabla 53. Relación discriminada actividades mayo de 2020, Contrato 914 de 2019.

Facturación realizada en mayo de 2020:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|--|---|------------------|
| ETB | 914 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020 | 279391219 279391225 279391224 279391228 279391226 279391227 279391223 279391222 279391220 279391218 279391221 | \$ 2.360.425.522 |

Tabla 54. Relación facturación actividades de abril 2020, Contrato 914 de 2019.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL CON IVA |
|---|-----------|----------------|----------------|
| INGENIERO RESIDENTE | 1 | N/A | \$ 11.677.480 |
| ALCALDIAS | 1667 | 8 Mbps | \$ 920.271.783 |
| | 9 Rurales | 8 Mbps | |
| BOGOTA MAS SEGURA | 1634 | 8 Mbps | \$ 767.409.191 |
| | 4 Rurales | 8 Mbps | |
| C4 | 1 | 30 G | \$ 53.490.500 |
| COLEGIOS | 95 | 8 Mbps | \$ 51.884.298 |
| | 1 | 10 Mbps | |
| COSEC N°1 CENTRO DE MONITOREO DE CHAPINERO | 1 | 2 G | \$ 35.290.640 |
| COSEC N° 2 - CIUDAD BOLÍVAR | 1 | 2 G | |
| COSEC N° 3 - KENNEDY | 1 | 2 G | |
| COSEC N° 4 CENTRO DE MONITOREO PUENTE ARANDA512 | 1 | 2 G | |
| COSEC ENGATIVA PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC ENGATIVA BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO PPAL | 1 | 512 Mbps | |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL CON IVA |
|--------------------------|----------|----------------|------------------|
| COSEC TEUSAQUILLO BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| ESU | 316 | 8 Mbps | \$ 137.407.684 |
| ESU ROUTER | 9 | 100 G | \$ 5.919.760 |
| INDIGO | 203 | 8 Mbps | \$ 89.484.298 |
| SITECSYS | 431 | 8 Mbps | \$ 192.509.711 |
| | 1 | 64 Mbps | |
| TRANSMILENIO | 1 | 10 Mbps | \$ 16.071.188 |
| | 1 | 34 Mbps | |
| | 3 | 60 Mbps | |
| | 1 | 50 Mbps | |
| | 1 | 64 Mbps | |
| UT ANTERIOR | 166 | 8 Mbps | \$ 79.008.989 |
| | 1 | 56 Mbps | |
| | 1 | 64 Mbps | |
| TOTAL | | | \$ 2.360.425.522 |

Tabla 55. Relación discriminada actividades abril de 2020, Contrato 914 de 2019.

Facturación realizada en abril 2020.

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|--|---|------------------|
| ETB | 914 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020 | 278486161 278486166 278486171 278486169 278486167 278486168 278486165 278486164 278486162 278486160 278486163 | \$ 2.374.812.170 |

Tabla 56. Relación facturación actividades de marzo 2020, Contrato 914 de 2019.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL CON IVA |
|--|-----------|----------------|----------------|
| INGENIERO RESIDENTE | 1 | N/A | \$ 11.677.480 |
| ALCALDIAS | 1665 | 8 Mbps | \$ 929.236.598 |
| | 9 Rurales | 8 Mbps | |
| BOGOTA MAS SEGURA | 1634 | 8 Mbps | \$ 773.441.052 |
| | 4 Rurales | 8 Mbps | |
| C4 | 1 | 30 G | \$ 53.490.500 |
| COLEGIOS | 95 | 8 Mbps | \$ 51.884.298 |
| | 1 | 10 Mbps | |
| COSEC N°1 CENTRO DE MONITOREO DE CHAPINERO | 1 | 2 G | \$ 35.290.640 |
| COSEC N° 2 - CIUDAD BOLÍVAR | 1 | 2 G | |
| COSEC N° 3 - KENNEDY | 1 | 2 G | |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
Contrato 1020 de 2019
Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
01/07/2020– 30/07/2020
Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL CON IVA |
|---|----------|----------------|-------------------------|
| COSEC N° 4 CENTRO DE MONITOREO PUENTE ARANDA512 | 1 | 2 G | |
| COSEC ENGATIVA PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC ENGATIVA BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| ESU | 316 | 8 Mbps | \$ 135.781.156 |
| ESU ROUTER | 9 | 100 G | \$ 5.919.760 |
| INDIGO | 203 | 8 Mbps | \$ 89.649.830 |
| SITECSYS | 431 | 8 Mbps | \$ 193.955.997 |
| | 1 | 64 Mbps | |
| TRANSMILENIO | 1 | 10 Mbps | \$ 16.071.188 |
| | 1 | 34 Mbps | |
| | 3 | 60 Mbps | |
| | 1 | 50 Mbps | |
| | 1 | 64 Mbps | |
| UT ANTERIOR | 166 | 8 Mbps | \$ 78.413.671 |
| | 1 | 56 Mbps | |
| | 1 | 64 Mbps | |
| VALOR TOTAL | | | \$ 2.374.812.170 |

Tabla 57. Relación discriminada actividades marzo de 2020, Contrato 914 de 2019.

Facturación realizada en marzo 2020.

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|--|---|------------------|
| ETB | 914 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020 | 276860734 276860741 276860740 276860744 276860742 276860743 276860739 276860738 276860736 276860733 276860737 | \$ 2.414.260.566 |

Tabla 58. Relación facturación actividades de febrero 2020, Contrato 914 de 2019.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL CON IVA |
|--|----------|----------------|----------------|
| INGENIERO RESIDENTE | 1 | N/A | \$ 11.677.480 |
| ALCALDIAS | 1674 | 8 Mbps | \$ 931.314.911 |
| BOGOTA MAS SEGURA | 1638 | 8 Mbps | \$ 802.823.795 |
| C4 | 1 | 30 G | \$ 53.490.500 |
| COLEGIOS | 95 | 8 Mbps | \$ 51.884.298 |
| | 1 | 10 Mbps | |
| COSEC N°1 CENTRO DE MONITOREO DE CHAPINERO | 1 | 2 G | \$ 35.290.640 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
Contrato 1020 de 2019
Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
01/07/2020– 30/07/2020
Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL CON IVA |
|--|----------|----------------|-------------------------|
| COSEC N° 2 - CIUDAD BOLÍVAR | 1 | 2 G | |
| COSEC N° 3 - KENNEDY | 1 | 2 G | |
| COSEC N° 4 CENTRO DE MONITOREO PUENTE ARANDA512 | 1 | 2 G | |
| COSEC ENGATIVA PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC ENGATIVA BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| ESU | 316 | 8 Mbps | \$ 136.710.472 |
| ESU ROUTER | 9 | 100 G | \$ 5.919.760 |
| INDIGO | 203 | 8 Mbps | \$ 96.170.923 |
| SITECSYS | 431 | 8 Mbps | \$ 193.405.951 |
| | 1 | 64 Mbps | |
| TRANSMILENIO | 1 | 10 Mbps | \$ 16.071.188 |
| | 1 | 34 Mbps | |
| | 3 | 60 Mbps | |
| | 1 | 50 Mbps | |
| | 1 | 64 Mbps | |
| UT ANTERIOR | 166 | 8 Mbps | \$ 79.500.648 |
| | 1 | 56 Mbps | |
| | 1 | 64 Mbps | |
| TOTAL A FACTURAR | | | \$ 2.414.260.566 |

Tabla 59. Relación discriminada actividades febrero de 2020, Contrato 914 de 2019.

Facturación realizada en febrero de 2020.

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|---|---|------------------|
| ETB | 914 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020 | 276371646 276371652 276371651 276371655 276371653 276371654 276371650 276371649 276371647 276371645 276371648 | \$ 2.418.279.167 |

Tabla 60. Relación facturación actividades de enero 2020, Contrato 914 de 2019.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL, CON IVA |
|---|----------|----------------|----------------|
| INGENIERO RESIDENTE | 1 | N/A | \$ 11.677.480 |
| ALCALDIAS | 1674 | 8 Mbps | \$ 930.926.089 |
| BOGOTA MAS SEGURA C4 | 1635 | 8 Mbps | \$ 805.704.727 |
| COLEGIOS | 95 | 8 Mbps | \$ 51.884.298 |
| | 1 | 10 Mbps | |
| COSEC N°1 CENTRO DE MONITOREO DE CHAPINERO | 1 | 2 G | \$ 35.290.640 |
| COSEC N° 2 - CIUDAD BOLÍVAR | 1 | 2 G | |
| COSEC N° 3 - KENNEDY | 1 | 2 G | |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL, CON IVA |
|---|----------|----------------|-------------------------|
| COSEC N° 4 CENTRO DE MONITOREO PUENTE ARANDA512 | 1 | 2 G | |
| COSEC ENGATIVA PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC ENGATIVA BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| ESU | 311 | 8 Mbps | \$ 136.663.127 |
| ESU ROUTER | 9 | 100 G | \$ 5.919.760 |
| INDIGO | 203 | 8 Mbps | \$ 96.501.856 |
| SITECSYS | 431 | 8 Mbps | \$ 194.404.827 |
| | 1 | 64 Mbps | |
| TRANSMILENIO | 1 | 10 Mbps | \$ 16.071.188 |
| | 1 | 34 Mbps | |
| | 3 | 60 Mbps | |
| | 1 | 50 Mbps | |
| | 1 | 64 Mbps | |
| UT ANTERIOR | 166 | 8 Mbps | \$ 79.744.675 |
| | 1 | 56 Mbps | |
| | 1 | 64 Mbps | |
| TOTAL | | | \$ 2.418.279.167 |

Tabla 61. Relación discriminada de actividades de enero de 2020, Contrato 914 de 2019.

Facturación realizada en enero de 2020.

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|--|---|------------------|
| ETB | 914 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 | 275374773 275374779 275374778 275374782 275374780 275374781 275374777 275374776 275374774 275374772 275374775 | \$ 2.419.209.343 |

Tabla 62. Relación facturación actividades diciembre de 2019, Contrato 914 de 2019.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL, CON IVA |
|--|----------|----------------|----------------|
| INGENIERO RESIDENTE | 1 | N/A | \$ 11.677.480 |
| ALCALDIAS | 1669 | 8 Mbps | \$ 937.012.090 |
| BOGOTA MAS SEGURA | 1635 | 8 Mbps | \$ 810.589.672 |
| C4 | 1 | 30 G | \$ 53.490.500 |
| COLEGIOS | 95 | 8 Mbps | \$ 51.884.298 |
| | 1 | 10 Mbps | |
| COSEC N°1 CENTRO DE MONITOREO DE CHAPINERO | 1 | 2 G | \$ 35.290.640 |
| COSEC N° 2 - CIUDAD BOLIVAR | 1 | 2 G | |
| COSEC N° 3 - KENNEDY | 1 | 2 G | |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL, CON IVA |
|---|----------|----------------|-------------------------|
| COSEC N° 4 CENTRO DE MONITOREO PUENTE ARANDA512 | 1 | 2 G | |
| COSEC ENGATIVA PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC ENGATIVA BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| ESU | 311 | 8 Mpbs | \$ 135.892.331 |
| ESU ROUTER | 9 | 100 G | \$ 5.919.760 |
| INDIGO | 203 | 8 Mbps | \$ 89.513.423 |
| SITECSYS | 431 | 8 Mbps | \$ 192.931.602 |
| | 1 | 64 Mbps | |
| TRANSMILENIO | 1 | 10 Mpbs | \$ 16.071.188 |
| | 1 | 34 Mbps | |
| | 3 | 60 Mbps | |
| | 1 | 50 Mbps | |
| | 1 | 64 Mbps | |
| UT ANTERIOR | 166 | 8 Mbps | \$ 78.936.359 |
| | 1 | 56 Mpbs | |
| | 1 | 64 Mpbs | |
| TOTAL | | | \$ 2.419.209.343 |

Tabla 63. Relación discriminada actividades diciembre 2019, Contrato 914 de 2019.

Facturación realizada en diciembre de 2019.

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|--|---|------------------|
| ETB | 914 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 273879398 273879404 273879403 273879407 273879405 273879406 273879402 273879401 273879399 273879397 273879400 | \$ 2.360.850.004 |

Tabla 64. Relación facturación actividades noviembre 2019, Contrato 914 de 2019.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL, CON IVA |
|--|----------|----------------|----------------|
| INGENIERO RESIDENTE | 1 | N/A | \$ 11.677.480 |
| ALCALDIAS | 1669 | 8 Mbps | \$ 912.000.851 |
| BOGOTA MAS SEGURA | 1635 | 8 Mbps | \$ 794.244.977 |
| C4 | 1 | 30 G | \$ 48.141.450 |
| COLEGIOS | 95 | 8 Mpbs | \$ 51.830.373 |
| | 1 | 10 Mpbs | |
| COSEC N°1 CENTRO DE MONITOREO DE CHAPINERO | 1 | 2 G | \$ 35.290.640 |
| COSEC N° 2 - CIUDAD BOLÍVAR | 1 | 2 G | |
| COSEC N° 3 - KENNEDY | 1 | 2 G | |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL, CON IVA |
|---|----------|----------------|-------------------------|
| COSEC N° 4 CENTRO DE MONITOREO PUENTE ARANDA512 | 1 | 2 G | |
| COSEC ENGATIVA PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC ENGATIVA BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| ESU | 311 | 8 Mpbs | \$ 133.988.878 |
| ESU ROUTER | 9 | 100 G | \$ 5.590.884 |
| INDIGO | 203 | 8 Mbps | \$ 87.026.428 |
| SITECSYS | 431 | 8 Mbps | \$ 188.957.713 |
| | 1 | 64 Mbps | |
| TRANSMILENIO | 1 | 10 Mpbs | \$ 16.071.188 |
| | 1 | 34 Mbps | |
| | 3 | 60 Mbps | |
| | 1 | 50 Mbps | |
| | 1 | 64 Mbps | |
| UT ANTERIOR | 166 | 8 Mbps | \$ 76.029.142 |
| | 1 | 56 Mpbs | |
| | 1 | 64 Mpbs | |
| TOTAL | | | \$ 2.360.850.004 |

Tabla 65. Relación discriminada actividades noviembre 2019, Contrato 914 de 2019.

Facturación realizada en noviembre de 2019.

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|--|---|------------------|
| ETB | 914 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 273427082 273427088 273427087 273427091 273427089 273427090 273427086 273427084 273427080 273427081 273427083 | \$ 2.285.495.748 |

Tabla 66. Relación facturación actividades octubre 2019, Contrato 914 de 2019.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL, CON IVA |
|--|----------|----------------|----------------|
| INGENIERO RESIDENTE | 1 | N/A | \$ 11.677.480 |
| ALCALDIAS | 1612 | 8 Mbps | \$ 827.833.423 |
| BOGOTA MAS SEGURA | 1631 | 8 Mbps | \$ 816.337.356 |
| C4 | 1 | 30 G | \$ 37.443.350 |
| COLEGIOS | 95 | 8 Mpbs | \$ 51.614.673 |
| | 1 | 10 Mpbs | |
| COSEC N°1 CENTRO DE MONITOREO DE CHAPINERO | 1 | 2 G | \$ 35.290.640 |
| COSEC N° 2 - CIUDAD BOLÍVAR | 1 | 2 G | |
| COSEC N° 3 - KENNEDY | 1 | 2 G | |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL, CON IVA |
|---|----------|----------------|-------------------------|
| COSEC N° 4 CENTRO DE MONITOREO PUENTE ARANDA512 | 1 | 2 G | |
| COSEC ENGATIVA PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC ENGATIVA BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| ESU | 311 | 8 Mpbs | \$ 132.815.291 |
| ESU ROUTER | 9 | 100 G | \$ 5.919.760 |
| INDIGO | 203 | 8 Mbps | \$ 86.027.593 |
| SITECSYS | 431 | 8 Mbps | \$ 188.586.886 |
| | 1 | 64 Mbps | |
| TRANSMILENIO | 1 | 10 Mpbs | \$ 16.071.188 |
| | 1 | 34 Mbps | |
| | 3 | 60 Mbps | |
| | 1 | 50 Mbps | |
| | 1 | 64 Mbps | |
| UT ANTERIOR | 166 | 8 Mbps | \$ 75.878.108 |
| | 1 | 56 Mpbs | |
| | 1 | 64 Mpbs | |
| TOTAL | | | \$ 2.285.495.748 |

Tabla 67. Relación discriminada actividades octubre 2019, Contrato 914 de 2019.

Facturación realizada en octubre de 2019.

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|---|--|------------------|
| ETB | 914 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL CONSORCIO SMARTY -SCAIN 2019 REALIZO ACLARACION MEDIANTE ACTA No 008 | 271832808 - 271832814 - 271832813- 211832818- 271832815 - 211832817- 271832812- 271832811- 271832809- 271832807- 271832810 | \$ 2.200.877.940 |

Tabla 68. Relación facturación actividades septiembre 2019, Contrato 914 de 2019.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL, CON IVA |
|---|----------|----------------|----------------|
| INGENIERO RESIDENTE | 1 | N/A | \$ 11.677.480 |
| ALCALDIAS | 1432 | 8 Mbps | \$ 703.054.219 |
| BOGOTA MAS SEGURA | 1631 | 8 Mbps | \$ 838.900.592 |
| C4 | 1 | 30 G | \$ 53.490.500 |
| COLEGIOS | 95 | 8 Mpbs | \$ 51.884.298 |
| | 1 | 10 Mpbs | |
| COSEC N°1 CENTRO DE MONITOREO DE CHAPINERO | 1 | 2 G | \$ 35.290.640 |
| COSEC N° 2 - CIUDAD BOLÍVAR | 1 | 2 G | |
| COSEC N° 3 - KENNEDY | 1 | 2 G | |
| COSEC N° 4 CENTRO DE MONITOREO PUENTE ARANDA512 | 1 | 2 G | |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
Contrato 1020 de 2019
Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
01/07/2020– 30/07/2020
Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| PROYECTO | CANTIDAD | ANCHO DE BANDA | TOTAL, CON IVA |
|-----------------------------|----------|----------------|-------------------------|
| COSEC ENGATIVA PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC ENGATIVA BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC BARRIOS UNIDOS BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO PPAL | 1 | 512 Mbps | |
| COSEC TEUSAQUILLO BACKUP | 1 | 512 Mbps | |
| ESU | 311 | 8 Mbps | \$ 133.569.959 |
| ESU ROUTER | 9 | 100 G | \$ 5.919.760 |
| INDIGO | 203 | 8 Mbps | \$ 86.086.870 |
| SITECSYS | 431 | 8 Mbps | \$ 188.840.313 |
| | 1 | 64 Mbps | |
| TRANSMILENIO | 1 | 10 Mbps | \$ 16.071.188 |
| | 1 | 34 Mbps | |
| | 3 | 60 Mbps | |
| | 1 | 50 Mbps | |
| | 1 | 64 Mbps | |
| UT ANTERIOR | 166 | 8 Mbps | \$ 76.092.121 |
| | 1 | 56 Mbps | |
| | 1 | 64 Mbps | |
| TOTAL | | | \$ 2.200.877.940 |

Tabla 69. Relación discriminada actividades septiembre 2019, Contrato 914 de 2019.

2.4.2 Contrato No. 780-2019 – UT Servicios Mnto Vigilancia Ciudadana 2019

Facturación realizada en julio 2020:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|---------------|--------------------|---|----------|------------------|
| MANTENIMIENTO | 780 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020, SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO | 61 y 62 | \$ 1.509.384.679 |

Tabla 70. Relación facturación actividades junio 2020, Contrato 780 de 2019.

| MANTENIMIENTO 780 DE 2019 - ACTIVIDADES JUNIO DE 2020 | |
|---|-------------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | \$ 1.223.993.830 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS | \$ 276.412.394 |
| MESA DE AYUDA | \$ 14.455.735 |
| DESCUENTOS POR ANS | \$ (-5.477.280) |
| TOTAL | \$ 1.509.384.679 |

Tabla 71. Relación discriminada actividades junio 2020, Contrato 780 de 2019.

Facturación realizada en junio 2020:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|---------------|--------------------|--|----------|------------------|
| MANTENIMIENTO | 780 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020, SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO | 59 y 60 | \$ 1.510.236.964 |

Tabla 72. Relación facturación actividades mayo 2020, Contrato 780 de 2019.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| MANTENIMIENTO 780 DE 2019 - ACTIVIDADES MAYO DE 2020 | |
|--|-------------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | \$ 1.013.387.709 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS | \$ 485.246.270 |
| MESA DE AYUDA | \$ 14.455.735 |
| DESCUENTOS POR ANS | \$ (-2.852.750) |
| TOTAL | \$ 1.510.236.964 |

Tabla 73. Relación discriminada actividades mayo 2020, Contrato 780 de 2019.

Facturación realizada en mayo 2020

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|---------------|--------------------|---|----------|-----------------|
| MANTENIMIENTO | 780 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020, SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO | 53 y 55 | \$ 484.111.285 |

Tabla 74. Relación facturación actividades abril 2020, Contrato 780 de 2019.

| MANTENIMIENTO 780 DE 2019 - ACTIVIDADES ABRIL DE 2020 | |
|---|-----------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | \$ 463.832.085 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS | \$ 12.441.845 |
| MESA DE AYUDA | \$ 14.455.735 |
| DESCUENTOS POR ANS | \$ (-6.618.380) |
| TOTAL | \$ 484.111.285 |

Tabla 75. Relación discriminada actividades abril 2020, Contrato 780 de 2019.

Facturación realizada en abril 2020:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|---------------|--------------------|---|----------|-----------------|
| MANTENIMIENTO | 780 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020, SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO | 51 y 52 | \$ 647.067.542 |

Tabla 76. Relación facturación actividades marzo 2020, Contrato 780 de 2019.

| MANTENIMIENTO 780 DE 2019 - ACTIVIDADES MARZO DE 2020 | |
|---|-----------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | \$ 537.386.697 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS | \$ 104.924.460 |
| MESA DE AYUDA | \$ 14.455.735 |
| DESCUENTOS POR ANS | \$ (-9.699.350) |
| TOTAL | \$ 647.067.542 |

Tabla 77. Relación discriminada actividades marzo 2020, Contrato 780 de 2019.

Facturación realizada en marzo de 2020:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|---------------|--------------------|---|---------------------|------------------|
| MANTENIMIENTO | 780 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020, | 45, 46, 47, 48 Y 49 | \$ 1.572.633.810 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|---|----------|-----------------|
| | | SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO | | |

Tabla 78. Relación facturación actividades febrero 2020, Contrato 780 de 2019.

| MANTENIMIENTO 780 DE 2019 - ACTIVIDADES FEBRERO DE 2020 | |
|---|-------------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| ESTACIONES DE POLICIA | \$ 999.533.854 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | \$ 68.043.330 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS | \$ 504.978.751 |
| MESA DE AYUDA | \$ 14.455.735 |
| DESCUENTOS POR ANS | \$ (-14.377.860) |
| TOTAL | \$ 1.572.633.810 |

Tabla 79. Relación discriminada actividades febrero 2020, Contrato 780 de 2019.

Durante el mes de marzo de 2020, también se radicarón las facturas correspondientes al mes de enero de 2020:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|---------------|--------------------|---|---------------------|------------------|
| MANTENIMIENTO | 780 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020, SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO | 39,40,41,42.43 y 44 | \$ 1.481.011.977 |

Tabla 80. Relación facturación actividades enero 2020, Contrato 780 de 2019.

| MANTENIMIENTO 780 DE 2019 - ACTIVIDADES ENERO DE 2020 | |
|---|-------------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| ESTACIONES DE POLICIA | \$ 999.937.573 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | \$ 306.185.699 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS | \$ 166.768.080 |
| MESA DE AYUDA | \$ 14.455.735 |
| DESCUENTOS POR ANS | \$ (-6.335.110) |
| TOTAL | \$ 1.481.011.977 |

Tabla 81. Relación discriminada actividades enero 2020, Contrato 780 de 2019.

Facturación realizada en febrero de 2020:

Las facturas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 correspondientes a las actividades ejecutadas en el mes de diciembre de 2019, las cuales fueron radicadas en el mes de febrero de 2020:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|---------------|--------------------|---|----------------------------|------------------|
| MANTENIMIENTO | 780 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO | 31,32,33,34,35, 36,37 y 38 | \$ 2.032.695.719 |

Tabla 82. Relación facturación actividades diciembre 2019, Contrato 780 de 2019.

| MANTENIMIENTO 780 DE 2019 - ACTIVIDADES DICIEMBRE DE 2019 | |
|---|--------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| PROYECTO MODERNIZACION PANELES SOLARES | \$ 390.181.144 |
| PROYECTO DE MIGRACION A VMS SECUROS DE VMS INDIGO | \$ 154.084.800 |
| ESTACIONES DE POLICIA | \$ 1.000.297.550 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | \$ 369.674.160 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| MANTENIMIENTO 780 DE 2019 - ACTIVIDADES DICIEMBRE DE 2019 | |
|---|-------------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| MATERIALES Y SERVICIOS PARQUE SIMON BOLIVAR FVS-201 | \$ 16.489.850 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS | \$ 92.875.650 |
| MESA DE AYUDA | \$ 14.455.735 |
| DESCUENTOS POR ANS | \$ (-5.363.170) |
| TOTAL | \$ 2.032.695.719 |

Tabla 83. Relación discriminada actividades diciembre 2019, Contrato 780 de 2019.

Facturación realizada en enero de 2020:

Las facturas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 correspondientes a diciembre de 2019, no fueron radicadas dentro del tiempo establecido para radicación de facturación por la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, por lo anterior el certificado de supervisión e interventoría para la gestión de cuentas junto con las facturas fueron radicadas en el mes de febrero de 2020.

Facturación realizada en diciembre de 2019:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|---------------|--------------------|---|----------|-----------------|
| MANTENIMIENTO | 780 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO | 28 y 29 | \$ 797.283.324 |

Tabla 84. Relación facturación actividades diciembre 2019, Contrato 780 de 2019

| MANTENIMIENTO 780 DE 2019 - ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2019 | |
|--|-----------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | \$ 620.443.302 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS | \$ 176.840.022 |
| TOTAL, OTROS SERVICIOS | \$ 26.823.737 |
| DESCUENTOS POR ANS | \$ (-10.498.120) |
| TOTAL | \$ 797.283.324 |

Tabla 85. Relación discriminada actividades noviembre 2019, Contrato 780 de 2019.

Facturación realizada en noviembre de 2019:

Durante el mes de noviembre de 2019 igualmente se realizo la facturación correspondiente a suministro e instalación de repuestos del mes de septiembre de 2019 debido a que en el mes de octubre de 2019 no se realizo la facturación dentro de los tiempos establecidos.

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|---------------|--------------------|--|----------|-----------------|
| MANTENIMIENTO | 780 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS | 24 | \$ 66.216.300 |
| | | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 26 y 27 | \$1.027.038.785 |

Tabla 86. Relación facturación actividades septiembre de 2019 (suministro e instalación de repuestos) y octubre 2019, Contrato 780 de 2019.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| MANTENIMIENTO 780 DE 2019 - ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2019 | |
|--|---------------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| SERVICIOS DE MANTENIMEINTO | facturado en octubre 2019 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS | \$ 66.216.300 |
| SERVICIOS TECNICOS | facturado en octubre 2019 |
| DESCUENTOS POR ANS | facturado en octubre 2019 |
| TOTAL | \$ 66.216.300 |

Tabla 87. Relación actividades suministro e instalación de repuestos septiembre 2019, Contrato 780 de 2019.

| MANTENIMIENTO 780 DE 2019 - ACTIVIDADES OCTUBRE DE 2019 | |
|---|-------------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| SERVICIOS DE MANTENIMEINTO | \$ 704.284.640 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS | \$ 312.064.040 |
| SERVICIOS TCNICOS | \$ 14.455.735 |
| DESCUENTOS POR ANS | \$ (-3.765.630) |
| TOTAL | \$ 1.027.038.785 |

Tabla 88. Relación discriminada de actividades octubre 2019, Contrato 780 de 2019.

| MANTENIMIENTO 780 DE 2019 - ACTIVIDADES NOVIEMBRE DE 2019 | |
|---|-------------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| SERVICIOS DE MANTENIMEINTO | \$ 704.284.640 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS | \$ 312.064.040 |
| SERVICIOS TECNICOS | \$ 14.455.735 |
| DESCUENTOS POR ANS | \$ (-3.765.630) |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS (SEPTIEMBRE 2019) | \$ 66.216.300 |
| TOTAL, FACTURADO EN NOVIEMBRE DE 2019 | \$ 1.093.255.085 |

Tabla 89. Relación discriminada actividades facturadas en noviembre de 2019

Facturación realizada en octubre 2019:

Durante el mes de octubre la interventoria gestiono la facturacion de agosto 2019 del contratista, sin embargo, se realizo aclaración frente al inicio de actividades del CONSORCIO SMARTY -SCAIN 2019 a partir del 7 de septiembre de 2019.

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURAS | VALOR FACTURADO |
|---------------|--------------------|--|----------|-----------------|
| MANTENIMIENTO | 780 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 FACTURAS 19 Y 20 EL CONSORCIO SMARTY -SCAIN 2019, REALIZO ACLARACION EN EL CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS | 19 y 20 | \$610.126.487 |
| | | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURAS 23 EL CONSORCIO SMARTY -SCAIN 2019 REALIZO ACLARACION EN EL CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS | 23 | \$ 233.247.342 |

Tabla 90. Relación facturación actividades agosto y septiembre 2019 contrato 780 de 2019

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| MANTENIMIENTO 780 DE 2019 - ACTIVIDADES AGOSTO 2019 | |
|---|-----------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | \$ 504.699.552 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS | \$ 90.971.200 |
| SERVICIOS TCNICOS | \$ 14.455.735 |
| DESCUENTOS POR ANS | \$ - |
| TOTAL | \$ 610.126.487 |

Tabla 91. Relación discriminada de actividades agosto 2019 contrato 780 de 2019

| MANTENIMIENTO 780 DE 2019 - ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2019 | |
|--|-----------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | \$ 220.160.927 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS | \$ - |
| SERVICIOS TCNICOS | \$ 14.455.735 |
| DESCUENTOS POR ANS | \$ (-1.369.320) |
| TOTAL | \$ 233.247.342 |

Tabla 92. Relación discriminada actividades septiembre 2019 contrato 780 de 2019**2.4.3 CONTRATO No. 756 -2019 – CODENSA**

Facturación realizada en julio 2020:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURA | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|--|------------|-----------------|
| CODENSA | 756 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JUNIO DE 2020 | FV00096779 | \$ 197.024.369 |

Tabla 93. Relación factura periodo junio de 2020.

| CODENSA 756 DE 2019 | |
|---------------------|-----------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| MANTENIMIENTO | \$ 154.184.369 |
| SUMINISTRO | \$ 42.840.000 |
| TOTAL | \$ 197.024.369 |

Tabla 94. Relación discriminada de actividades junio de 2020.

Facturación realizada en junio 2020:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURA | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|---|------------|-----------------|
| CODENSA | 756 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MAYO DE 2020 | FV00096310 | \$ 204.122.105 |

Tabla 95. Relación factura periodo mayo de 2020.

| CODENSA 756 DE 2019 | |
|---------------------|--------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| MANTENIMIENTO | \$ 204.122.105 |

Tabla 96. Relación discriminada de actividades mayo de 2020.

Facturación realizada en mayo 2020:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURA | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|--|------------|-----------------|
| CODENSA | 756 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE ABRIL DE 2020 | FV00095971 | \$ 61.201.677 |

Tabla 97. Relación factura periodo del 1 al 29 de abril de 2020.

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| CODENSA 756 DE 2019 | |
|---------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| MANTENIMIENTO | \$ 61.201.677 |
| TOTAL | \$ 61.201.677 |

Tabla 98. Relación discriminada de actividades del 1 al 29 de abril de 2020

Facturación realizada en abril 2020:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURA | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|---|------------|-----------------|
| CODENSA | 756 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020 | FV00095687 | \$ 55.227.930 |

Tabla 99. Relación factura periodo del 1 de febrero al 31 de marzo de 2020.

| CODENSA 756 DE 2019 | |
|---------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| MANTENIMIENTO | \$ 55.227.930 |
| TOTAL | \$ 55.227.930 |

Tabla 100. Relación discriminada de actividades del 1 de febrero al 31 de marzo de 2020.

Facturación realizada en marzo de 2020:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURA | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|---|------------|-----------------|
| CODENSA | 756 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020. | FV00094868 | \$ 55.680.195 |

Tabla 101. Relación factura periodo del 28 diciembre 2019 al 31 enero de 2020.

| CODENSA 756 DE 2019 | |
|---------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| MANTENIMIENTO | \$ 55.680.195 |
| TOTAL | \$ 55.680.195 |

Tabla 102. Relación discriminada de actividades del 28 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020.

Facturación realizada en febrero de 2020: La factura correspondiente al periodo del 23 de octubre al 27 de noviembre de 2019 FV00094722, fue ajustada por el contratista y radicada en febrero de 2020.

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURA | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|--|------------|-----------------|
| CODENSA | 756 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE Y EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 | FV00094722 | \$175.034.255 |

Tabla 103. Relación facturación actividades del 23 octubre al 27 noviembre 2019 del contrato 756 de 2019.

| CODENSA 756 DE 2019 | |
|---------------------|-----------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| MANTENIMIENTO | \$ 99.817.575 |
| CONEXIÓN | \$ 75.216.680 |
| TOTAL | \$ 175.034.255 |

Tabla 104. Relación discriminada de actividades del 23 de octubre 2019 al 27 de noviembre de 2019.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURA | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|---|------------|-----------------|
| CODENSA | 756 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019. | FV00094723 | \$85.449.169 |

Tabla 105. Relación factura periodo del 28 noviembre al 27 diciembre 2019.

| CODENSA 756 DE 2019 | |
|---------------------|--------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| MANTENIMIENTO | \$ 85.449.169 |

Tabla 106. Relación discriminada de actividades 28 de noviembre al 27 de diciembre 2019.

Facturación realizada en enero de 2020: La factura de CODENSA S.A. E.S.P., fue radicada el 17 de enero de 2020 con radicado No 2020-541-005585-1 la cual fue devuelta por la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con oficio del 27 de enero de 2020 debido a que la factura se encontraba con fecha de diciembre de 2019, esta factura fue radicada en el mes de febrero de 2020 una vez el contratista realizo el respectivo ajuste.

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURA | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|--|------------|-----------------|
| CODENSA | 756 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE Y EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 | FV00094110 | \$175.034.255 |

Tabla 107. Relación facturación actividades 23 octubre al 27 noviembre 2019 del Contrato 756 de 2019.

| CODENSA 756 DE 2019 | |
|---------------------|-----------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| CONEXIÓN | \$ 75.216.680 |
| MANTENIMIENTO | \$ 99.817.575 |
| TOTAL | \$ 175.034.255 |

Tabla 108. Relación discriminada de actividades del 23 octubre al 27 noviembre 2019 del Contrato 756 de 2019.

Facturación realizada en diciembre de 2019:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURA | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|---|---------|-----------------|
| CODENSA | 756 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019 | FV93337 | \$205.533.558 |

Tabla 109. Relación facturación actividades del 25 septiembre 2019 al 23 octubre 2019 del contrato 756 de 2019.

| CODENSA 756 DE 2019 | |
|---------------------|-----------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| CONEXIÓN | \$ 126.619.982 |
| MANTENIMIENTO | \$ 78.913.576 |
| TOTAL | \$ 205.533.558 |

Tabla 110. Relación discriminada de actividades de 25 septiembre 2019 al 23 octubre 2019, Contrato 756 de 2019.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Facturación realizada en noviembre 2019:

Para este periodo de facturación, se informa que por parte del contratista no se efectuó facturación del contrato de 756 de 2019.

Facturación realizada en octubre 2019:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURA | VALOR FACTURADO |
|----------|--------------------|---|-----------|-----------------|
| CODENSA | 756 DE 2019 | ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019, EL CONSORCIO SMARTY -SCAIN 2019, REALIZO ACLARACION MEDIANTE ACTA No 007 | FV0009688 | \$1.186.455.323 |

Tabla 111. Relación facturación actividades de agosto del contrato 756 de 2019.

| CODENSA 756 DE 2019 | |
|---------------------|-------------------------|
| ACTIVIDAD | VALOR IVA INCLUIDO |
| CONEXIÓN | \$ 1.141.319.993 |
| MANTENIMIENTO | \$ 45.153.330 |
| TOTAL | \$ 1.186.473.323 |

Tabla 112. Relación discriminada de actividades agosto 2019, Contrato 756 de 2019

2.4.4 Instrumento de agregación de demanda 601-1-AG Securitech

Facturación realizada en diciembre de 2019:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURA | VALOR FACTURADO |
|--------------|--|--|---------|----------------------------|
| SEGURITECH | INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA CCE-601-1-AG-2017 | CUARTO PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24383 LOCALIDAD SUBA | FE4 | \$ 1.326.268.586 |
| SEGURITECH | | CUARTO PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24362 LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR | FE6 | \$ 1.063.057.040,36 |
| SEGURITECH | | CUARTO PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24393 LOCALIDAD BOSA | FE5 | \$ 1.526.239.845,48 |
| TOTAL | | | | \$ 3.915.565.471,84 |

Tabla 113. Relación de pagos localidad de Suba, Ciudad Bolívar y Bosa del contrato 601-1-AG SEGURITECH.

Facturación realizada en noviembre de 2019:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURA | VALOR FACTURADO |
|--------------|--|--|---------|-------------------------|
| SEGURITECH | INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA CCE-601-1-AG-2017 | CUARTO PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24287 LOCALIDAD KENNEDY SMARTY -SCAIN 2019 REALIZO ACLARACION MEDIANTE ACTA No 016 | 72 | \$ 1.074.445.823 |
| | | TERCER PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24383 LOCALIDAD SUBA, SMARTY -SCAIN 2019 REALIZO ACLARACION MEDIANTE ACTA No 011 | 71 | \$ 1.329.934.797 |
| TOTAL | | | | \$ 2.404.380.620 |

Tabla 114. Relación de pagos de dos localidades del Contrato 601-1-AG SEGURITECH.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Facturación realizada en octubre 2019:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURA | VALOR FACTURADO |
|------------|--|--|---------|-----------------|
| SEGURITECH | INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA CCE-601-1-AG-2017 | TERCER PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24393 LOCALIDAD BOSA , SMARTY -SCAIN 2019 REALIZO ACLARACION MEDIANTE ACTA No 003 | 68 | \$1.527.271.020 |
| | | TERCER PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24362 LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR , SMARTY -SCAIN 2019 REALIZO ACLARACION MEDIANTE ACTA No 010 | 69 | \$1.080.000.000 |
| | | CUARTO PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24413 LOCALIDAD ENGATIVA , SMARTY -SCAIN 2019 REALIZO ACLARACION MEDIANTE ACTA No 04 | 65 | \$ 927.081.838 |
| | | CUARTO PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24292 RAFAEL URIBE URIBE , SMARTY -SCAIN 2019 REALIZO NOTA ACLARATORIA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES | 66 | \$ 555.140.755 |
| | | CUARTO PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24358 SAN CRISTOBAL , SMARTY -SCAIN 2019 REALIZO ACLARACION MEDIANTE ACTA No 06 | 67 | \$ 747.432.965 |
| | | CUARTO PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24295 MARTIRES , SMARTY -SCAIN 2019 REALIZO ACLARACION MEDIANTE ACTA No 013 | 70 | \$ 306.186.396 |
| | | TOTAL | | |

Tabla 115. Relación de pagos de seis localidades del Contrato 601-1-AG SEGURITECH.

2.4.5 Instrumento de agregación de demanda 601-1-AG UT BASC

Facturación realizada en noviembre de 2019:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURA | VALOR FACTURADO |
|---|--|--|---------|-----------------|
| UT BOGOTA ALCALDIAS SEGURIDAD CIUDADANA | INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA CCE-601-1-AG-2017 | TERCER PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24293 LOCALIDAD CANDELARIA SMARTY -SCAIN 2019 REALIZO ACLARACION MEDIANTE ACTA No 019 | 29 | \$ 129.462.550 |
| | | CUARTO PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24293 LOCALIDAD CANDELARIA | 30 | \$ 136.849.607 |
| | | TERCER PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24367 LOCALIDAD SANTA FE SMARTY -SCAIN 2019 REALIZO ACLARACION MEDIANTE ACTA No 020 | 31 | \$ 248.421.762 |
| | | CUARTO PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24367 LOCALIDAD SANTA FE | 32 | \$ 255.133.441 |
| | | TERCER PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 28393 LOCALIDAD USAQUEN SMARTY -SCAIN 2019 REALIZO ACLARACION MEDIANTE ACTA No 014 | 27 | \$ 286.196.125 |
| | | CUARTO PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 28393 LOCALIDAD USAQUEN | 28 | \$ 286.196.124 |
| | | TOTAL | | |

Tabla 116. Relación de pagos de cada una de las localidades del instrumento de agregación de demanda 601-1-AG UT BASC.

2.5 SEGUIMIENTO JURÍDICO

La presente relación da cuenta del estado legal del contrato al 30 de julio de 2020.

| INFORMACIÓN CONTRACTUAL | |
|-------------------------|---|
| NO. CONTRATO | 1020 DE 2019 |
| TIPO DE CONTRATO | INTERVENTORÍA |
| NOMBRE CONTRATISTA | CONSORCIO SMARTY – SCAIN 2019 |
| FECHA DE CONTRATO | 06-SEP-19 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 07-SEP-19 |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 4.000.458.60 MODIFICACIÓN NUMERO 1: SE ADICIONA LA SUMA DE \$805.599.859 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2.673.467.812 MODIFICACIÓN NUMERO 2: SE ADICIONA LA SUMA DE \$ 1.047.624.354 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3.721.092.166 MODIFICACIÓN NUMERO 3: SE ADICIONA LA SUMA DE \$ 279.366494 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 4.000.458.60 |
| OBJETO CONTRACTUAL | INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | DIEZ (10) MESES MODIFICACIÓN NUMERO 1: SE PRORROGA EL CONTRATO POR 2 MESES 10 DIAS AIDICIONACLES. PLAZO TOTAL: 7MESES MODIFICACIÓN NUMERO 2: SE PRORROGA EL CONTRATO POR 3 MESES AIDICIONALES. PLAZO TOTAL: 10 MESES MODIFICACIÓN NUMERO 3: SE PRORROGA EL CONTRATO POR 24 DIAS AIDICIONALES. PLAZO TOTAL: 10 MESES 24 DIAS |
| ESTADO JURÍDICO | EN LIQUIDACIÓN |

Tabla 117. Estado legal del contrato al 30 de julio 2020

2.5.1 Contratos objeto de Interventoría

La interventoría en ejercicio de sus facultades contractuales y legales, se permite presentar el informe del componente jurídico relacionado con la verificación de las acciones desplegadas por cada uno de los contratistas en virtud del cumplimiento de las obligaciones contractuales, realizando el seguimiento a la estimación, tipificación y asignación de los riesgos involucrados en el proceso de ejecución de cada uno de los contratos, de acuerdo con la matriz que hace parte integral del mismo, a continuación presentamos la relación de los contratos objeto de interventoría:

| ÍTEM | CONTRATISTA | NÚMERO DE CONTRATO |
|------|---|--------------------|
| 1 | INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 601-1-AG-SEGURITECH | CCE-601-1AG-2017 |
| 2 | INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 601-1-AG-UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA | CCE-601-1AG-2017 |
| 3 | CODENSA S.A E.S.P. | 756 DE 2019 |
| 4 | UT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 | 780 DE 2019 |
| 5 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 914 DE 2019 |

Tabla 118. Contratos objeto de Interventoría.

Contratos objeto de Interventoría

Como medida de fortalecimiento en el marco de la ejecución contractual, esta interventoría ha efectuado monitoreo a cada una de las acciones implementadas por los contratistas, con el propósito de advertir, erradicar o mitigar cualquier tipo de circunstancia que pueda alterar las condiciones contractuales en toda su extensión.

Los riesgos son detallados en cada capítulo correspondiente a cada contratista.

2.5.2 Seguimiento a garantías

En atención a la verificación del cumplimiento de la obligación contractual señalada en la cláusula séptima, literal c en su numeral 5 del contrato de interventoría No. 1020 de 2019, que prescribe:

“(...) 5). Verificar durante la vigencia de los proyectos, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en los contratos. (...)”

La interventoría procedió con la validación jurídica de cada una de las garantías exigidas a los contratistas en el marco de cada uno de los contratos tal como se describe en el capítulo del respectivo contrato, identificando que los amparos constituidos en cada una de las pólizas se ajustan a los términos y condiciones establecidos contractualmente, así como en lo contemplado en el libro 2 parte 2 título 1 capítulo 2 de la sección 3 del Decreto 1082 de 2015.

Ahora, frente al contrato de interventoría y en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula decima del contrato 1020 de 2019, que señala:

“(...) CLÁUSULA DÉCIMA: GARANTÍAS: El Contratista deberá constituir a su costa y a favor de la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT, No. 899.999.061-9, un contrato de seguro contenido en una póliza de conformidad con lo previsto en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución del contrato y liquidación del mismo, y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los siguientes amparos: A) De cumplimiento del contrato. El valor asegurado debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y seis (06) meses más, en todo caso debe estar vigente para la liquidación del contrato. Este amparo deberá cubrir el pago de las multas que se impongan durante su ejecución y la cláusula Penal según el caso. B) Calidad del servicio: El valor asegurado debe ser equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del contrato, por el término de ejecución del contrato y seis (06) meses más. C) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El valor asegurado debe ser equivalente al 5% del valor total del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y tres (3) años más. D) Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor asegurado debe ser equivalente a Trescientos (300) SMMLV, que deberá encontrarse vigente por todo el plazo del contrato y deberá ser actualizado en caso de ser necesario según el plazo de ejecución del contrato. La póliza deberá ser entregada para aprobación a los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. (...)”

Teniendo en cuenta la obligación contractual, a continuación, detallamos la póliza constituida para efectos de dar cumplimiento a la obligación anteriormente señalada, identificando que los amparos constituidos se ajustan a los términos y condiciones

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

establecidos contractualmente, así como en lo contemplado en el libro 2 parte 2 título 1 capítulo 2 de la sección 3 del Decreto 1082 de 2015, así:

| POLIZAS CONTRATO 1020 DE 2019 - PLAZO: DIEZ (10) MESES | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|
| GARANTÍAS | CUANTÍA | VIGENCIA | ASEGURADORA | No PÓLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO ACTUAL | OBSERVACIONES |
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 20 % DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CON UNA VIGENCIA IGUAL AL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL MISMO Y SEIS (6) MESES MAS | SEGUROS DEL ESTADO | 15-44-101217701 | 06/09/2019 | 30/01/2021 | \$800,091,732 | CUMPLE |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20 % DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MAS | SEGUROS DEL ESTADO | 15-44-101217701 | 06/09/2019 | 30/01/2021 | \$800,091,732 | CUMPLE |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 5 % DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CON UNA VIGENCIA IGUAL AL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL MISMO Y TRES (3) AÑOS MÁS | SEGUROS DEL ESTADO | 15-44-101217701 | 06/09/2019 | 30/07/2023 | \$200,022,933 | CUMPLE |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | TRESCIENTOS (300) SMMLV | CON UNA VIGENCIA IGUAL AL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL MISMO | SEGUROS DEL ESTADO | 15-40-101060249 | 06/09/2019 | 30/07/2023 | \$263,340,900.00 | CUMPLE |

Tabla 119. Pólizas contrato 1020 de 2019.

Respuestas a derechos de petición

Durante el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 30 de julio del año en curso, se recibieron seis (6) derechos de petición, para tal efecto el área jurídica de la interventoría realizó el debido seguimiento con su respectiva respuesta en los términos y condiciones del contrato.

| CONSECUTIVO DE SOLICITUD | ASUNTO | CONSECUTIVO RESPUESTA |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Mediante correo electrónico | Petición Juan Javier Baena Merlano | CSS-P136-00191-2020 |
| 20205410316011 | Petición Sergio Valdez | CSS-P136-00194-2020 |
| 20205410331061 | Petición Sergio Vargas | CSS-P136-00205-2020 |
| 20205410316011 | Petición Sergio Valdez | CSS-P136-00209-2020 |
| Mediante correo electrónico | Petición Javier Baena | CSS-P136-00210-2020 |
| Mediante correo electrónico | Petición Yeffer Vega | CSS-P136-00212-2020 |

Tabla 120. Respuestas a derechos de petición

2.5.3 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales:

En atención a la labor de intermediación entre la entidad contratante y los contratistas señalados con anterioridad, dirigida a cumplir el control y vigilancia de la correcta ejecución de las obligaciones surgidas del contrato, en virtud de lo establecido en la cláusula séptima literal c numeral 1 del contrato de interventoría No. 1020 de 2019, que reza:

“(...) 1) Velar y verificar que los contratistas de los proyectos cumplan con las obligaciones establecidas en el contrato, pliego de condiciones, anexo técnico y demás documentos que hagan parte integral de sus respectivos procesos de contratación. (...)”

Esta interventoría, informa el seguimiento frente al cumplimiento de las obligaciones de tipo jurídico y técnico con un enfoque cualitativo y cuantitativo que le asisten a cada uno de los contratistas en el periodo correspondiente, tal como se observa en el reporte efectuado por el consorcio interventor mediante el presente documento.

2.6 SEGUIMIENTO TÉCNICO

La Interventoría, con el objetivo de realizar el seguimiento y control al desarrollo de las actividades de ejecución de los contratistas, llevó a cabo las siguientes labores de orden general durante el período:

Recopilación de evidencias semanales en C4

En cumplimiento de lo indicado en la obligación específica-obligación de carácter técnico No. 6, el cual establece,

“(...) “Recopilar evidencia fotográfica semanalmente sobre el estado de visualización de los puntos de videovigilancia en C4 o donde determine la supervisión del contrato”. (...)”

La Interventoría consolidó las evidencias fotográficas, recopiladas en C4, del estado del sistema de videovigilancia de Bogotá, dichas evidencias se encuentran en el anexo 4 “Reporte Semanal”.

2.7 SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y MEDIO AMBIENTE

Como parte de las obligaciones de carácter ambiental adquiridas, según lo establece – OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA” del Contrato de Interventoría No. 1020 de 2019, la cual indica:

“2. Ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad o el medio ambiente en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales, nacionales y normas nacionales e internacionales (...)”

Y sobre aquellas que establece la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, el Consorcio Smarty – Scain 2019, consideró como uno de sus propósitos, el desarrollo permanente de actividades orientadas a preservar la salud de sus trabajadores; es por lo anterior que se realizaron las siguientes actividades durante el periodo informado:

- ✓ Generación de información de protocolos y cuidados frente a COVID –19 vía WhatsApp.
- ✓ Evidencias del cumplimiento de las obligaciones de la interventoría.
- ✓ Verificación del cumplimiento de la Seguridad Social mes de julio 2020.
- ✓ Evidencia de entrega de elementos de protección personal COVID –19.
- ✓ Seguimiento caso confirmado de COVID-19 Guber León, origen común – caso cerrado por ARL Colmena.
- ✓ Seguimiento caso confirmado de COVID-19, Karen Garavito. (sin incapacidad)
- ✓ Capacitación de prevención COVID-19 con evaluación.

Los soportes de las actividades anteriormente mencionadas se encuentran implementados, administrados y ejecutados, de igual manera se encuentran adjuntos en la carpeta “Gestión SSTA”.

Finalmente, es de indicar que, durante la ejecución de las labores para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales de Interventoría, a corte del 30 de julio de 2020, se cuenta con implementación de protocolos de prevención y mitigación para COVID-19.

2.8 ANÁLISIS DE RIESGOS

| CAUSA | EVENTO | CONSECUENCIA | GESTIÓN INTERVENTORÍA |
|--|---|--|--|
| Debido a que actualmente no se tiene un enlace físico redundante (fibra óptica) para el sistema de videovigilancia en la ciudad de Bogotá. | Es posible que, al tener una falla masiva por corte de fibra óptica, se quede sin visualización de cámaras en el C4 y COSECs. | Lo que ocasionaría temporalmente que no se visualice los puntos de videovigilancia en tiempo real. | La Interventoría, realizó la gestión ante el proveedor de ETB, para que se realizará este proceso. |
| Debido a la no visualización de todos los puntos de videovigilancia en los COSEC | Es posible, que no se tenga un seguimiento técnico idóneo por parte de la MEBOG, quien es el encargado de operar el sistema. | Ocasionaría que la MEBOG emita diversos requerimientos por este caso | La Interventoría, solicitó al contratista de mantenimiento y ETB, entregar una solución técnica/económica para realizar toda la integración necesaria para que en todos los COSECs se visualicen los puntos de videovigilancia implementados en la ciudad de Bogotá. |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| CAUSA | EVENTO | CONSECUENCIA | GESTIÓN INTERVENTORÍA |
|--|---|--|---|
| Debido a la Pandemia COVID-19 se adoptaron nuevas formas para realizar nuestras actividades. | Es posible que no se logre realizar todas las actividades programadas dado que ejercen diferentes variables, frente a los estados de salud y las nuevas medidas sanitas implementadas por el gobierno nacional. | Ocasionaría un retraso en las actividades diarias. | La interventoría, Genero, solicitó e implemento protocolos, planes de acción y seguimiento a los contratistas frente a COVID – 19 con el fin de prevenir y mitigar. De esta forma no se vean afectadas las actividades diarias. |

Tabla 121. Análisis de riesgos interventoría.

2.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ Entregar a la SDSCJ los insumos técnicos/administrativos/jurídicos de los derechos de petición en el marco del contrato 1020 de 2019.
- ✓ Se deben mantener el cumplimiento de las buenas prácticas de S.S.T por parte del equipo de trabajo.

Contrato 756 de 2019.

- ✓ Se entrega por parte del contratista Codensa S.A. E.S.P., el cronograma para comenzar el proceso de liquidación y cierre del contrato 756 de 2019, para dar cumplimiento al objeto contractual durante el mes de agosto de 2020.
- ✓ Se requiere que el contratista Codensa S.A E.S.P., entregue el total de la información documental requerida para adelantar el proceso de conciliación de la facturación correspondiente a las actividades ejecutadas durante el mes de julio de 2020 y los soportes requeridos para dar cierre al contrato.
- ✓ Se solicita al contratista Codensa S.A E.S.P., se acoja a los tiempos establecidos en el cronograma estipulado para la liquidación y cierre del contrato 756 de 2019 y cumpla con las entregas de información, documentos solicitados.
- ✓ Se informa a la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), que al cierre del presente informe quedan pendiente por ejecutar 62 actividades por falta de tiempo, a su vez se manifiesta que estas actividades corresponden a los reportes emitidos por los distintos fondos de desarrollo locales y copiados al consorcio Smarty-Scain 2019 para su gestión con el contratista Codensa S.A E.S.P., durante la vigencia del contrato 756 de 2019, hasta el pasado 30 de julio de 2020 como se expresa en el modificadorio No.4, firmado el 6 de julio de 2020. Es de aclarar que 52 actividades de las 62 mencionadas corresponden a garantías por daños en la estructura de las cajas de inspección CS274 las cuales serán atendidas a partir del 30 de julio de 2020, estas actividades corresponden a la obligación adquiridas en los contratos 583 de 2017 y 756 de 2019 donde el contratista debe responder por los daños que presenten los materiales utilizados y los acabados en las obras ejecutadas por espacio de dos (2) años a partir de su recepción a satisfacción por la interventoría. Por lo anterior estas actividades no afectan el proceso de liquidación y cierre del contrato 756 de 2019. Una vez ejecutadas estas actividades por el

contratista deberán ser reportadas al supervisor del contrato en la SDSCJ para su verificación y recepción de las actividades adelantadas.

Las 10 actividades restantes corresponden a correctivos que de igual manera fueron reportados por los distintos fondos de desarrollo locales de la ciudad y copiados al consorcio Smarty-Scain 2019 de igual manera no fueron ejecutados por falta de tiempo al contrato 756 de 2019, estas actividades deberán ser atendidas en el futuro a través de una nueva contratación o como determine la SDSCJ.

Contrato 914 de 2019.

- ✓ El enlace Backup se encuentra disponible y funciona como respaldo cuando se presenten fallas en el canal principal.
- ✓ La VRF COSEC de 8GB se encuentra en funcionamiento de manera independiente en la MPLS. Desde esta VRF se puede visualizar, monitorear y configurar las cámaras desde cada uno de los Centros de Monitoreo.
- ✓ Durante el mes de julio de 2020, se solicitaron traslados de cámaras los cuales no se alcanzaron a ejecutar durante la vigencia de este contrato y estos se deben tener en cuenta para el seguimiento de esta actividad en el nuevo contrato de conectividad.
- ✓ Para las cámaras móviles se ha realizado un seguimiento sobre el consumo de datos donde se ha evidenciado que el plan móvil adquirido no es suficiente para tener las cámaras operativas todo el mes. Este consumo varío, lo que determina que cada mes las cámaras que quedan sin datos no son las mismas al mes anterior.

Contrato 780 de 2019.

- ✓ De los **5012** puntos de cámara que hacen parte del sistema de videovigilancia de Bogotá, al finalizar el mes de julio de 2020, hay **4808** puntos de cámara que se visualizan desde el **C4**, lo que representa el **95.93%** de la totalidad del sistema. Es importante tener en cuenta que hay 110 puntos de cámara atribuidos a terceros; al retirar los 110 puntos de cámara atribuidos a terceros del estado del sistema, los puntos de cámara a ser evaluados son de 4902, de estos se encuentran visualizados 4808 representando el 98.08%, estando fuera de servicio 94 puntos de cámara lo que representa el **1,92%**, estos puntos son atribuibles a los diferentes contratistas encargados de su mantenimiento (ETB, CODENSA, UT SMVC Y TRANSMILENIO).
- ✓ En el mes de julio de 2020 se realizó por parte de esta interventoría ochocientos treinta y seis (836) solicitudes de diagnóstico de las cuales se solucionaron de manera remota cuatrocientos ochenta y cuatro (484) puntos de manera remota evitando el desplazamiento hacia el punto.
- ✓ Los proyectos con mayor cantidad de diagnósticos solicitados a la UTSMVC, es del proyecto Alcaldías con 310 puntos, lo que equivale al 38% de la totalidad de las solicitudes de diagnóstico y el proyecto 732 con 261 puntos de cámara, lo que equivale al 32% de la totalidad de las solicitudes de diagnóstico; el proyecto con

menor solicitud de diagnóstico fue el proyecto Transmilenio con 56 puntos, lo que equivale al 7% de la totalidad de los diagnósticos solicitados; los puntos de cámaras reportados como Colegios, CAI, CTP, Centro de monitoreo son subsistemas, por lo cual no se toman como casos de menor solicitudes generadas para el mes de julio de 2020.

Contrato 601 de 2017.

Seguritech Privada S.A de C.V sucursal Colombia

- ✓ Se tiene pendiente el cuarto y último pago de la factura número 66 de la localidad de Rafael Uribe Uribe, porque la alcaldía se encuentra en aislamiento obligatorio por COVID-19 hasta nueva orden.

UT Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana

- ✓ Se tiene pendiente el pago de las facturas 3 y 4 del FDL Antonio Nariño, se informa por parte del FDL Antonio Nariño que se encuentra en trámite interno del FDL.
- ✓ Se tiene programada para el día 14 de agosto de 2020 con el proveedor UTBASC la realización de la actividad de instalación SPT, con la verificación de su respectiva medida al punto CCEL04_011, en la localidad de Santa fe para dar fin a las actividades de Campo por parte de este.
- ✓ Se realizó capacitación para el medidor de tráfico (Procera), dando cumplimiento a la obligación contractual 12.55 del IAD.

3. INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 601-1-AG-SEGURITECH

3.1 FICHA TÉCNICA

| A. INFORMACIÓN GENERAL | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| NIT | 901.138.282-2 | | |
| RAZÓN SOCIAL | SEGURITECH Privada Sociedad Anónima de Capital Variable | | |
| CIUDAD | Bogotá D.C. | | |
| DIRECCIÓN | Carrera 44 No. 20 B – 17 | | |
| TELÉFONO | (1) 3904100 | | |
| I. DATOS DEL CONTRATO | | | |
| CONTRATO No. | CCE-601-1-AG-2017 | | |
| FECHA DE INICIO CONTRATO | 23/11/2017 | FECHA DE TERMINACIÓN | 26/12/2019 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 31.610.733.450 Incluido IVA del 19% | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | \$ 31.610.733.450 Incluido IVA del 19% |
| OBJETO | El objeto del Instrumento de Agregación de Demanda es establecer: (i) las condiciones para la adquisición del Sistema de Video-vigilancia ciudadana al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda y la entrega del Sistema de Video-vigilancia ciudadana por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Instrumento de Agregación de Demanda y adquieren el Sistema de Video-vigilancia ciudadana; y (iii) las condiciones para el pago del Sistema de Video-vigilancia ciudadana por parte de las Entidades Compradoras. | | |
| ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA | 07/09/2019 | | |
| ACTA DE INICIO CON EL FDL | | FECHA DE ACTA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA |
| FDL CHAPINERO | O.C. 24283 | 12/03/2018 | 26/05/2019 |
| FDL SAN CRISTÓBAL | O.C. 24358 | 12/03/2018 | 26/10/2019 |
| FDL USME | O.C. 24281 | 12/03/2018 | 26/08/2019 |
| FDL TUNJUELITO | O.C. 24380 | 12/03/2018 | 26/05/2019 |
| FDL SUBA | O.C. 24383 | 13/03/2018 | 10/12/2019 |
| FDL PUENTE ARANDA | O.C. 24307 | 12/03/2018 | 26/05/2019 |
| FDL CIUDAD BOLÍVAR | O.C. 24362 | 12/03/2018 | 10/03/2020 |
| FDL BOSA | O.C. 24393 | 12/03/2018 | 26/12/2019 |
| FDL KENNEDY | O.C. 24287 | 12/03/2018 | 26/11/2019 |
| FDL FONTIBÓN | O.C. 24303 | 12/03/2018 | 26/08/2019 |
| FDL ENGATIVÁ | O.C. 24413 | 12/03/2018 | 28/10/2019 |
| FDL LOS MÁRTIRES | O.C. 24295 | 12/03/2018 | 26/11/2019 |
| FDL RAFAEL URIBE URIBE | O.C. 24292 | 12/03/2018 | 25/10/2019 |
| II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN SDSCJ / CCE | | | |
| NOMBRE FUNCIONARIO | ROL | CORREO ELECTRÓNICO | |
| Juan Sebastián Cárdenas | Supervisor CCE | juan.cardenas@colombiacompra.gov.co | |
| III. DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| NOMBRE CONTACTO | ROL | CORREO ELECTRÓNICO | |
| Wilfredo Jiménez Castillo | Gerente de proyecto | wilfredo.jimenez@seguritech.com | |
| Jorge Alexander Reyes Sánchez | Coordinador de proyecto | alexander.reyes@seguritech.com | |
| B. ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) |
| 1 | Valor del Contrato | \$31.610.733.450 | 100% |
| 2 | Valor facturado | \$31.483.592.723 | 99,60% |
| 3 | Valor liberado por cada Fondo | \$127.140.727 | 0,40% |
| 4 | Valor pendiente por pagar | \$0 | 0% |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| C. INFORMACIÓN JURÍDICA | | | | |
|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| I. GARANTÍAS DEL CONTRATO | | | | |
| ASEGURADOR A | No. DE PÓLIZA | TIPO DE AMPARO | VALOR | PERÍODO DE COBERTURA |
| Seguros del Estado S.A. | CU 21-44-101260246 | Cumplimiento del Contrato | \$3.210.000.000 | 23/11/2017 A 23/05/2021 |
| | CU 21-44-101260246 | Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnización labores | \$1.605.000.000 | 23/11/2017 A 10/12/2023 |
| | CU 21-44-101260246 | Calidad del servicio | \$3.210.000.000 | 23/11/2017 A 23/05/2021 |
| | CU 21-44-101260246 | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | \$3.210.000.000 | 23/11/2017 A 23/05/2021 |
| | RCE 21-40-101113932 | Responsabilidad Civil Extracontractual | \$1.601.546.100 | 23/11/2017 A 10/12/2020 |

Tabla 122. Ficha Técnica Securitech Privada S.A de C.V

3.2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por la Interventoría con el objetivo de realizar el seguimiento a la ejecución contractual CCE-601-1-AG-2017:

3.2.1 Actas de reunión seguimiento

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. ACTA |
|------------|--------------|---|-----------------|
| 1 | 17/09/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE KENNEDY | 001 |
| 2 | 18/09/2019 | REUNIÓN SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V/SDSCJ/INTERVENTORÍA | 001 |
| 3 | 19/09/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE MÁRTIRES | 001 |
| 4 | 24/09/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE ENGATIVÁ | 001 |
| 5 | 25/09/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE CIUDAD BOLÍVAR | 001 |
| 6 | 26/09/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE KENNEDY | 002 |
| 7 | 27/09/2019 | REUNIÓN SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V/SDSCJ/INTERVENTORÍA/ETB | 002 |
| 8 | 27/09/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE SUBA | 001 |
| 9 | 02/10/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE SAN CRISTÓBAL | 001 |
| 10 | 03/10/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE BOSA | 001 |
| 11 | 11/10/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE KENNEDY | 003 |
| 12 | 17/10/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE KENNEDY | 004 |
| 13 | 18/10/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON SEGURITECH PRIVADA S.A DE C. V | 003 |
| 14 | 18/10/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE CIUDAD BOLÍVAR | 002 |
| 15 | 24/10/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE BOSA | 002 |
| 16 | 25/10/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE KENNEDY | 005 |
| 17 | 29/10/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE SUBA | 002 |
| 18 | 08/11/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON SEGURITECH PRIVADA S.A DE C. V | 004 |
| 19 | 13/11/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE CIUDAD BOLÍVAR | 003 |
| 20 | 06/12/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE CIUDAD BOLÍVAR | 004 |
| 21 | 10/12/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL FDL DE CIUDAD BOLÍVAR | 005 |
| 22 | 10/12/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON SEGURITECH PRIVADA S.A DE C. V | 005 |
| 23 | 17/12/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON SEGURITECH PRIVADA S.A DE C. V | 006 |
| 24 | 18/12/2019 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON SEGURITECH PRIVADA S.A DE C. V | 007 |
| 25 | 27/01/2020 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON SEGURITECH PRIVADA S.A DE C. V | 008 |
| 26 | 07/02/2020 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON SEGURITECH PRIVADA S.A DE C. V | 009 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. ACTA |
|-----|------------|--|----------|
| 27 | 09/03/2020 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON SEGURITECH PRIVADA S.A DE C. V | 010 |

Tabla 123. Actas de reunión de seguimiento Seguritech Privada S.A de C.V**3.2.2 Comunicaciones**

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | No. REGISTRO | REMITENTE | DESTINO |
|-----|------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 12/09/2019 | RESPUESTA INFORMES MENSUALES AGOSTO 2019. | P136-SEG-00002-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 2 | 12/09/2019 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y PERMISOS PARA ACCEDER AL DRIVE DOCUMENTAL. | P136-SEG-00003-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 3 | 13/09/2019 | DOCUMENTACIÓN TELURÓMETROS | P136-SEG-00012-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 4 | 16/09/2019 | APROBACIÓN INFORME DEL 50% DE PUNTOS DE VÍDEO VIGILANCIA INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO LOCALMENTE. | P136-SEG-00017-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 5 | 17/09/2019 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROCESO DE MANTENIMIENTO SEGURITECH | P136-SEG-00026-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 6 | 17/09/2019 | SOLICITUD DE ENTREGA INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE CAMPO | P136-SEG-00027-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 7 | 20/09/2019 | RESPUESTA A SGT-COL-1263-19 SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO EN LOS MÁRTIRES | P136-SEG-00053-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 8 | 23/09/2019 | APROBACIÓN INFORME DEL 100% DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO FDL ENGATIVÁ | P136-SEG-00058-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 9 | 24/09/2019 | REMISIÓN DE LOS PARAFISCALES MESES DE AGOSTO DEL 2019. | P136-SEG-00061-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 10 | 24/09/2019 | REMISIÓN DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO PUNTO DE VÍDEO VIGILANCIA CCAD_L7_100 (LOCALIDAD DE BOSA) | P136-SEG-00064-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 11 | 26/09/2019 | APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL TRÁMITE DE LA TERCERA FACTURACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 24393 (BOSA). | P136-SEG-00081-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 12 | 26/09/2019 | APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL TRÁMITE DE LA CUARTA FACTURACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 24413 (ENGATIVÁ). | P136-SEG-00082-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 13 | 30/09/2019 | RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO EN LOS MÁRTIRES CON CONSECUTIVO SGT-COL-1271-19 | P136-SEG-00082-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 14 | 2/10/2019 | APROBACIÓN INFORME UBICACIÓN/INSTALACIÓN/PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 100% DE PUNTOS DE VÍDEO VIGILANCIA DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 24358. | P136-SEG-00104-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 15 | 9/10/2019 | RESPUESTA OFICIO SGT-COL-1289-19. | P136-SEG-00136-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 16 | 9/10/2019 | APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL TRÁMITE DE LA CUARTA FACTURACIÓN DE LA COMPRA NO. 24358 (SAN CRISTÓBAL). | P136-SEG-00138-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 17 | 9/10/2019 | APROBACIÓN INFORME DEL 50% DE PUNTOS DE VÍDEO VIGILANCIA INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO LOCALMENTE (FDL DE CIUDAD BOLÍVAR). | P136-SEG-00143-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | No. REGISTRO | REMITENTE | DESTINO |
|-----|------------|--|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| 18 | 16/10/2019 | APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PARA LAS LOCALIDADES (BOSA, KENNEDY, RAFAEL URIBE URIBE, SAN CRISTÓBAL). | P136-SEG-00178-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 19 | 16/10/2019 | APROBACIÓN INFORME DEL 50% DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO LOCALMENTE (FDL DE CIUDAD SUBA). | P136-SEG-00179-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 20 | 18/10/2019 | APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL TRÁMITE DE LA TERCERA FACTURACIÓN DE LA COMPRA NO. 24362 (CIUDAD BOLÍVAR) | P136-SEG-00200-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 21 | 18/10/2019 | APROBACIÓN INFORME DEL 100% DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA FDL DE LOS MÁRTIRES | P136-SEG-00202-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 22 | 18/10/2019 | RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO EN DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY CON CONSECUTIVO SGT-COL-1313-19 | P136-SEG-00204-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 23 | 22/10/2019 | ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA OAIIE DE LA SDSCJ SOBRE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA IMPLEMENTADOS EN EL CONTRATO. | P136-SSCJ-00220-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 24 | 25/10/2019 | ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGOS ID DE LAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PROYECTO ALCALDÍAS PROVEEDOR SEGURITECH PRIVADA S.A. DE C.V. | P136-SSCJ-00238-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 25 | 28/10/2019 | APROBACIÓN DEL INFORME DEL 100% DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO FDL KENNEDY. | P136-SSCJ-00250-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 26 | 29/10/2019 | APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL TRÁMITE DE LA CUARTA FACTURACIÓN DE LA COMPRA NO. 24295 (LOS MÁRTIRES). | P136-SSCJ-00260-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 27 | 30/10/2019 | APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL TRÁMITE DE LA TERCERA FACTURACIÓN DE LA COMPRA NO. 24383 (SUBA). | P136-SEG-00266-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 28 | 01/11/2019 | APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL TRÁMITE DE LA CUARTA FACTURACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 24287 (KENNEDY). | P136-SEG-00277-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 29 | 12/11/2019 | INTERVENTORÍAS DURANTE EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 832 DE 2017. | CSS-P136-00038-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | FDLS |
| 30 | 12/11/2019 | DEVOLUCIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES (MES OCTUBRE 2019), PRESENTADOS POR SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. | P136-SEG-00301-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 31 | 18/11/2019 | APROBACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN (MES OCTUBRE 2019), PRESENTADOS POR SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. | P136-SEG-00329-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 32 | 19/11/2019 | APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN (MES OCTUBRE DEL 2019) PARA LA LOCALIDAD DE BOSA. | P136-SEG-00344-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 33 | 26/11/2019 | SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V | P136-SSCJ-00380-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 34 | 26/11/2019 | APROBACIÓN INFORME UBICACIÓN/INSTALACIÓN/LOCALIDAD DE SUBA | P136-SEG-00384-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 35 | 6/12/2019 | PROGRAMAR VISITA EN CONJUNTO CODENSA, ETB Y SEGURITECH PARA EL DÍA LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2019 | P136-SEG-00434-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | No. REGISTRO | REMITENTE | DESTINO |
|-----|------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| 36 | 9/12/2019 | RESPUESTA AL OFICIO SGT- COL-1393-19, LOCALIDAD DE BOSA | P136-SEG-00439-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 37 | 11/12/2019 | DEVOLUCIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES (MES NOVIEMBRE 2019), PRESENTADOS POR SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. | P136-SEG-00455-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 38 | 16/12/2019 | APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL TRÁMITE DE LA CUARTA FACTURACIÓN DE LA COMPRA NO. 24393 (BOSA). | P136-SEG-00475-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 39 | 17/12/2019 | PROGRAMAR VISITA EN CONJUNTO CODENSA, ETB Y SEGURITECH PARA EL DÍA JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2019 | P136-SEG-00478-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 40 | 19/12/2019 | APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE NOV 2019 PARA LAS LOCALIDADES (BOSA, KENNEDY, CIUDAD BOLÍVAR, LOS MÁRTIRES | P136-SEG-00488-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 41 | 19/12/2019 | APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL TRÁMITE DE LA CUARTA FACTURACIÓN DE LA COMPRA NO. 24362 (CIUDAD BOLÍVAR). | P136-SEG-00491-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 42 | 20/12/2019 | RESPUESTA AL OFICIO SGT -COL-1383-19 ENVIADO POR PROVEEDOR SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V – SOLICITUD DE PRORROGA | P136-SEG-00498-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 43 | 08/01/2020 | APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PARA LAS LOCALIDADES (BOSA, CIUDAD BOLÍVAR Y SUBA). | P136-SEG-00551-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 44 | 13/01/2020 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FINAL INSTALADA EN EL DATACENTER DE BOMBEROS POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGURITECH | P136-SEG-00571-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 45 | 29/01/2020 | SOLICITUD DE ENTREGA INFORMES FINALES DE CADA UNO DE LOS FDL A CARGO DE SEGURITECH S.A DE C.V. | P136-SEG-00628-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 46 | 3/02/2020 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LOS PENDIENTES INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN EL DATACENTER DE BOMBEROS POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. | P136-SEG-00641-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 47 | 7/02/2020 | RESPUESTA AL OFICIO SGT-COL-1505-20 “ACTUALIZACIÓN DE NOMENCLATURA INICIAL PARA 45 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA CIUDAD BOLIVAR | P136-SEG-00658-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 48 | 14/02/2020 | RESPUESTA AL COMUNICADO SGT-COL-1542-20 RELACIÓN DE FACTURACIÓN POR LOCALIDAD. EL CUAL DA ALCANCE AL COMUNICADO SGT-COL-1536-20. | P136-SEG-00679-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 49 | 17/02/2020 | NOTIFICACIÓN CAMBIO DE NÚMERO DE OFICINA CONSORCIO. | P136-SEG-00687-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 50 | 20/02/2020 | APROBACIÓN DE INFORMES FINALES DE CADA LOCALIDAD A CARGO DEL PROVEEDOR SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V SUCURSAL COLOMBIA. | P136-SEG-00699-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 51 | 06/03/2020 | REMISIONES PARAFISCALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020. | P136-SEG-00747-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 52 | 19/03/2020 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN CADA LOCALIDAD Y UN CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN A LA FECHA. | P136-SEG-00796-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |
| 53 | 24/03/2020 | RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA - VIRTUAL | P136-SEG-00810-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | No. REGISTRO | REMITENTE | DESTINO |
|-----|------------|--|---------------------|-------------------|---|
| 54 | 27/03/2020 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS CAUSALES DEL NO PAGO FACTURA NO.66 DEL PROVEEDOR SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V SUCURSAL COLOMBIA, CONTRATO CCE-601-1-AG-2017. | P136-SEG-00822-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | FONDO DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE |

Tabla 124. Comunicaciones Securitech Privada S.A de C.V.

Se han reducido las comunicaciones con el proveedor Securitech Privada S.A de C.V sucursal Colombia, ya que culminaron las actividades de implementación el 19 de diciembre de 2019.

3.3 ESTADO GENERAL FINANCIERO

| DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) |
|---------------------------------|------------------|--------|
| VALOR DEL CONTRATO IVA INCLUIDO | \$31.610.733.450 | 100% |
| VALOR FACTURADO | \$31.483.592.722 | 99.60% |
| VALOR LIBERADO POR CADA FONDO | \$127.140.728 | 0,40% |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$0 | 0% |

Tabla 125. Estado General Financiero.

Facturación diciembre 2019:

| CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION | FACTURA | VALOR FACTURADO |
|------------|--|--|---------|---------------------|
| SEGURITECH | INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA CCE-601-1-AG-2017 | CUARTO PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24383 LOCALIDAD SUBA | FE4 | \$ 1.326.268.586 |
| SEGURITECH | | CUARTO PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24362 LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR | FE6 | \$ 1.063.057.040,36 |
| SEGURITECH | | CUARTO PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 24393 LOCALIDAD BOSA | FE5 | \$ 1.526.239.845,48 |
| TOTAL | | | | \$ 3.915.565.471,84 |

Tabla 126. Facturación diciembre de 2019 Securitech Privada S.A de C.V.

3.4 SEGUIMIENTO JURÍDICO

3.4.1 Estado legal del contrato.

La presente relación da cuenta del estado legal del contrato al 30 de julio de 2020.

| INFORMACIÓN CONTRACTUAL | |
|-------------------------|---|
| No. Contrato | CCE-601-1-AG-2017 |
| Tipo de Contrato | Contratación de bienes y servicios - Instrumento de Agregación de Demanda |
| Nombre Contratista | SEGURITECH Privada S.A. de C.V. |
| Fecha de Contrato | 23-nov-2017 |
| Fecha Acta de Inicio | 12-sept-2018 |
| Objeto Contractual | El objeto del Instrumento de Agregación de Demanda es establecer: (i) las condiciones para la adquisición del Sistema de Video-vigilancia ciudadana al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda y la entrega del Sistema de Video-vigilancia ciudadana por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
Contrato 1020 de 2019
Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
01/07/2020– 30/07/2020
Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| INFORMACIÓN CONTRACTUAL | |
|---------------------------|--|
| | Instrumento de Agregación de Demanda y adquieren el Sistema de Video-vigilancia ciudadana; y (iii) las condiciones para el pago del Sistema de Video-vigilancia ciudadana por parte de las Entidades Compradoras. |
| Entidades | FDL Chapinero; FDL San Cristóbal; FDL Usme; FDL Bosa; FDL Kennedy; FDL Fontibón; FDL Engativá; FDL Suba; FDL Mártires; FDL Puente Aranda; FDL Rafael Uribe; FDL Ciudad Bolívar. |
| Plazo de Ejecución | FDL Chapinero: 26 de mayo de 2019 FDL San Cristóbal: 26 de octubre de 2019 FDL Usme: 26 de agosto de 2019 FDL Tunjuelito: 26 de mayo de 2019 FDL Suba: 10 de diciembre de 2019 FDL Puente Aranda: 26 de mayo de 2019 FDL Ciudad Bolívar: 10 de marzo de 2020 FDL Bosa: 26 de diciembre de 2019 FDL Kennedy: 26 de noviembre de 2019 FDL Fontibón: 26 de agosto de 2019 FDL Engativá: 28 de octubre de 2019 FDL Mártires: 26 de noviembre de 2019 FDL Rafael Uribe: 25 de octubre de 2019 |
| Prórrogas | Ninguna Solicitud de prórroga |
| Adiciones | Sin adiciones a la fecha |
| Estado Jurídico | En Liquidación |

Tabla 127. Información contractual Securitech Privada S.A de C.V

A la fecha de elaboración del presente informe de interventoría, no se ha recomendado por parte de la Interventoría, ni el contratista ha solicitado la modificación al contrato antes mencionado en tiempo y en dinero.

3.4.2 Seguimiento a garantías

En atención a la verificación del cumplimiento de la obligación contractual señalada en la cláusula séptima, literal c en su numeral 5 del contrato de interventoría No. 1020 de 2019, que prescribe:

“(...) 5). Verificar durante la vigencia de los proyectos, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en los contratos. (...)”

La interventoría procedió con la validación jurídica de cada una de las garantías exigidas a los contratistas en el marco de cada uno de los contratos tal como se describe en el capítulo del respectivo contrato, identificando que los amparos constituidos en cada una de las pólizas se ajustan a los términos y condiciones establecidos contractualmente, como en lo contemplado en el libro 2 parte 2 título 1 capítulo 2 de la sección 3 del Decreto 1082 de 2015, así:

| PÓLIZAS - INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 601-1-AG-SEGURITECH | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|
| GARANTÍAS | ASEGURADOR A | No PÓLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO ACTUAL | OBSERVACIONES |
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SEGUROS DEL ESTADO | CU 21-44-01260246 | 23/11/2017 | 10/06/2021 | \$3.210.000.00 | CUMPLE |
| CALIDAD DEL SERVICIO | SEGUROS DEL ESTADO | CU 21-44-01260246 | 23/11/2017 | 10/12/2021 | \$3.210.000.00 | CUMPLE |
| CALIDAD Y CORRECTO | SEGUROS DEL ESTADO | CU21-44-101260246 | 23/11/2017 | 10/12/2021 | \$3.210.000.00 | CUMPLE |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
Contrato 1020 de 2019
Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
01/07/2020– 30/07/2020
Revisión 1, 10 de agosto de 2020

| PÓLIZAS - INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 601-1-AG-SEGURITECH | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|
| GARANTÍAS | ASEGURADOR A | No PÓLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO ACTUAL | OBSERVACIONES |
| FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | | | | | | |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | SEGUROS DEL ESTADO | CU 21-44-01260246 | 23/11/2017 | 10/12/2023 | \$1.605.000.000 | CUMPLE |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | SEGUROS DEL ESTADO | RCE 21-4001113932 | 23/11/2017 | 10/12/2020 | \$1.601.546.100 | CUMPLE |

Tabla 128. Pólizas - Instrumento de agregación de demanda 601–Seguritech Privada S.A

3.5 SEGUIMIENTO TÉCNICO

Respecto del seguimiento a las actividades de orden técnico ejecutadas por el proveedor Seguritech Privada S.A de C.V, desde el 19 de diciembre de 2019, se culminaron satisfactoriamente las actividades de acompañamiento de las mismas, arrojando los resultados que se consolidan en la siguiente Tabla 129:

| LOCALIDAD | CANTIDAD A INSTALAR | GABINETE, CORONA Y TRAFÓ | CAJA | ACOMETIDA | SPT | ENERGIZACIÓN GABINETE | UPS | CÁMARA Y BRAZO | PEM ETB | C4 | % EJECUCIÓN | TERMINADA 100% ENTREGADA A LA SDSCJ |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
| BOSA | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| CHAPINERO | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| CIUDAD BOLÍVAR | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| ENGATIVÁ | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| FONTIBÓN | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| KENNEDY | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| MÁRTIRES | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| PUENTE ARANDA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| RAFAEL URIBE | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| SAN CRISTÓBAL | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| SUBA | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| TUNJUELITO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| USME | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| SUMA TOTAL | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 100,00% | |

Tabla 129. Consolidado general técnico – Seguritech Privada S.A de C.V

3.6 RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFORMES DEL CONTRATISTA

El Consorcio SMARTY-SCAIN 2019, Informa que los informes finales de las 13 localidades asignadas al proveedor, fueron aprobados con el consecutivo **P136-SEG-00699-2020**. El día 20 de febrero de 2020 con el asunto Aprobación de informes finales de cada localidad a cargo del proveedor Securitech Privada S.A de C.V. Se anexa la evidencia del correo electrónico en la matriz de control de mes correspondiente.

3.7 ANÁLISIS DE RIESGOS.

| CAUSA | EVENTO | CONSECUENCIA | GESTIÓN INTERVENTORÍA |
|------------|------------------------------------|--|---|
| Vandalismo | Daño de caja de CODENSA. hurto SPT | Se informa alarma de riesgo para el proyecto y solicita se proceda a realizar la reposición. | Se realiza con la interventoría el seguimiento del cumplimiento del proceso de reposición de las tapas dañadas, establecer los tiempos de respuesta del parte de terceros complementando con la documentación de la subsanación del problema. |

Tabla 130. Análisis de riesgos Securitech Privada S.A de C.V

3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ Entregar a la SDSCJ de los insumos técnicos/administrativos/jurídicos de los derechos de petición en el marco del contrato IAD-CCE-601.
- ✓ Realizar el continuo seguimiento por parte de la interventoría a las garantías del contrato vigentes dispuestas por el Instrumento de Agregación y Demanda.
- ✓ El Contratista e Interventoría, ya realizaron las actividades de entrega del 100% de equipos, a los Fondos de Desarrollo Local y estos a su vez realizaron el traspaso a la SDSCJ.
- ✓ Actualización de la matriz de control a las obligaciones del Contratista, en la cual se delimitaron las obligaciones contractuales del contrato IAD-CCE-601.

4. INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 601-1-AG-UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA

4.1 FICHA TÉCNICA

| A. INFORMACIÓN GENERAL | | | |
|---|---|--|------------------|
| NIT | 901.134.817-4 | | |
| RAZÓN SOCIAL | Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana | | |
| CIUDAD | Bogotá D.C. | | |
| DIRECCIÓN | Calle 94 No. 47 – 25 | | |
| TELÉFONO | (1) 2194100 | | |
| I. DATOS DEL CONTRATO | | | |
| CONTRATO No. | CCE-601-1-AG-2017 | | |
| FECHA DE INICIO CONTRATO | 23/11/2017 | FECHA DE TERMINACIÓN | 03/12/2019 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 4.096.185.035 | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | \$ 4.096.185.035 |
| OBJETO | El objeto del Instrumento de Agregación de Demanda es establecer: (i) las condiciones para la adquisición del Sistema de Video-vigilancia ciudadana al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda y la entrega del Sistema de Video-vigilancia ciudadana por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Instrumento de Agregación de Demanda y adquieren el Sistema de Video-vigilancia ciudadana; y (iii) las condiciones para el pago del Sistema de Video-vigilancia ciudadana por parte de las Entidades Compradoras. | | |
| ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA | 7/09/2019 | | |
| ACTA DE INICIO CON EL FDL | FECHA DE ACTA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA | |
| FDL SANTA FE | O.C. 24367 | 12/03/2018 | 30/11/2019 |
| FDL BARRIOS UNIDOS | O.C. 24388 | 05/04/2018 | 26/07/2019 |
| FDL TEUSAQUILLO | O.C. 24288 | 12/03/2018 | 26/10/2019 |
| FDL ANTONIO NARIÑO | O.C. 24304 | 28/03/2018 | 26/07/2019 |
| FDL CANDELARIA | O.C. 24293 | 12/03/2018 | 30/11/2019 |
| FDL USAQUÉN | O.C. 28393 | 18/06/2018 | 03/12/2019 |
| II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN SDSCJ / CCE | | | |
| NOMBRE FUNCIONARIO | ROL | CORREO ELECTRÓNICO | |
| Juan Sebastián Cárdenas | Supervisor CCE | juan.cardenas@colombiacompra.gov.co | |
| III. DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| NOMBRE CONTACTO | ROL | CORREO ELECTRÓNICO | |
| Ana Sepúlveda | Gerente de proyecto | ana.sepulveda@isec.com.co | |
| Yesid Fernández. | Coordinador de proyecto | yesid.fernandez@isec.com.co | |
| B. ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) |
| 1 | Valor del Contrato | \$4.096.185.035 | 100% |
| 2 | Valor facturado | \$4.011.099.063 | 98% |
| 3 | Valor pendiente por ejecutar | \$0 | 0% |
| 4 | valor liberado por cada fondo | \$85.085.972.77 | 2% |
| C. INFORMACIÓN JURÍDICA | | | |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| I. GARANTÍAS DEL CONTRATO | | | | |
|---------------------------|---------------|---|---------------|----------------------------|
| ASEGURADORA | No. DE PÓLIZA | TIPO DE AMPARO | VALOR | PERÍODO DE COBERTURA |
| JMALUCELLI TRAVELERS | CU 56080 | Cumplimiento del Contrato | \$535.000.000 | 23/11/2017 A 23/05/2021 |
| | CU 56080 | Pago Salario y Prestaciones Sociales | \$267.500.000 | 23/11/2017 A 23/11/2023 |
| | CU 56080 | Calidad del Servicio | \$535.000.000 | 23/11/2017 A 23/11/2021 |
| | CU 56080 | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | \$535.000.000 | 23/11/2017 A 23/11/2021 |
| | RCE 56078 | Responsabilidad Civil Extracontractual | \$36.885.850 | 06/12/2017 A 23/11/2020 |

Tabla 131. Ficha técnica - Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana.

4.2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

4.2.1 Actas de reunión seguimiento

Se informa que por parte del proveedor Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana, se encuentra en proceso de liquidación por lo cual no han requerido realizar comités de seguimiento en este mes de julio de 2020, en cada uno de los FDL.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | No. ACTA |
|-----|------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | 16/09/2019 | ACTA DE SEGUIMIENTO FDL USAQUEN | 001 |
| 2 | 19/09/2019 | ACTA DE SEGUIMIENTO UT-BASC | 001 |
| 3 | 27/09/2019 | ACTA DE SEGUIMIENTO UT-BASC | 002 |
| 4 | 03/10/2019 | ACTA DE SEGUIMIENTO FDL LA CANDELARIA | 001 |
| 5 | 03/10/2019 | ACTA DE SEGUIMIENTO FDL SANTA FE | 001 |
| 6 | 04/10/2019 | ACTA DE SEGUIMIENTO UT-BASC | 003 |
| 7 | 02/12/2019 | ACTA DE SEGUIMIENTO UT-BASC | 004 |
| 8 | 17/12/2019 | ACTA DE SEGUIMIENTO UT-BASC | 005 |

Tabla 132. Actas de reunión seguimiento - Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana.

4.2.2 Comunicaciones

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | No. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|------------------------|-------------------|---|
| 1 | 13/09/2019 | PUNTOS CON FALLA DE VISUALIZACIÓN O ACCESO EN C4 EN EL FDL USAQUÉN | P136-UTBASC-00011-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 2 | 16/09/2019 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y PERMISOS PARA ACCEDER AL DRIVE DOCUMENTAL - UTBASC. | P136-UTBASC-00016-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 3 | 23/09/2019 | ACTA DE SEGUIMIENTO UTBASC 001 (190919) | P136-UTBASC-00057-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 4 | 25/09/2019 | SOLICITUD DE PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CCE-601-1-AG-2017 PROVEEDOR UTBASC | P136-UTBASC-00073-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | No. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|------------------------|-------------------|---|
| 5 | 25/09/2019 | REMISIÓN DE LOS PARAFISCALES MESES DE AGOSTO DEL 2019 PROVEEDOR UTBASC | P136-UTBASC-00074-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 6 | 01/10/2019 | DOCUMENTACIÓN TELURÓMETROS DE UTBASC | P136-UTBASC-00101-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 7 | 02/10/2019 | APROBACIÓN INFORME DEL 100% DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO FDL USAQUÉN | P136-UTBASC-00110-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 8 | 15/10/2019 | VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE ENERGÍA PARA LOS PUNTOS AL26 Y CCELO4_011 DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE | P136-UTBASC-00173-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 9 | 16/10/2019 | APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PARA LAS LOCALIDADES (ANTONIO NARIÑO, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO, U | P136-UTBASC-00180-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 10 | 16/10/2019 | SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA FE Y LA CANDELARIA. | P136-UTBASC-00181-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 11 | 18/10/2019 | APROBACIÓN INFORME DEL 50% DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO LOCALMENTE (FDL DE SANTA FE). | P136-UTBASC-00199-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 12 | 23/10/2019 | APROBACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES DEL 50% DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO FDL DE SANTA FE). | P136-UTBASC-00225-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 13 | 25/10/2019 | ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGOS ID DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PROYECTO ALCALDÍAS PROVEEDOR UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA | P136-UTBASC-00239-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 14 | 29/10/2019 | APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES PARA EL TRÁMITE DE TERCERA Y CUARTA FACTURACIÓN DE LA COMPRA NO. 28393 (USAQUÉN). | P136-UTBASC-00258-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 15 | 30/10/2019 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTADO FINANCIERO Y FACTURAS RADICADAS. | P136-UTBASC-00269-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 16 | 06/11/2019 | APROBACIÓN INFORME DEL 100% DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VÍDEO VIGILANCIA FDL DE LA CANDELARIA | P136-UTBASC-00286-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 17 | 15/11/2019 | APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 100% DE LOS PUNTOS DE VÍDEO VIGILANCIA DEL FDL LA CANDELARIA | P136-UTBASC-00319-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 18 | 15/11/2019 | APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE OCTUBRE 2019 PARA LAS LOCALIDADES (TEUSAQUILLO, USAQUÉN, SANTA FE Y LA CANDELARIA). | P136-UTBASC-00320-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 19 | 18/11/2019 | APROBACIÓN INFORME DEL 100% DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VÍDEO VIGILANCIA FDL DE SANTA FE | P136-UTBASC-00326-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | No. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|------------------------|-------------------|---|
| 20 | 21/11/2019 | APROBACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES DEL 100% DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO LOCALMENTE (FDL) | P136-UTBASC-00357-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 21 | 21/11/2019 | ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA 28393 LOCALIDAD USAQUÉN. | P136-UTBASC-00358-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 22 | 29/11/2019 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LO SUCEDIDO EN EL PUNTO CCE_L04_030 UBICADO EN LA "CALLE 28 NO. 5B-02". | P136-UTBASC-00403-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 23 | 11/12/2019 | DEVOLUCIÓN DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA LAS LOCALIDADES (USAQUÉN, SANTA FE Y LA CANDELARIA). | P136-UTBASC-00454-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 24 | 11/12/2019 | APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA LAS LOCALIDADES (USAQUÉN, SANTA FE Y LA CANDELARIA). | P136-UTBASC-00456-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 25 | 13/01/2020 | APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2019 PARA LA LOCALIDAD SANTA FE. | P136-UTBASC-00568-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 26 | 13/01/2020 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN EL DATACENTER DE BOMBEROS POR PARTE DEL PROVEEDOR UT BOGOTÁ ALCALDÍA | P136-UTBASC-00570-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 27 | 29/01/2020 | SOLICITUD DE ENTREGA INFORMES FINALES DE CADA FDL A CARGO DEL PROVEEDOR UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA. | P136-UTBASC-00627-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 28 | 3/02/2020 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LOS PENDIENTES INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN EL DATACENTER DE BOMBEROS POR PARTE DEL PROVEEDOR UTBASC | P136-UTBASC-00640-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 29 | 17/02/2020 | NOTIFICACIÓN CAMBIO DE NÚMERO DE OFICINA CONSORCIO. | P136-UTBASC-00688-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 30 | 27/02/2020 | APROBACIÓN DE INFORMES FINALES PARA LAS 6 LOCALIDADES A CARGO DEL PROVEEDOR UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA. | P136-UTBASC-00725-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 31 | 06/03/2020 | REMISIONES PARAFISCALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020. | P136-UTBASC-00748-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| 32 | 24/03/2020 | RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA | P136-UTBASC-00811-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |

Tabla 133. Comunicaciones Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana.

4.3 ESTADO GENERAL FINANCIERO

| DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) |
|---------------------------------|-----------------|------|
| VALOR DEL CONTRATO IVA INCLUIDO | \$4.096.185.035 | 100% |
| VALOR FACTURADO | \$4.011.099.063 | 98% |
| VALOR LIBERADO POR CADA FONDO* | \$85.085.972.77 | 2% |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$0 | 0% |

Tabla 134. Valor a corte del 31 de diciembre 2019.

4.4 SEGUIMIENTO JURÍDICO

4.4.1 Estado legal del contrato.

La presente relación da cuenta del estado legal del contrato al 30 de julio de 2020.

| INFORMACIÓN CONTRACTUAL | |
|-------------------------|---|
| No. Contrato | CCE-601-1-AG-2017 |
| Tipo de Contrato | Contratación de bienes y servicios - Instrumento de Agregación de Demanda |
| Nombre Contratista | Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana |
| Fecha de Contrato | 23-nov-2017 |
| Fecha Acta de Inicio | 12-mar-2018 |
| Valor del Contrato | \$3.113.950.350.77 |
| Objeto Contractual | (i) Las condiciones para la adquisición del Sistema de Video-vigilancia ciudadana al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda y la entrega del Sistema de Video-vigilancia ciudadana por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Instrumento de Agregación de Demanda y adquieren el Sistema de Video-vigilancia ciudadana; y (iii) las condiciones para el pago del Sistema de Video-vigilancia ciudadana por parte de las Entidades Compradoras. |
| Entidades | FDL Santa fe; FDL Barrios Unidos; FDL Usaquén, FDL Teusaquillo; FDL Antonio Nariño; FDL Candelaria. |
| Plazo de Ejecución | FDL Santa fe: 30 de noviembre de 2019 FDL Barrios Unidos: 27 de mayo de 2019 FDL Teusaquillo: 26 de mayo de 2019 FDL Antonio Nariño: 26 de mayo de 2019 FDL Candelaria: 30 de noviembre de 2019 FDL Usaquén: 03 de diciembre de 2019 |
| Prórrogas | Sin prórrogas |
| Adiciones | Sin adiciones a la fecha |
| Estado Jurídico | En liquidación |

Tabla 135. Estado legal del contrato Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana

A la fecha de elaboración del presente informe de interventoría, no se ha recomendado por parte de la Interventoría, ni el contratista ha solicitado la modificación al contrato antes mencionado en tiempo y en dinero.

4.4.2 Seguimiento A Garantías

En atención a la verificación del cumplimiento de la obligación contractual señalada en la cláusula séptima, literal c en su numeral 5 del contrato de interventoría No. 1020 de 2019, que prescribe:

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
Contrato 1020 de 2019
Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
01/07/2020– 30/07/2020
Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

“(…) 5). Verificar durante la vigencia de los proyectos, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en los contratos. (…)”

La interventoría procedió con la validación jurídica de cada una de las garantías exigidas a los contratistas en el marco de cada uno de los contratos tal como se describe en el capítulo del respectivo contrato, identificando que los amparos constituidos en cada una de las pólizas se ajustan a los términos y condiciones establecidos contractualmente, como en lo contemplado en el libro 2 parte 2 título 1 capítulo 2 de la sección 3 del Decreto 1082 de 2015, así:

| PÓLIZAS - INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 601-1-AG-UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|---------------|-------------|------------------------|---------------|
| GARANTÍAS | ASEGURADORA | No PÓLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO ACTUAL | OBSERVACIONES |
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | JMALUCELLI TRAVELERS | CU 56080 | 23/11/2017 | 23/05/2021 | \$ 535.000.000 | CUMPLE |
| CALIDAD DEL SERVICIO | JMALUCELLI TRAVELERS | CU 56080 | 23/11/2017 | 23/11/2021 | \$ 535.000.000 | CUMPLE |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | JMALUCELLI TRAVELERS | CU 56080 | 23/11/2017 | 23/11/2021 | \$ 535.000.000 | CUMPLE |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | JMALUCELLI TRAVELERS | CU 56080 | 23/11/2017 | 23/11/2023 | \$ 267.500.000 | CUMPLE |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | JMALUCELLI TRAVELERS | RCE 56078 | 6/12/2019 | 23/11/2020 | \$ 36.885.850 | CUMPLE |

Tabla 136. Pólizas - Instrumento de agregación de demanda 601 - Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana.

4.5 SEGUIMIENTO TÉCNICO

Para el mes de julio del 2020, se realizó el seguimiento a las actividades de orden técnico ejecutadas por el proveedor UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA, correspondiente al acompañamiento de las mismas durante la ejecución del contrato 1020 de 2019, desprendiéndose los resultados generales que se enuncian a continuación:

| LOCALIDAD | PUN TOS | GABI NETE | CA JA | ACOM ETIDA | SP T | ENERG IZACIÓ N | UPS | CÁMA RA Y BRAZO | PEM | C4 | % EJECUCI ÓN | TERMINADA 100% ENTREGADA A LA SDSCJ |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------|
| ANTONIO NARIÑO | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| BARRIOS UNIDOS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| CANDELARIA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| SANTA FE | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 99,74% | EN PROCESO DE RECIBO |
| TEUSAQUILLO | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| USAQUÉN | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 100,00% | ENTREGADO 100% |
| SUMA TOTAL | 184 | 184 | 184 | 184 | 183 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 99,95% | |

Tabla 137. Avance técnico general - Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana.

Temas Relevantes en Antonio Nariño

Se encuentra pendiente el pago de las facturas 3 y 4 del FDL Antonio Nariño, se encuentra en proceso interno del FDL.

Temas Relevantes en Santa fe

Se realizó el traslado del poste para mitigar el riesgo que se puede presentar, en cuanto al desplome o posible colapso del poste,



Evidencia de antes del traslado

Evidencia después del traslado

Ilustración 1. Evidencia Fotografica del traslado poste CCEL04_011

4.6 RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFORMES DEL CONTRATISTA

El Consorcio SMARTY-SCAIN 2019, Informa que los informes finales de las 6 localidades asignadas al proveedor, fueron aprobados con el consecutivo **P136-UTBASC-00725-2020**. El día 27 de febrero de 2020 con el asunto Aprobación de informes finales para las 6 localidades a cargo del proveedor UT Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana. Se anexa la evidencia del correo electrónico en la matriz de control de mes correspondiente. El Consorcio SMARTY-SCAIN 2019, Informa que fueron verificados los informes finales de las 6 localidades a cargo del proveedor UT BOGOTA ALCALDIAS CIUDADANA.

4.7 ANÁLISIS DE RIESGOS

| CAUSA | EVENTO | CONSECUENCIA | GESTIÓN INTERVENTORÍA |
|--|---|--|--|
| Debido a la instalación de los SPT que presenten obras de IDU o en zonas de alto riesgo de vandalismo. | Es posible que se retrasen las instalaciones de los SPT y se determine realizar la instalación luego de visualizar en C4. | Lo que ocasionaría que se genere un impacto en el tiempo de ejecución del proyecto. | En conjunto Interventoría y el proveedor Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana, realizarán mesas de trabajo para buscar proyectar la mejor forma de realizar la recepción del SPT faltante de la localidad Santa fe. |
| Debido a que no se dé en los tiempos establecidos el inicio de implementación de un punto de video vigilancia. | Es posible que se configuren la entrega extemporánea de trabajos por parte del proveedor. | Lo que ocasionaría que surjan solicitudes de prórrogas al IAD, retrasando los tiempos inicialmente establecidos. | La interventoría solicita al proveedor el inicio de actividades de implementación donde se tengan los permisos pertinentes para la instalación. |

Tabla 138. Análisis de riesgos - Unión Temporal Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana.

4.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ Entregar a la SDSCJ de los insumos técnicos/administrativos/jurídicos de los derechos de petición en el marco del contrato IAD-CCE-601.
- ✓ Realizar el continuo seguimiento por parte de la interventoría a las garantías del contrato vigentes dispuestas por el Instrumento de Agregación y Demanda.
- ✓ Actualización de la matriz de control a las obligaciones del Contratista, en la cual se delimitaron las obligaciones contractuales del contrato IAD-CCE-601.
- ✓ Se realizó el respectivo traslado del poste el día 17 de julio de 2020 según lo autorizado a menos de 1.5 mts de su punto inicial, se realizaron las debidas adecuaciones por parte de CODENSA y se encuentra en el área de aprovisionamiento de ETB, para dejar el punto operativo, esta pendiente reprogramar la actividad de la instalación del SPT y su respectiva verificación del Sistema de Puesta a Tierra con el proveedor UTBASC para finalizar por completo las actividades de implementación en calle.

5. CONTRATO NO. 756 DE 2019 – CODENSA S.A E.S.P.

El presente capítulo, contiene el resumen de la gestión realizada por el Consorcio Smarty-Scain 2019 (CSS 2019), en desarrollo del seguimiento de las obligaciones del proveedor, y cuyo detalle se encuentra en el anexo “Matriz de Control 756-2019”.

5.1 FICHA TÉCNICA

| A. INFORMACIÓN GENERAL | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| NIT. | 830.037.248-0 | | |
| RAZÓN SOCIAL | ENEL-CODENSA. S.A. ESP. | | |
| CIUDAD | BOGOTÁ D.C. | | |
| DIRECCIÓN | CRA. 13A No. 93-66 | | |
| TELÉFONO | (57) (1) 6016060 | | |
| I. DATOS DEL CONTRATO | | | |
| CONTRATO No. | 756-2019 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 12/03/2019 |
| FECHA ACTA DE INICIO CONTRATO | 18/03/2019 | FECHA DE TERMINACIÓN | 06/07/2020 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 5.020.613.340 incluido IVA del 19% | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | \$ 5.603.362.790 incluido IVA del 19% |
| OBJETO | Contratar la conexión eléctrica y mantenimiento eléctrico de los puntos de videovigilancia que determine la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en las veinte (20) localidades del distrito capital para el sistema de videovigilancia pública de la ciudad, acorde con las disposiciones del reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y demás normas aplicables. | | |
| ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA | 07/09/2019 | | |
| II. Modificación N° 01 | | | |
| PRORROGA | 3 meses y 23 Días | FECHA FINAL | 17/09/2019 |
| ADICION | \$ 0 | VALOR TOTAL | \$ 5.020.613.340 |
| III. Modificación N° 02 | | | |
| PRORROGA | 2 meses y 27 Días | FECHA FINAL | 10/01/2020 |
| ADICION | \$ 0 | VALOR TOTAL | \$ 5.020.613.340 |
| IV. Modificación N° 03 | | | |
| PRORROGA | 3 meses y 0 Días | FECHA FINAL | 06/07/2020 |
| ADICION | \$ 582.749.450 | VALOR TOTAL | \$ 5.603.362.790 |
| V. Modificación N° 04 | | | |
| PRORROGA | 0 meses y 24 Días | FECHA FINAL | 30/07/2020 |
| ADICION | \$ 0 | VALOR TOTAL | \$ 5.603.362.790 |
| PLAZO EJECUCION TOTAL | 16 meses y 13 Días | | |
| OBJETO | Interventoría administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica y ambiental, para los proyectos del sistema de videovigilancia de Bogotá | | |
| FECHA FIRMA ACTA DE INICIO | 18/03/2019 | | |
| VI. DATOS DEL CONTRATISTA | | | |
| NOMBRE CONTACTO | ROL | CORREO ELECTRÓNICO | |
| David Ávila Charry | Supervisor Contrato | david.avila@enel.com | |
| B. ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) |
| 1 | Valor inicial del Contrato | \$ 5.020.613.340 | 90% |
| 2 | Valor adición No.1 | \$ 582.749.450 | 10% |
| 3 | Valor actual del Contrato | \$ 5.603.362.790 | 100% |
| 4 | Valor Facturado | \$ 5.087.892.881 | 91% |
| 5 | Valor liberado a los fondos de la SDSCJ | \$ 328.786.492 | 6% |
| 6 | Valor pendiente por ejecutar | \$ 186.683.417 | 3% |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| I. GARANTÍAS DEL CONTRATO | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------|--------------------------|
| ASEGURADO RA | No. DE PÓLIZA | TIPO DE AMPARO | VALOR | PERÍODO DE COBERTURA |
| SEGUROS GENERARES SURAMERICA NA S.A. | 2323843-6 | Cumplimiento del Contrato | \$ 1.120.672.558,00 | 18/03/2019 A 30/01/2021 |
| | 2323843-6 | Pago Salario y Prestaciones Sociales | \$ 280.168.139,50 | 18/03/2019 A 30/07/2023 |
| | 2323843-6 | Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | \$ 1.120.672.558,00 | 30/07/2020 A 30/07/2022 |
| | 2323843-6 | Calidad del servicio | \$ 1.120.672.558,00 | 30/07/2020 A 30/07/2022 |
| | 617694-0 | Responsabilidad civil Extracontractual | \$ 438.901.500,00 | 18/03//2019 A 30/07/2020 |

Tabla 139. Ficha Técnica – CODENSA

A la fecha de elaboración del presente informe de interventoría, se realizó la suscripción de la modificación No. 04 con la cual se logra dar continuidad al objeto del Contrato 756 de 2019 y a su vez dar solución a las fallas eléctricas que se presentan en el sistema de videovigilancia de la ciudad de Bogotá D.C.

5.2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Una vez comienza la vigencia del modificatorio No.4, con el cual se prórroga el tiempo de ejecución del contrato 756 de 2019 en veinticuatro (24) días, estableciendo la nueva fecha de finalización del contrato el 30 de julio de 2020, y aún con recursos para ejecutar más actividades por valor de ciento ochenta y seis millones seiscientos ochenta y tres mil cuatrocientos dieciséis pesos M/CTE (\$ 186.683.416). En la tabla No. 140, se aprecia la distribución para agotar los recursos disponibles del presupuesto, proyectados hasta el 30 de julio del año en curso.

| ÍTEM | PERIODO ACTIVIDADES | CORTE FACTURACIÓN 2020 | VALOR PROYECTADO |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 30 MAYO AL 30 DE JUNIO 2020 (*) | FACTURA No.13 | \$ 197.024.369 |
| 2 | 01 AL 30 DE JULIO 2020 | FACTURA No.14 | \$ 186.683.416 |
| TOTAL (IVA INCLUIDO) | | | \$ 383.707.785 |

Tabla 140. Estado financiero del contrato 756 de 2019 al 30 de junio de 2020

(*) Para la fecha del presente informe, la factura No.13 en proceso de autorización del pagó por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

5.2.1 Actas de reunión seguimiento

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. ACTA |
|-----|------------|---|----------|
| 1 | 24/09/2019 | PRESENTACIÓN FORMAL DE LA NUEVA INTERVENTORÍA Y DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 001 |
| 2 | 02/10/2019 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN DIARIA Y FORMA DE ENTREGARLA A LA INTERVENTORÍA PARA LA CELERIDAD Y CONTROL DEL PROYECTO. | 002 |
| 3 | 09/10/2019 | HALLAZGOS EN EL PMT (SEÑALIZACIÓN) EN CAMPO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE SSTA CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | 003 |
| 4 | 16/10/2019 | SOLUCIÓN PARA LAS TAPAS ESPECIALES PARA REPOSICIÓN POR VANDALISMO | 004 |
| 5 | 23/10/2019 | ESTADO DEL CONTRATO IAD 601 DE 2017 PENDIENTES DEL CONTRATO 756 DE 2019DISPONIBILIDAD DE CUADRILLAS EN CAMPO 27 DE OCTUBRE DE 2019 Y ATENCIÓN DE PUNTOS DE CÁMARA PRIORITARIOS. | 005 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. ACTA |
|-----|------------|---|----------|
| 6 | 30/10/2019 | ESTADO DEL CONTRATO IAD 601 DE 2017, PENDIENTES DEL CONTRATO 756 DE 2019 CONCILIACIÓN FACTURACIÓN SEPTIEMBRE – OCTUBRE DE 2019 | 006 |
| 7 | 06/11/2019 | ENTREGA OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTA INTERVENTORÍA SOLICITE Y EN LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS PARA TAL FIN | 007 |
| 8 | 13/11/2019 | SOLICITUD FORMAL A CODENSA EN LA PRIORIDAD PARA LOS PUNTOS DE CÁMARA ASOCIADOS AL PROYECTO 732 DE 2017 | 008 |
| 9 | 20/11/2019 | ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 009 |
| 10 | 27/11/2019 | CONCILIACIÓN FACTURACIÓN NOVIEMBRE DE 2019 | 010 |
| 11 | 04/12/2019 | ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 011 |
| 12 | 11/12/2019 | INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA INTERVENTORÍA | 012 |
| 13 | 18/12/2019 | ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 | 013 |
| 14 | 27/12/2019 | CONCILIACIÓN FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2019 | 014 |
| 15 | 02/01/2020 | ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR AL 02 DE ENERO DE 2020 | 015 |
| 16 | 09/01/2020 | ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR AL 09 DE ENERO DE 2020 | 016 |
| 17 | 15/01/2020 | ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR AL 15 DE ENERO DE 2020 | 017 |
| 18 | 23/01/2020 | ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR AL 23 DE ENERO DE 2020 | 018 |
| 19 | 30/01/2020 | CONCILIACIÓN FACTURA MES DE ENERO DE 2020 | 019 |
| 20 | 06/02/2020 | EJECUCION DE ACTIVIDADES ASIGNADAS POR GARANTÍA DE OBRAS CIVIL | 020 |
| 21 | 13/02/2020 | HALLAZGOS EN EL PMT (SEÑALIZACIÓN) EN CAMPO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE SST-A CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019. | 021 |
| 22 | 20/02/2020 | ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR AL 20 DE FEBRERO DE 2020 | 022 |
| 23 | 27/02/2020 | PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 756 DE 2019 POR PARTE DEL CONTRATISTA CODENSA S.A E.S.P. | 023 |
| 24 | 05/03/2020 | GARANTÍAS EN LOS ACABADOS Y ESTRUCTURAS DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN CS274 PARA DAR RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | 024 |
| 25 | 10/03/2020 | SOCIALIZACIÓN DEL NUEVO EQUIPO DE SUPERVISIÓN PARA EL CONTRATO 756 DE 2017 POR PARTE DE CODENSA S.A E.S.P. Y ESINCO | 025 |
| 26 | 19/03/2020 | PLAN DE ACCIÓN PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19. | 026 |
| 27 | 26/03/2020 | AJUSTE AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES EN CAMPO. | 027 |
| 28 | 02/04/2020 | PLAN DE ACCIÓN PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19. | 028 |
| 29 | 08/04/2020 | ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR AL 08 DE ABRIL DE 2020. | 029 |
| 30 | 16/04/2020 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CODENSA S.A E.S.P. | 030 |
| 31 | 23/04/2020 | PROPUESTA TÉCNICA TAPAS ESPECIALES Y COTIZACIÓN ACTIVIDADES PARA CÁMAR AL1716 | 031 |
| 32 | 30/04/2020 | AJUSTES AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES EN CAMPO | 032 |
| 33 | 07/05/2020 | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL MES DE MAYO DE 2020 | 033 |
| 34 | 13/05/2020 | AVANCE GENERAL DEL CONTRATO 756 DE 2019 | 034 |
| 35 | 20/05/2020 | ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR AL 20 DE MAYO DE 2020 | 035 |
| 36 | 27/05/2020 | CUMPLIMIENTOS COMPROMISOS ACTA DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 35 | 036 |
| 37 | 03/06/2020 | SOLICITUD DE PRÓRROGA POR 30 DIAS | 037 |
| 38 | 10/06/2020 | PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA INSTALACIÓN DE TAPAS ESPECIALES CAJA DE INSPECCIÓN CS274. | 038 |
| 39 | 18/06/2020 | ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | 039 |
| 40 | 25/06/2020 | LECTURA DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO 756 DE 2019 | 040 |
| 41 | 02/07/2020 | ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR AL 01 DE JULIO DE 2020 | 041 |
| 42 | 08/07/2020 | AJUSTE AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES EN CAMPO PROYECTADO A CIERRE DEL CONTRATO 756 DE 2019. | 042 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. ACTA |
|-----|------------|--|----------|
| 43 | 15/07/2020 | ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 756 DE 2019. | 043 |
| 44 | 23/07/2020 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DOCUMENTALES PARA EL CIERRE DEL CONTRATO 756 DE 2019 AL 23 DE JULIO DE 2020. | 044 |
| 45 | 30/07/2020 | CRONOGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE PARA EL CONTRATO 756 DE 2019. | 045 |

Tabla 141. Actas de reunión seguimiento CODENSA.

5.2.2 Comunicaciones

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 20/09/2019 | RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FALLAS ATRIBUIBLES A CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 2 | 24/09/2019 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00062-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A E.S.P |
| 3 | 25/09/2019 | REITERACIÓN DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIÓN DE EMPALME CON SMARTY-SCAIN 2019 | P136-CODENSA-00069-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A E.S.P |
| 4 | 25/09/2019 | EJECUCIÓN AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 5 | 25/09/2019 | ESPECIFICACIONES TAPAS ANTIVANDÁLICAS PROYECTO SECRETARIA DE SEGURIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 6 | 25/09/2019 | INFORME HASTA 04 SEPTIEMBRE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 7 | 25/09/2019 | PROGRAMACIÓN 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 8 | 25/09/2019 | SOLICITUDES SIN CONCILIAR SECRETARIA DE SEGURIDAD CÁMARAS | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 9 | 25/09/2019 | P136-CODENSA-00069-2019 REITERACIÓN DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIÓN DE EMPALME CON SMARTY-SCAIN 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 10 | 26/09/2019 | SCJPROYECTO ALCALDIAS 1673 CAMARAS ESTADO DE AVANCE CORTE 25/09/2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 11 | 26/09/2019 | PROGRAMACIÓN 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 12 | 26/09/2019 | P136-CODENSA-00069-2019 REITERACIÓN DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIÓN DE EMPALME CON SMARTY-SCAIN 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 13 | 26/09/2019 | EJECUCIÓN AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 14 | 26/09/2019 | PROGRAMACIÓN 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 15 | 27/09/2019 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00086-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 16 | 27/09/2019 | EJECUCIÓN AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 17 | 27/09/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA126 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 18 | 27/09/2019 | PAC OCTUBRE Y NOVIEMBRE | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 19 | 27/09/2019 | PROGRAMACIÓN 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | 28/09/2019 | VISITA CONJUNTA SAN CRISTÓBAL MÁRTIRES | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 21 | 28/09/2019 | RV: PÓLIZAS CÁMARAS-SECRETARIA DE SEGURIDAD PRORROGA CONTRATO 756 SECRETARIA DE SEGURIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 22 | 29/09/2019 | RE: PROGRAMACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 23 | 30/09/2019 | PUNTO DE SANTA FE SIN ENERGIZACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 24 | 30/09/2019 | EJECUCIÓN AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 25 | 30/09/2019 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00096-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 26 | 30/09/2019 | RE: PROGRAMACIÓN 01 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 27 | 30/09/2019 | HURTO SPT Y CAJAS DE INSPECCIÓN QUE FUERON OBJETO DE VANDALISMO | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 28 | 1/10/2019 | FWD_ SUBA AL2595 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 29 | 1/10/2019 | TAPA VANDALIZADA PUNTO MB64 USAQUÉN | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 30 | 1/10/2019 | EJECUCIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 31 | 2/10/2019 | RE_ PROGRAMACIÓN 03 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 32 | 2/10/2019 | ACTA APERTURA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 33 | 2/10/2019 | EJECUCIÓN AL 01 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 34 | 2/10/2019 | PROGRAMACIÓN 02 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 35 | 2/10/2019 | AUTORIZACIÓN CANALIZACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 36 | 2/10/2019 | PROGRAMACIÓN 03 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 37 | 2/10/2019 | FALLA DEL PUNTO UTMVC-780-CODENSA134 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 38 | 2/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA127 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 39 | 2/10/2019 | UTSMVC-780-CODENSA133 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 40 | 3/10/2019 | PUNTO SINIESTRO DE CANDELARIA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 41 | 3/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA133 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 42 | 3/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA134 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 43 | 3/10/2019 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00117-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 44 | 4/10/2019 | EJECUCIÓN AL 03 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 45 | 4/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA135 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 46 | 4/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA136 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 47 | 4/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA137 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 48 | 5/10/2019 | RE_ PROGRAMACIÓN 05 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 49 | 5/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA138 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 50 | 5/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA139 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 51 | 5/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA141 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 52 | 6/10/2019 | PROGRAMACIÓN 07 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 53 | 6/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA142 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 54 | 7/10/2019 | FWD_ P136-ETB-00130-2019PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB-1 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 55 | 7/10/2019 | FWD_ P136-ETB-00130-2019PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 56 | 7/10/2019 | FWD_ SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y REVISIÓN TÉCNICA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 57 | 7/10/2019 | EJECUCIÓN AL 05 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 58 | 7/10/2019 | OFICIOS RADICADOS POR CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 59 | 7/10/2019 | CITACIÓN A REUNIÓN SSTA (PMT) | P136-CODENSA-00131-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 60 | 8/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA143 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 61 | 8/10/2019 | EJECUCIÓN AL 07 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 62 | 8/10/2019 | PROGRAMACIÓN 08 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 63 | 8/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA144 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 64 | 9/10/2019 | EJECUCIÓN AL 08 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 65 | 9/10/2019 | PROGRAMACIÓN 09 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 66 | 9/10/2019 | FWD_ SCJPROYECTO ALCALDIAS 1673 CAMARAS ESTADO DE AVANCE CORTE 08_10_2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 67 | 10/10/2019 | INFORMACIÓN PUNTOS DE CÁMARAS CONTRATO IAD 601-17 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 68 | 10/10/2019 | PROGRAMACIÓN 10 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 69 | 10/10/2019 | INFORMACIÓN PUNTOS DE CÁMARAS CONTRATO IAD 601-17 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 70 | 10/10/2019 | EJECUCIÓN AL 09 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 71 | 10/10/2019 | PROGRAMACIÓN 11 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 72 | 10/10/2019 | FALLA PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA146 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 73 | 11/10/2019 | FWD_RELACIÓN PUNTOS SIN CONDENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 74 | 11/10/2019 | FWD_SCJPROYECTO ALCALDIAS 1673 CAMARAS ESTADO DE AVANCE CORTE 09_10_2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 75 | 11/10/2019 | EJECUCIÓN AL 10 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 76 | 11/10/2019 | FALLA DE ENERGÍA PUNTO DE CÁMARA CCEAD_L7_08BOSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 77 | 11/10/2019 | FWD_SCJPROYECTO ALCALDIAS 1673 CAMARAS ESTADO DE AVANCE CORTE 10_10_2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 78 | 11/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA145 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 79 | 11/10/2019 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00153-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 80 | 15/10/2019 | EJECUCIÓN AL 12 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 81 | 15/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA150 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 82 | 15/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA149 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 83 | 15/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA148 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 84 | 15/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA147 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 85 | 15/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA146 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 86 | 15/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA145 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 87 | 15/10/2019 | RE_PROGRAMACIÓN 11 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 88 | 15/10/2019 | PROGRAMACIÓN 14 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 89 | 15/10/2019 | CITACIÓN A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | P136-CODENSA-00170-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 90 | 17/10/2019 | EJECUCIÓN AL 16 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 91 | 17/10/2019 | PROGRAMACIÓN 16 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 92 | 17/10/2019 | PROGRAMACIÓN 17 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 93 | 17/10/2019 | FWD_SCJPROYECTO ALCALDIAS 1673 CAMARASESTADO DE AVANCE CORTE 11-12_10_2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 94 | 17/10/2019 | FWD_SCJPROYECTO ALCALDIAS 1673 CAMARASESTADO DE AVANCE CORTE 15_10_2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 95 | 17/10/2019 | FWD_SCJPROYECTO ALCALDIAS 1673 CAMARASESTADO DE AVANCE CORTE 16_10_2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 96 | 17/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA151 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 97 | 17/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA152 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 98 | 17/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA153 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 99 | 17/10/2019 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00189-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 100 | 21/10/2019 | PROGRAMACIÓN 18 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 101 | 21/10/2019 | EJECUCIÓN AL 19 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 102 | 21/10/2019 | EJECUCIÓN AL 17 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 103 | 21/10/2019 | PROGRAMACIÓN 19 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 104 | 21/10/2019 | RE_ COMITÉ SEGUIMIENTO CÁMARAS | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 105 | 21/10/2019 | RE_ PROGRAMACIÓN 21 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 106 | 21/10/2019 | RECEPCIÓN TAPAS | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 107 | 21/10/2019 | FWD_ SCJPROYECTO ALCALDIAS 1673 CAMARASESTADO DE AVANCE CORTE 19_10_2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 108 | 21/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA154 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 109 | 21/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA155 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 110 | 21/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA156 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 111 | 21/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA157 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 112 | 21/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA158-2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 113 | 21/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA159-2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 114 | 21/10/2019 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00214-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 115 | 22/10/2019 | DAÑOS CAUSADOS POR GRÚA EN LA LOCALIDAD DE SUBA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 116 | 22/10/2019 | RE_ RECEPCIÓN TAPAS | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 117 | 22/10/2019 | EJECUCIÓN AL 21 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 118 | 22/10/2019 | PROGRAMACIÓN 22 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 119 | 22/10/2019 | FWD_ SCJPROYECTO ALCALDIAS 1673 CAMARASESTADO DE AVANCE CORTE 21_10_2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 120 | 22/10/2019 | FWD_ SCJPROYECTO ALCALDIAS 1673 CAMARASESTADO DE AVANCE CORTE 17_10_2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 121 | 22/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA160-2021 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 122 | 22/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA161-2022 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 123 | 22/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA162-2023 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 124 | 22/10/2019 | AVANCE PROCESO DE FACTURACIÓN CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00219-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 125 | 23/10/2019 | DISPONIBILIDAD 27 DE OCTUBRE | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 126 | 23/10/2019 | DISPONIBILIDAD DE CUADRILLA TÉCNICA PARA ATENDER IMPREVISTOS DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2019 | P136-CODENSA-00224-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 127 | 24/10/2019 | FWD_ PÓLIZAS MODIFICACIÓN 1 CONTRATO 756-2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 128 | 24/10/2019 | PROGRAMACIÓN 23 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 129 | 24/10/2019 | EJECUCIÓN AL 22 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 130 | 24/10/2019 | PROGRAMACIÓN 24 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 131 | 24/10/2019 | FWD_ SCJPROYECTO ALCALDIAS 1673 CAMARASESTADO DE AVANCE CORTE 22_10_2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 132 | 24/10/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA163-2024 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 133 | 24/10/2019 | RE_ ACTA DE REUNIÓN CÁMARAS | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 134 | 25/10/2019 | HECHOS PRESENTADOS EN EL PUNTO CCEL11_156 | P136-SSCJ-00240-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 135 | 28/10/2019 | RE_ EJECUCIÓN AL 22 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 136 | 28/10/2019 | EJECUCIÓN AL 24 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 137 | 28/10/2019 | PROGRAMACIÓN 29 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 138 | 28/10/2019 | PUNTOS SIN ATENDER | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 139 | 28/10/2019 | RE_ ACTA DE REUNIÓN CÁMARAS | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 140 | 28/10/2019 | PROGRAMACIÓN 26 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 141 | 28/10/2019 | PROGRAMACIÓN 28 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 142 | 28/10/2019 | EJECUCIÓN AL 26 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 143 | 28/10/2019 | FWD_ SCJPROYECTO ALCALDIAS 1673 CAMARASESTADO DE AVANCE CORTE 25_10_2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 144 | 28/10/2019 | FWD_ SCJPROYECTO ALCALDIAS 1673 CAMARASESTADO DE AVANCE CORTE 07_10_2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 145 | 28/10/2019 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00248-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 146 | 28/10/2019 | SOLICITUD INFORMACIÓN SSTAINFRAESTRUCTURA SEGURA DEL PESV | P136-CODENSA-00249-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 147 | 29/10/2019 | FWD_DESPRENDIMIENTO DE PLAQUETAS ANDEN PUNTO AL2319 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 148 | 31/10/2019 | P136-MEBOG-00271-2019.-VISITAS DE SITE SURVEY PARA 12 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA PROYECTO FVS | P136-MEBOG-00271-2019. | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 149 | 31/10/2019 | EJECUCIÓN AL 30 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 150 | 31/10/2019 | RE_CONCILIACIÓN CÁMARAS 1 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 151 | 31/10/2019 | EJECUCIÓN AL 28 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 152 | 31/10/2019 | RE_PROGRAMACIÓN 30 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 153 | 31/10/2019 | EJECUCIÓN AL 29 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 154 | 31/10/2019 | PROGRAMACIÓN 31 DE OCTUBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 155 | 31/10/2019 | P136-MEBOG-00271-2019.-VISITAS DE SITE SURVEY PARA 12 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA PROYECTO FVS | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 156 | 31/10/2019 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00272-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 157 | 1/11/2019 | PROGRAMACIÓN 02 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | IAD 601-17 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 158 | 1/11/2019 | P136-CODENSA-00278-2019 ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00278-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 159 | 1/11/2019 | VISITA CONJUNTA CODENSA UTMVC AL PUNTO SCJ17FJ0005 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 160 | 3/11/2019 | PROGRAMACIÓN 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 161 | 5/11/2019 | PROGRAMACIÓN 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 162 | 5/11/2019 | INFORMACIÓN SOBRE PUNTOS FALLIDOS ENVIADOS POR ETB | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 163 | 5/11/2019 | ESTADO CONTRATO 756 DE 2019 CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 164 | 6/11/2019 | FWD_ACOMETIDA ELÉCTRICA AL2595 | CORREO ELECTRÓNICO | IAD 601-17 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 165 | 6/11/2019 | ACTA DE CONCILIACIÓN NO. 6 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 166 | 6/11/2019 | AVANCE DE ACTIVIDADES PROYECTO SDSCJ | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 167 | 6/11/2019 | EJECUCIÓN AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | ETB | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 168 | 6/11/2019 | PROGRAMACIÓN 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 169 | 6/11/2019 | ACTA DE CONCILIACIÓN NO. 6 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 170 | 6/11/2019 | ACTA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO NO.7 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 171 | 6/11/2019 | REVISIÓN INFORME TÉCNICO CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 172 | 6/11/2019 | REVISIÓN INFORME TÉCNICO CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 173 | 7/11/2019 | EJECUCIÓN AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 174 | 7/11/2019 | PROGRAMACIÓN 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 175 | 7/11/2019 | FWD_ SCJPROYECTO ALCALDIAS 1673 CAMARASESTADO DE AVANCE CORTE 06_11_2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 176 | 8/11/2019 | CÁMARA CÓDIGO FVS-1202 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 177 | 8/11/2019 | CÁMARA CÓDIGO SCJ17E100118 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 178 | 8/11/2019 | EJECUCIÓN AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 179 | 12/11/2019 | EJECUCIÓN AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 180 | 12/11/2019 | PROGRAMACIÓN 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 181 | 12/11/2019 | P136-CODENSA-00302-SOLICITUD RECONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS274 | P136-CODENSA-00302-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 182 | 12/11/2019 | P136-SSCJ-00303-2019-ESTADO DETALLADO DEL CONTRATO 756 DE 2019 CON CORTE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019 | P136-SSCJ-00303-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 183 | 13/11/2019 | EJECUCIÓN AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 184 | 13/11/2019 | PROGRAMACIÓN 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 185 | 13/11/2019 | FWD_ GARANTÍA DE CAJA CS-274 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 186 | 13/11/2019 | P136-CODENSA-00315-2019 ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00315-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 187 | 14/11/2019 | EJECUCIÓN AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 188 | 14/11/2019 | PROGRAMACIÓN 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | ETB | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 189 | 14/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA181 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 190 | 14/11/2019 | PUNTOS DE CÁMARA REPORTADOS POR SOPORTE TÉCNICO | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 191 | 15/11/2019 | PROGRAMACIÓN 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 192 | 15/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA182 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 193 | 15/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA183 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 194 | 15/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA185 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 195 | 15/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA182 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 196 | 15/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA184 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 197 | 15/11/2019 | PLAZOLETA DEL CONSEJO DE BOGOTÁ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 198 | 16/11/2019 | PUNTOS CON AFECTACIÓN EN LA CINTA DE CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 199 | 17/11/2019 | PROGRAMACIÓN 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 200 | 17/11/2019 | FWD_ GARANTÍA DE CAJA CS-274 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 201 | 18/11/2019 | PROGRAMACIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | IAD 601-17 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 202 | 18/11/2019 | PUNTOS DE CÁMARA REPORTADOS POR SOPORTE TÉCNICO | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 203 | 18/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA181 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 204 | 18/11/2019 | P136-CODENSA-00327-2019 ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | P136-CODENSA-00327-2019 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 205 | 18/11/2019 | PUNTOS CON AFECTACIÓN EN LA CINTA DE CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 206 | 18/11/2019 | SOLICITUD PAC PARA LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 207 | 19/11/2019 | EJECUCIÓN AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 208 | 19/11/2019 | PROGRAMACIÓN 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 209 | 19/11/2019 | RE_ SOLICITUD PAC PARA LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 210 | 19/11/2019 | TAPAS CS274 MANTENIMIENTOS | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 211 | 19/11/2019 | FWD_ SCJPROYECTO ALCALDIAS 1673 CAMARASESTADO DE AVANCE CORTE 18_11_2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 212 | 20/11/2019 | CRONOGRAMAS | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 213 | 20/11/2019 | P136-SSCJ-00353-2019SOLICITUD DE TRÁMITE DE PERMISOS DE INGRESO PARTE EXTERNA BANCO REPÚBLICA | P136-SSCJ-00353-2019 | IAD 601-17 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 214 | 21/11/2019 | EJECUCIÓN AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 215 | 21/11/2019 | PROGRAMACIÓN 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 216 | 21/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA191 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 217 | 21/11/2019 | REVISIÓN CARPETAS PRECONCILIACION # 2 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 218 | 22/11/2019 | PROGRAMACIÓN 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 219 | 24/11/2019 | PROGRAMACIÓN 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 220 | 24/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA164 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 221 | 25/11/2019 | EJECUCIÓN AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 222 | 25/11/2019 | PROGRAMACIÓN 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 223 | 25/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA194 -2019 NOV | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 224 | 25/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA194 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 225 | 25/11/2019 | TRAZABILIDAD PUNTO DE CÁMARA ALB90 \$ 45 MILLONES | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 226 | 26/11/2019 | REPORTE GARANTÍAS CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | IAD 601-17 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 227 | 26/11/2019 | EJECUCIÓN AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 228 | 26/11/2019 | FACTURACIÓN CORTE #6 CODENSA SDSCJ CÁMARAS | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 229 | 26/11/2019 | PROGRAMACIÓN 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 230 | 26/11/2019 | RV_ ENTREGA 008 CAMARAS INVITACIÓN PARA COLABORAR | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 231 | 26/11/2019 | RV_ PRECIO TAPA NORMAL CAJA CS274 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 232 | 26/11/2019 | PUNTOS DE CÁMARA REPORTADOS POR SOPORTE TÉCNICO1 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 233 | 27/11/2019 | CONCILIACIÓN CON LOCALIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 234 | 27/11/2019 | MANTENIMIENTOS PENDIENTES | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 235 | 27/11/2019 | PROGRAMACIÓN 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 236 | 27/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA200 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 237 | 27/11/2019 | SOLICITUD APROVISIONAMIENTO CODENSA PTO. SCJ17E130054_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 238 | 27/11/2019 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 239 | 27/11/2019 | SOLICITUD APROVISIONAMIENTO CODENSA PTO. SCJ17E130054_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 240 | 28/11/2019 | RE_ SOLICITUD DE INFORMACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | IAD 601-17 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 241 | 28/11/2019 | EJECUCIÓN AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 242 | 28/11/2019 | PROGRAMACIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 243 | 28/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA201 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 244 | 28/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA202 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 245 | 28/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA203 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 246 | 28/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA204 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 247 | 28/11/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA205 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 248 | 28/11/2019 | PUNTOS DE CÁMARA REPORTADOS POR SOPORTE TÉCNICO NOV | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 249 | 28/11/2019 | VISITA CONJUNTA CODENSA UTMVC AL PUNTO SCJ17FJ0005_1 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 250 | 28/11/2019 | ACTIVIDADES PENDIENTES DE MANTENIMIENTO | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 251 | 28/11/2019 | LEVANTAMIENTOS | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 252 | 28/11/2019 | RESUMEN FACTURACIÓN CONTRATO 583 DE 2017 CONSORCIO S3 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 253 | 29/11/2019 | EJECUCIÓN AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 254 | 29/11/2019 | RV_ ENTREGA 001 CAMARAS INVITACIÓN PARA COLABORAR | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 255 | 29/11/2019 | RV_ ENTREGA 005 CÁMARAS INVITACIÓN PARA COLABORAR | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 256 | 29/11/2019 | ACTA DE ACEPTACIÓN DEL INFORME MENSUAL | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 257 | 29/11/2019 | SOLICITUD SSTA OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 258 | 30/11/2019 | RE_ SOLICITUD DE INFORMACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 259 | 2/12/2019 | EJECUCIÓN AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 260 | 2/12/2019 | PROGRAMACIÓN 02 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 261 | 2/12/2019 | PROGRAMACIÓN 03 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 262 | 2/12/2019 | PUNTOS DE CÁMARA REPORTADOS POR SOPORTE TÉCNICO.1M | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 263 | 2/12/2019 | MODIFICATORIO NO. 2 CONTRATO 756 DE 2019 (DEVOLUCIÓN DE DINERO CRP CONEXIONES) | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 264 | 3/12/2019 | PROGRAMACIÓN 04 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 265 | 3/12/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA210 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 266 | 3/12/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA211 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 267 | 3/12/2019 | PUNTOS DE CÁMARA REPORTADOS POR SOPORTE TÉCNICO.1 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 268 | 4/12/2019 | ACTA DE CONCILIACIÓN NO.7 CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 269 | 4/12/2019 | EJECUCIÓN AL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 270 | 4/12/2019 | FACTURACIÓN CORTE NO.6 CODENSA SDSCJ CÁMARAS | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 271 | 4/12/2019 | PROGRAMACIÓN 05 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 272 | 4/12/2019 | REPORTE DE ESCALAMIENTO 4_12_2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 273 | 4/12/2019 | RV_ ENTREGA 7 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 274 | 4/12/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA212 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 275 | 4/12/2019 | PUNTOS DE CÁMARA PENDIENTES POR ATENDER_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 276 | 4/12/2019 | P136-SSCJ-00417-2019. ACTA ACLARATORIA ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019_1 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|-----------|--|---|---|-------------------|
| 277 | 4/12/2019 | P136-SSCJ-00417-2019. ACTA ACLARATORIA ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 278 | 4/12/2019 | ACTA ACLARATORIA ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 279 | 5/12/2019 | ACTA DE CONCILIACIÓN CORTE 7 ENEL CONTRATO 756 DE 2019OP 142682 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 280 | 5/12/2019 | EJECUCIÓN AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 281 | 5/12/2019 | PROGRAMACIÓN 06 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 282 | 5/12/2019 | PUNTOS DE CÁMARA REPORTADOS POR SOPORTE TÉCNICO | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 283 | 5/12/2019 | UTSMVC-780-CODENSA213 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 284 | 5/12/2019 | UTSMVC-780-CODENSA214 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 285 | 5/12/2019 | UTSMVC-780-CODENSA215 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 286 | 5/12/2019 | RV_ REMITO OFICIO | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 287 | 5/12/2019 | SOLICITUD INFORMACIÓN CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 288 | 5/12/2019 | FWD_ SOLICITUD DE REVISIÓN EN LA LOCALIDAD DE BOSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 289 | 5/12/2019 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 290 | 5/12/2019 | OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA SOPORTES DIGITALES DE LAS ENTREGAS 05 AL 08 | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 291 | 6/12/2019 | EJECUCIÓN AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 292 | 6/12/2019 | FWD_ SOLICITUD DE REVISIÓN EN LA LOCALIDAD DE BOSA | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 293 | 6/12/2019 | RE_ ENTREGA 7 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 294 | 7/12/2019 | ACTA DE CONCILIACIÓN CORTE 7 ENEL CONTRATO 756 DE 2019OP 142682 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 295 | 7/12/2019 | SOLICITUD INFORMACIÓN CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 296 | 9/12/2019 | EJECUCIÓN AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 297 | 9/12/2019 | INFORME NOVIEMBRE 2019 CORTE #2 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|---|---|-------------------|
| 298 | 9/12/2019 | PROGRAMACIÓN 09 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 299 | 9/12/2019 | PROGRAMACIÓN 10 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 300 | 9/12/2019 | P136-SSCJ-00445-2019. INFORMACIÓN VENCIMIENTO DEL CONTRATO 756 DE 2019_1 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 301 | 9/12/2019 | ACTA SEGUIMIENTO NO. 11 04-DIC-2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 302 | 9/12/2019 | CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NÚMERO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 303 | 9/12/2019 | INFORME NOVIEMBRE 2019 CORTE #2 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 304 | 9/12/2019 | P136-SSCJ-00445-2019. INFORMACIÓN VENCIMIENTO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 305 | 9/12/2019 | CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NÚMERO 756 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGU | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 306 | 9/12/2019 | SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA EL CONTRATO 756 DE 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 307 | 10/12/2019 | EJECUCIÓN AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 308 | 10/12/2019 | PROGRAMACIÓN 11 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 309 | 10/12/2019 | RV_ INFORME NOVIEMBRE 2019 CORTE #2 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 310 | 10/12/2019 | COSTOS ASOCIADOS A CAMBIO DE RED | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 311 | 10/12/2019 | PUNTOS DE MANTENIMIENTOS SIN ATENDER | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 312 | 10/12/2019 | INFORME MENSUAL CODENSA PARA REVISIÓN PARTE SSTA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 313 | 10/12/2019 | OBSERVACIONES ACTA DE CONCILIACIÓN NO. 7 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 314 | 11/12/2019 | CRONOGRAMAS | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 315 | 11/12/2019 | EJECUCIÓN AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 316 | 11/12/2019 | OBSERVACIONES ACTA DE CONCILIACIÓN NO. 7 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|---|---|-------------------|
| 317 | 11/12/2019 | PROGRAMACIÓN 12 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 318 | 11/12/2019 | RV_ INFORME NOVIEMBRE 2019 CORTE #2 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 319 | 11/12/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA218 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 320 | 12/12/2019 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA219 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 321 | 12/12/2019 | OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA SOPORTES DIGITALES DE LAS ENTREGAS 05 AL 08 | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 322 | 13/12/2019 | EJECUCIÓN AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 323 | 13/12/2019 | P136-ETB-00458-2019VISITA DE SITE SURVEY_ PROYECCIÓN TRASLADO DE 2 PUNTOS DE CÁMARA_ | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 324 | 13/12/2019 | PROGRAMACIÓN 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 325 | 16/12/2019 | EJECUCIÓN AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 326 | 16/12/2019 | RE_ PROGRAMACIÓN 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 327 | 16/12/2019 | RV_ SOLICITUD DE INFORMACIÓN TIC | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 328 | 17/12/2019 | PROGRAMACIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 329 | 17/12/2019 | VISITA CONJUNTA DE 1 PUNTO DE CÁMARAS DEL PROYECTO ALCALDÍAS LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 330 | 17/12/2019 | FORMATO SDSCJ _MODIFICATORIO CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 331 | 18/12/2019 | EJECUCIÓN AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 332 | 18/12/2019 | PROGRAMACIÓN 19 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 333 | 18/12/2019 | VISITA CONJUNTA CODENSA SCJ17E140024 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 334 | 18/12/2019 | P136-CODENSA-00486-2019. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 335 | 18/12/2019 | RV_ INFORME NOVIEMBRE 2019 CORTE #2 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 336 | 18/12/2019 | VISITA CONJUNTA CODENSA SCJ17E140024 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 337 | 18/12/2019 | ALCANCE AL OFICIO NO. CSS-P136-00068-2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|---------------------|---|-------------------|
| 338 | 18/12/2019 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 339 | 19/12/2019 | PROGRAMACIÓN 20 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 340 | 19/12/2019 | RV_ JUSTIFICACIÓN OTROSÍ 2 CTO 756-2019 CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 341 | 19/12/2019 | LISTADO DE CÓDIGOS Y DIRECCIONES PUNTOS DE CÁMARAS ENERGIZADOS POR CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 342 | 23/12/2019 | EJECUCIÓN AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 343 | 23/12/2019 | PROGRAMACIÓN 23 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 344 | 23/12/2019 | PROGRAMACIÓN 24 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 345 | 23/12/2019 | P136-CODENSA-00510-2019. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 346 | 23/12/2019 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 347 | 26/12/2019 | EJECUCIÓN AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 348 | 26/12/2019 | PROGRAMACIÓN 26 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 349 | 26/12/2019 | P136-CODENSA-0518-2019. REUNIÓN SEMANAL Y CONCILIACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 350 | 26/12/2019 | REUNIÓN SEMANAL Y CONCILIACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 351 | 27/12/2019 | PROGRAMACIÓN FIN DE AÑO | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 352 | 27/12/2019 | EJECUCIÓN AL 26 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 353 | 27/12/2019 | CRONOGRAMA | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 354 | 27/12/2019 | P136-SSCJ-00522-2019. SOLICITUD INFORMACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO BARRIO MARÍA PAZ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 355 | 27/12/2019 | ASIGNACIÓN ACTIVIDADES ARCHIVO DIC-23-2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 356 | 27/12/2019 | P136-SSCJ-00522-2019. SOLICITUD INFORMACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO BARRIO MARÍA PAZ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 357 | 27/12/2019 | PROGRAMACIÓN FIN DE AÑO | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|---|---|-------------------|
| 358 | 27/12/2019 | P136-SSCJ-00522-2019. SOLICITUD INFORMACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO BARRIO MARÍA PAZ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 359 | 27/12/2019 | SOLICITUD INFORMACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO BARRIO MARÍA PAZ | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 360 | 30/12/2019 | ENVIANDO POR CORREO ELECTRÓNICO_ CONT. 756-2019 MODIF.2 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 361 | 30/12/2019 | ENVIANDO POR CORREO ELECTRÓNICO_ MODIFICATORIO CTO 756-2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 362 | 30/12/2019 | SOLICITUD MODIFICACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO 756 DE 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 363 | 3/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA239 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 364 | 3/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA240 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 365 | 3/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA241 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 366 | 3/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA242 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 367 | 4/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA256 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 368 | 4/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA243 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 369 | 5/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA244 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 370 | 5/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA245 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 371 | 7/01/2020 | ACTA DE CONCILIACIÓN NO. 8 ENEL CONTRATO 756 DE 2019OP 142682 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 372 | 7/01/2020 | RE_ PROGRAMACIÓN 07 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 373 | 7/01/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 374 | 7/01/2020 | TIPO DE CONEXIÓN PARA CÁMARAS VÍDEO VIGILANCIA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 375 | 8/01/2020 | CERTIFICADO DE PRODUCTO | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 376 | 8/01/2020 | MANTENIMIENTO | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 377 | 8/01/2020 | PROGRAMACIÓN 08 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 378 | 8/01/2020 | PROGRAMACIÓN 09 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 379 | 8/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA246 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 380 | 8/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA246 -2019 1 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 381 | 8/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA247 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 382 | 8/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA248 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 383 | 8/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA249 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 384 | 8/01/2020 | P136-CODENSA-00520-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | P136-CODENSA-00520-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 385 | 9/01/2020 | EJECUCIÓN AL 08 DE ENERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 386 | 9/01/2020 | ACTA CONCILIACIÓN NO. 8 CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 387 | 9/01/2020 | P136-CODENSA-00562-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | P136-CODENSA-00562-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 388 | 9/01/2020 | VISITA CONJUNTA UTSMVC Y CODENSA 10_01_2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 389 | 9/01/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 08 DE ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 390 | 10/01/2020 | PROGRAMACIÓN 10 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 391 | 10/01/2020 | RV_ ENTREGA 9 Y 10 CORREGIDAS INVITACIÓN PARA COLABORAR | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 392 | 10/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA250 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 393 | 10/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA251 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 394 | 10/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA252 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 395 | 11/01/2020 | EJECUCIÓN AL 10 DE ENERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 396 | 11/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA253 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 397 | 11/01/2020 | UTSMVC-780-CODENSA254 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 398 | 12/01/2020 | RE_ PROGRAMACIÓN 10 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 399 | 13/01/2020 | PROGRAMACIÓN 14 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 400 | 13/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA254 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 401 | 13/01/2020 | P136-CODENSA-00572-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | P136-CODENSA-00572-2020. | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 402 | 13/01/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 10 DE ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 403 | 14/01/2020 | PROGRAMACIÓN 15 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 404 | 14/01/2020 | RV_ CÁMARAS ACTUALIZADAS | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 405 | 14/01/2020 | RV_ ENTREGA 5 CORREGIDA | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 406 | 14/01/2020 | P136-CODENSA-00572-2020. NOTIFICACIÓN DÍAS POR FUERA DEL TRABAJO | P136-CODENSA-00572-2020 | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 407 | 14/01/2020 | RESPUESTA AUTOMÁTICA_P136-CODENSA-00572-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 408 | 14/01/2020 | DEVOLUCIÓN DE SOPORTES FÍSICOS FACTURA NO. 7 CONTRATO 765 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 409 | 14/01/2020 | INFORME NOVIEMBRE 2019 CORTE #2 P136-CODENSA-00574-2020.APROBACIÓN DE INFORME TÉCNICO MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA S.A E.S.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | P136-CODENSA-00574-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 410 | 14/01/2020 | P136-CODENSA-00575-2020. DEVOLUCIÓN DE SOPORTES FÍSICOS FACTURA NO. 7 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA S.A E.S.P., PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | P136-CODENSA-00575-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 411 | 15/01/2020 | EJECUCIÓN AL 14 DE ENERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 412 | 15/01/2020 | PROGRAMACIÓN 16 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 413 | 15/01/2020 | RE_ EJECUCIÓN AL 14 DE ENERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 414 | 15/01/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 14 DE ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 415 | 16/01/2020 | ACTAS DE SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 416 | 16/01/2020 | EJECUCIÓN AL 15 DE ENERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 417 | 16/01/2020 | PROGRAMACIÓN 17 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 418 | 16/01/2020 | ACTAS DE SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 419 | 16/01/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 15 DE ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 420 | 17/01/2020 | EJECUCIÓN AL 16 DE ENERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 421 | 17/01/2020 | PROGRAMACIÓN 18 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 422 | 17/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA256 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 423 | 17/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA257 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 424 | 17/01/2020 | ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR VISITAS DE SITE SURVEY | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 425 | 20/01/2020 | PROGRAMACIÓN 20 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 426 | 20/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA258 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 427 | 20/01/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA CON FECHA DE CORTE AL 16 DE ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 428 | 21/01/2020 | INFORMACIÓN FACTURA CODENSA 1 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 429 | 21/01/2020 | INFORMACIÓN FACTURA CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 430 | 22/01/2020 | PROGRAMACIÓN 23 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 431 | 22/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA259 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 432 | 22/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA260 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 433 | 23/01/2020 | CANCELAR ACTIVIDADES ASIGNADAS | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 434 | 23/01/2020 | EJECUCIÓN AL 22 DE ENERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 435 | 23/01/2020 | P136-CODENSA-00614-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019. | P136-CODENSA-00614-2020. | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 436 | 23/01/2020 | PROGRAMACIÓN 24 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 437 | 23/01/2020 | CANCELAR ACTIVIDADES ASIGNADAS | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 438 | 23/01/2020 | P136-CODENSA-00614-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019. | P136-CODENSA-00614-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 439 | 25/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA264 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 440 | 26/01/2020 | PROGRAMACIÓN 27 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 441 | 26/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA265 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 442 | 26/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA266 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 443 | 27/01/2020 | EJECUCIÓN AL 24 DE ENERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 444 | 27/01/2020 | INFORME DICIEMBRE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 445 | 27/01/2020 | SOLICITUD DE COPIAS EN PDF PÓLIZAS ACTUALIZADAS. | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 446 | 27/01/2020 | SOLICITUD DE COPIAS EN PDF PÓLIZAS ACTUALIZADAS. | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 447 | 28/01/2020 | PROGRAMACIÓN 29 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 448 | 28/01/2020 | RV_ ACTA DE CONCILIACIÓN NO. 8 ENEL CONTRATO 756 DE 2019OP 142682 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 449 | 28/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA267 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 450 | 28/01/2020 | AVANCE EN LA CONSOLIDADA FACTURA CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 451 | 29/01/2020 | RE_ EJECUCIÓN AL 28 DE ENERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 452 | 29/01/2020 | RV_ ENTREGA 11 CAMARAS INVITACIÓN PARA COLABORAR | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 453 | 29/01/2020 | RV_ ENTREGA 12 CÁMARAS INVITACIÓN PARA COLABORAR | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 454 | 29/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA268 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 455 | 29/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA269 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 456 | 29/01/2020 | RV_ ACTA DE CONCILIACIÓN NO. 8 EN EL CONTRATO 756 DE 2019 OP 142682 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 457 | 29/01/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 28 DE ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 458 | 30/01/2020 | PROGRAMACIÓN 30 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 459 | 30/01/2020 | PROGRAMACIÓN 31 ENERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 460 | 30/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA270 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 461 | 30/01/2020 | FALLO PUNTO CODENSA FVS-4010 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 462 | 30/01/2020 | P136-CODENSA-00632-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00632-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 463 | 30/01/2020 | P136-CODENSA-00632-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00632-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 464 | 30/01/2020 | VERIFICACIÓN VIGENCIA PÓLIZA CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 465 | 31/01/2020 | PAC PRÓXIMOS MESES | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 466 | 1/02/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 28 DE ENERO DE 2020 1 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 467 | 3/02/2020 | ACTA DE CONCILIACIÓN NO. 9 EN EL CONTRATO 756 DE 2019 OP 142682 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 468 | 3/02/2020 | PROGRAMACIÓN 04 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 469 | 3/02/2020 | ACTAS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 470 | 3/02/2020 | P136-CODENSA-00639-2020. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL MES DE DICIEMBRE DE 2019 | P136-CODENSA-00639-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 471 | 4/02/2020 | RE_ EJECUCIÓN AL 03 DE FEBRERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 472 | 4/02/2020 | RE_ PROGRAMACIÓN 05 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 473 | 4/02/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 03 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 474 | 5/02/2020 | EJECUCIÓN AL 04 DE FEBRERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|-------------------------|---|-------------------|
| 475 | 5/02/2020 | PROGRAMACIÓN 06 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 476 | 5/02/2020 | P136-CODENSA-00652-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00652-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 477 | 5/02/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA LA 04 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 478 | 6/02/2020 | EJECUCIÓN AL 05 DE FEBRERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 479 | 6/02/2020 | PROGRAMACIÓN 07 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 480 | 7/02/2020 | RV_ GUIA ENVIÁ_SECRETARIA DE SEGURIDAD PÓLIZAS | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 481 | 7/02/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 05 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 482 | 8/02/2020 | EJECUCIÓN AL 07 DE FEBRERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 483 | 9/02/2020 | P136-SSCJ-00689-2020. DAÑOS POR VANDALISMO A INFRAESTRUCTURA DE LA CÁMARA AL1716 LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 484 | 10/02/2020 | ACTA DE CONCILIACIÓN NO. 8 ENEL CONTRATO 756 DE 2019OP 142682 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 485 | 10/02/2020 | PROGRAMACIÓN 11 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 486 | 10/02/2020 | ACTA NO. 8 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 487 | 10/02/2020 | P136-CODENSA-00661-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00661-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 488 | 10/02/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 07 DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 489 | 11/02/2020 | ACTA DE CONCILIACIÓN NO. 9 ENEL CONTRATO 756 DE 2019OP 142682 1 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 490 | 11/02/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA276 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 491 | 11/02/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA277 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 492 | 11/02/2020 | FECHA DE ENERGIZACIÓN POR CODENSA DEL SISTEMA VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA BOGOTÁ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 493 | 12/02/2020 | EJECUCIÓN AL 11 DE FEBRERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 494 | 12/02/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA262 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 495 | 12/02/2020 | RV_ RADICADO 02577105RE_ SOLICITUD DEVOLUCIÓN DINEROS POR CUOTA INTERÉS CONEXIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|--------------------|---|-------------------|
| 496 | 12/02/2020 | SOLICITUD INFORMACIÓN 'PUNTO ETIQUETA 12692 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 497 | 12/02/2020 | ACTUAL CCTV | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 498 | 12/02/2020 | SOLICITUD INFORMACIÓN 'PUNTO ETIQUETA 12692 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 499 | 13/02/2020 | PROGRAMACIÓN 14 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 500 | 13/02/2020 | FWD_ SGT-COL-1545-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTO P469_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 501 | 13/02/2020 | FWD_ SGT-COL-2581-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTO AL2581_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 502 | 13/02/2020 | RE_ RADICADO 02577105RE_ SOLICITUD DEVOLUCIÓN DINEROS POR CUOTA INTERÉS CONEXIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 503 | 13/02/2020 | VISITA CONJUNTA DEL PUNTO DE CÁMARA AL1716 ALCALDÍAS CON ID DE SERVICIO CAV30CI1111617CONTRATO NO. 914 DE 2019 __ CASO_ 0139667112692 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 504 | 14/02/2020 | FECHA DE ENERGIZACIÓN POR CODENSA DEL SISTEMA VÍDEO VIGILANCIA CIUDADANA BOGOTÁ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 505 | 14/02/2020 | RV_ SGT-COL-1547-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTO PCE23676_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 506 | 16/02/2020 | PROGRAMACIÓN 17 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 507 | 16/02/2020 | UTSMVC-780-CODENSA282 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 508 | 16/02/2020 | VISITA DE DIAGNÓSTICO AL1716 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 509 | 17/02/2020 | P136-CODENSA-00685-2020 NOTIFICACIÓN CAMBIO DE NÚMERO DE OFICINA CONSORCIO_ | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 510 | 17/02/2020 | STOP WORK | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|-------------------------|---|-------------------|
| 511 | 17/02/2020 | RV_ SGT-COL-1548-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTO P465_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 512 | 17/02/2020 | RV_ SGT-COL-1549-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTOS CCEAD_L7_15, P370_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 513 | 17/02/2020 | ASIGNACIÓN DE PUNTOS DE CÁMARA POR MANTENIMIENTO | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 514 | 17/02/2020 | P136-CODENSA-00668-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | P136-CODENSA-00668-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 515 | 17/02/2020 | P136-CODENSA-00685-2020 NOTIFICACIÓN CAMBIO DE NÚMERO DE OFICINA CONSORCIO | P136-CODENSA-00685-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 516 | 17/02/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 11 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 517 | 18/02/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA-284-2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 518 | 18/02/2020 | ESTADOS DE PAGOS CONTRATO 756 DE 2019 CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 519 | 19/02/2020 | RV_ SGT-COL-1550-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTO AL2329_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 520 | 19/02/2020 | RV_ SGT-COL-1551-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTOS AL2714, AL2728_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 521 | 19/02/2020 | RV_ SGT-COL-1552-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS CCEL19_086, CCEL19_030_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 522 | 19/02/2020 | RV_ SGT-COL-1553-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTOS P518, PAQ48_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 523 | 20/02/2020 | PROGRAMACIÓN 21 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|-------------------------|---|-------------------|
| 524 | 20/02/2020 | FECHA DE ENERGIZACIÓN POR CODENSA DEL SISTEMA VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA BOGOTÁ2 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 525 | 21/02/2020 | EJECUCIÓN AL 20 DE FEBRERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 526 | 21/02/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA283 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 527 | 21/02/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA285 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 528 | 24/02/2020 | ACEPTADA_ INVITACIÓN_ REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATO 756 DE 2019 JUE 27 DE FEB DE 2020 9AM(LEONARDO.GOMEZ@ENEL.COM). 1PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 529 | 24/02/2020 | PROGRAMACIÓN 25 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 530 | 24/02/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA286 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 531 | 24/02/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA287 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 532 | 24/02/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA288 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 533 | 24/02/2020 | RV_ NOVEDADES MANTENIMIENTO 22_23-FEB-2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 534 | 24/02/2020 | RV_ SGT-COL-1561-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTO MB597_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 535 | 24/02/2020 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 536 | 24/02/2020 | P136-CODENSA-00705-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | P136-CODENSA-00705-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 537 | 24/02/2020 | P136-CODENSA-00708-2020. REUNIÓN SEGUIMIENTO SEMANAL DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | P136-CODENSA-00708-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 538 | 24/02/2020 | PUNTOS DE CÁMARAS PENDIENTES POR ATENDER POR PARTE DE CODENSA CON CORTE AL 24 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 539 | 24/02/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 20 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 540 | 25/02/2020 | PROGRAMACIÓN 26 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 541 | 25/02/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA289 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|--------------------|---|-------------------|
| 542 | 25/02/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA290 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 543 | 25/02/2020 | RV_ NOVEDADES MANTENIMIENTO 25-FEB-2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 544 | 25/02/2020 | RV_ SGT-COL-1562-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTO CCEL11_018_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 545 | 25/02/2020 | RV_ SGT-COL-1563-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTO CCEL19_111_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 546 | 26/02/2020 | EJECUCIÓN AL 25 DE FEBRERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 547 | 26/02/2020 | PROGRAMACIÓN 27 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 548 | 26/02/2020 | DERECHO DE PETICIÓN 20205410151881 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 549 | 26/02/2020 | RV_ CORTES PROGRAMADOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA FEBRERO 26 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 550 | 26/02/2020 | RV_ SGT-COL-1564-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTO P520_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 551 | 26/02/2020 | RV_ SGT-COL-1565-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS PCE18689, CCEL19_092_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 552 | 26/02/2020 | DERECHO DE PETICIÓN 20205410151881 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 553 | 26/02/2020 | RV_ CORTES PROGRAMADOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 554 | 27/02/2020 | EJECUCIÓN AL 26 DE FEBRERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 555 | 27/02/2020 | RE_ PROGRAMACIÓN 27 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|-------------------------|---|-------------------|
| 556 | 27/02/2020 | INFORMACIÓN CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 557 | 27/02/2020 | RV_ CRONOGRAMA CICLO II MANTENIMIENTO CÁMARAS ALCALDÍASLOCALIDAD BARRIOS UNIDOS | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 558 | 27/02/2020 | RV_ SGT-COL-1566-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS AL2268, PCE18750_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 559 | 27/02/2020 | RV_ SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIGILANCIA_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 560 | 27/02/2020 | P136-CODENSA-00729-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | P136-CODENSA-00729-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 561 | 27/02/2020 | AVANCE EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CODENSA AL 26 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 562 | 28/02/2020 | EJECUCIÓN AL 27 DE FEBRERO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 563 | 28/02/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA291 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 564 | 29/02/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA288 -2019 1 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 565 | 29/02/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA292 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 566 | 2/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA281 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 567 | 2/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA288 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 568 | 2/03/2020 | FWD_ FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA279 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 569 | 2/03/2020 | RE_ UTSMVC-780-CODENSA280 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 570 | 2/03/2020 | RV_ SGT-COL-1580-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTO CCEL11_103_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|-----------|--|--------------------|---|-------------------|
| 571 | 2/03/2020 | RV_ SGT-COL-1581-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTO P277_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 572 | 2/03/2020 | RV_ SGT-COL-1582-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTO CVID21864_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 573 | 2/03/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 27 DE FEBRERO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 574 | 2/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA288 -2019.1PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 575 | 3/03/2020 | EJECUCIÓN AL 02 DE MARZO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 576 | 3/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA288 -2019 1 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 577 | 3/03/2020 | RV_ SGT-COL-1587-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTOS AL2585, CCEL11_036_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 578 | 3/03/2020 | RV_ SGT-COL-1588-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTO CCAD_L7_079_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 579 | 3/03/2020 | P136-CODENSA-00740-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 580 | 3/03/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 03 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 581 | 3/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA288 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 582 | 4/03/2020 | EJECUCIÓN AL 03 DE MARZO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 583 | 4/03/2020 | EJECUCIÓN AL 04 DE MARZO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 584 | 4/03/2020 | PROGRAMACIÓN 04 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 585 | 4/03/2020 | P136-CODENSA-00743-2020. MANIFIESTO SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 586 | 4/03/2020 | RV_ NOVEDADES MANTENIMIENTO BARRIOS UNIDOS | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|-----------|---|--------------------|---|-------------------|
| 587 | 4/03/2020 | RV_ SGT-COL-1589-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTOS P522, P528, P529_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 588 | 4/03/2020 | RV_ SGT-COL-1590-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO FONTIBÓN PUNTO AL1394 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 589 | 4/03/2020 | P136-CODENSA-00743-2020. MANIFIESTO SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 590 | 4/03/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 04 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 591 | 5/03/2020 | P136-CODENSA-00746-2020. GARANTÍAS DE OBRAS CIVIL RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN 20205410151881_ | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 592 | 5/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA298 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 593 | 5/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA300 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 594 | 5/03/2020 | RV_ SGT-COL-1579-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTO CCEL19_0025_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 595 | 5/03/2020 | SOLICITUD INFORMACIÓN ACCIÓN DE MEJORA CONTRALORÍA | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 596 | 5/03/2020 | P136-CODENSA-00746-2020. GARANTÍAS DE OBRAS CIVIL RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN 20205410151881_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 597 | 6/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA298 -2019 1 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 598 | 6/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA301 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 599 | 6/03/2020 | ESTADO FINANCIERO CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 600 | 6/03/2020 | RV_ ESTADO FINANCIERO CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|-----------|--|--------------------|---|-------------------|
| 601 | 6/03/2020 | RV_ SGT-COL-1592-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTO PAQ20_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 602 | 6/03/2020 | RV_ SGT-COL-1597-20 NOTIFICACIÓN INICIO SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 603 | 6/03/2020 | SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA PUNTO DE CÁMARA AL1716 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 604 | 6/03/2020 | SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA PUNTO DE CÁMARA AL1716 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 605 | 6/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA298 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 606 | 6/03/2020 | ESTADO FINANCIERO CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 607 | 6/03/2020 | SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA PUNTO DE CÁMARA AL1716 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 608 | 7/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA304 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 609 | 7/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA305 -2019 1 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 610 | 7/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA305 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 611 | 7/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA305 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 612 | 9/03/2020 | SEGUIMIENTO PROYECTO CÁMARAS ENEL. 1PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 613 | 9/03/2020 | SEGUIMIENTO PROYECTO CÁMARAS ENEL | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 614 | 9/03/2020 | DERECHO DE PETICIÓN CHAPINERO 20205410173671 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 615 | 9/03/2020 | RE_ P136-SSCJ-00752-2020TRÁMITE DE LA PRÓRROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1020 -2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 616 | 9/03/2020 | RV_ SGT-COL-1598-20 NOTIFICACIÓN INICIO SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|--------------------|---|-------------------|
| 617 | 9/03/2020 | RV_ SGT-COL-1599-19 NOTIFICACIÓN INICIO SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LOCALIDAD DE USME_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 618 | 9/03/2020 | RV_ SGT-COL-1600-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTOS P526, PCE24664_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 619 | 9/03/2020 | RV_ SGT-COL-1601-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO FONTIBÓN PUNTO MB482_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 620 | 9/03/2020 | P136-CODENSA-00754-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 621 | 9/03/2020 | P136-CODENSA-00757-2020. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL MES DE ENERO DE 2020_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 622 | 9/03/2020 | SEGUIMIENTO PROYECTO CÁMARAS ENEL | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 623 | 10/03/2020 | EJECUCIÓN AL 09 DE MARZO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 624 | 10/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA298 -2019 1 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 625 | 10/03/2020 | RV_ SGT-COL-1605-19 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO USME ID AL119 _ AL1087_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 626 | 10/03/2020 | RV_ SGT-COL-1605-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO USME ID AL119 _ AL1087_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 627 | 10/03/2020 | RV_ SGT-COL-1606-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SAN CRISTÓBAL PUNTO P293_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 628 | 10/03/2020 | ACTA DE CONCILIACIÓN NO. 9 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 629 | 10/03/2020 | ACTA DE SEGUIMIENTO NO. 25 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 630 | 11/03/2020 | PROGRAMACIÓN 10 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 631 | 11/03/2020 | PROGRAMACIÓN 11 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 632 | 11/03/2020 | RE_ EJECUCIÓN AL 09 DE MARZO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|--------------------|---|-------------------|
| 633 | 11/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA298 -2019 2 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 634 | 11/03/2020 | ACTA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO NO. 25 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 635 | 11/03/2020 | TAPAS PARA CAJA DE INSPECCIÓN ESPECIALES (ANTIVANDALISMO) | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 636 | 12/03/2020 | EJECUCIÓN AL 12 DE MARZO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 637 | 12/03/2020 | RE_ PROGRAMACIÓN 11 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 638 | 12/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA308 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 639 | 12/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA309 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 640 | 12/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA310 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 641 | 12/03/2020 | RV_ SGT-COL-1610-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO USME ID AL966 _ AL981_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 642 | 12/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA309 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 643 | 12/03/2020 | FWD_ SGT-COL-1609-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO TUNJUELITO ID MB339 _ MB301 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 644 | 12/03/2020 | RV_ SGT-COL-1608-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SAN CRISTÓBAL PUNTO CVID21726_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 645 | 12/03/2020 | RV_ SGT-COL-1609-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO TUNJUELITO ID MB339 _ MB301 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 646 | 13/03/2020 | PROGRAMACIÓN 13 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 647 | 13/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA311 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 648 | 13/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA312 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 649 | 13/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA313 -2019 1 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 650 | 13/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA313 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 651 | 13/03/2020 | FWD_ SGT-COL-1611-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO USME ID AL110, CVID21784 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|--------------------|---|-------------------|
| 652 | 13/03/2020 | P136-CODENSA-00772-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 653 | 13/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA313 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 654 | 13/03/2020 | P136-SSCJ-00771-2020. CAMBIO EN LA SUPERVISIÓN INTERNA DE CODENSA S.A E.S.P., PARA EL CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 655 | 15/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA314 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 656 | 16/03/2020 | EJECUCIÓN AL 13 DE MARZO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 657 | 16/03/2020 | PROGRAMACIÓN 17 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 658 | 16/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA315 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 659 | 16/03/2020 | RV_ SGT-COL-1611-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO USME ID AL110, CVID21784 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 660 | 16/03/2020 | RV_ SGT-COL-1612-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS AL2305, CCEL19_116_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 661 | 16/03/2020 | RV_ SGT-COL-1613-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO USME ID AL1095, AL1099, AL117 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 662 | 16/03/2020 | MODIFICATORIO NO.3 CONTRATO 756 DE 2019 CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 663 | 17/03/2020 | SOPORTE DE LAS GARANTÍAS SOLICITADAS POR DERECHO DE PETICIÓN V1 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 664 | 17/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA316 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 665 | 17/03/2020 | RV_ SGT-COL-1614-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO USME ID AL948, AL950_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 666 | 17/03/2020 | RV_ SGT-COL-1615-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SAN CRISTÓBAL PUNTO P305_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 667 | 17/03/2020 | P136-CODENSA-00781-2020. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA EJECUTAR EN CAMPO | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|--------------------|---|-------------------|
| 668 | 17/03/2020 | SOPORTE DE LAS GARANTÍAS SOLICITADAS POR DERECHO DE PETICIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 669 | 18/03/2020 | PROGRAMACIÓN 19 DE MARZO DE 2020 1 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 670 | 18/03/2020 | RE_ PROGRAMACIÓN 18 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 671 | 18/03/2020 | SOPORTE DE LAS GARANTÍAS SOLICITADAS POR DERECHO DE PETICIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 672 | 18/03/2020 | SOPORTE DE LAS GARANTÍAS SOLICITADAS POR DERECHO DE PETICIÓN V2 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 673 | 18/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA317 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 674 | 18/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA318 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 675 | 18/03/2020 | NOVEDADES REPORTADAS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 676 | 18/03/2020 | PUNTOS CON MAYOR PRIORIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 677 | 18/03/2020 | VISITAS DE SITE SURVEY | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 678 | 19/03/2020 | P136-CODENSA-00781-2020. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA EJECUTAR EN CAMPO | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 679 | 19/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA319 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 680 | 19/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA320 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 681 | 19/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA321 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 682 | 19/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA322 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 683 | 20/03/2020 | EJECUCIÓN AL 19 DE MARZO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 684 | 20/03/2020 | PROGRAMACIÓN 19 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 685 | 20/03/2020 | AVANCE EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 19 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 686 | 20/03/2020 | VERIFICACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 687 | 24/03/2020 | P136-CODENSA-00804-2020. SOLICITUD PLAN DE TRABAJO DURANTE LA CUARENTENA NACIONAL (DECRETO 457 DEL 22 DE MARZO DE 2020) | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 688 | 24/03/2020 | P136-CODENSA-00804-2020. SOLICITUD PLAN DE TRABAJO DURANTE LA CUARENTENA NACIONAL (DECRETO 457 DEL 22 DE MARZO DE 2020) | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 689 | 24/03/2020 | RESPUESTAS DERECHO DE PETICIÓN DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 690 | 25/03/2020 | RE_ PROGRAMACIÓN 19 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 691 | 25/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA288 -2019 V.25 03 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 692 | 25/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA323 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 693 | 25/03/2020 | RESPUESTA DERECHO PETICIÓN NO. 2020541018576-1_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 694 | 25/03/2020 | RESPUESTA DERECHO PETICIÓN NO. 2020541018576-1_1 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 695 | 26/03/2020 | EJECUCIÓN AL 25 DE MARZO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 696 | 26/03/2020 | PROGRAMACIÓN 26 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 697 | 26/03/2020 | P136-CODENSA-00819-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 698 | 26/03/2020 | AVANCE EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 25 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 699 | 26/03/2020 | OFICIALIZAR EL CAMBIO DEL GESTOR ANTE LA SECRETARIA Y LA INTERVENTORÍA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 700 | 27/03/2020 | EJECUCIÓN AL 26 DE MARZO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 701 | 27/03/2020 | PROGRAMACIÓN 27 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 702 | 27/03/2020 | P136-CODENSA-00819-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 703 | 27/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA324 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 704 | 27/03/2020 | AJUSTES AL DOCUMENTO MODIFICATORIO NO. 3 CONTRATO 756 DE 2019 CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 705 | 28/03/2020 | ACTA NO. 24 SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 706 | 28/03/2020 | ACTA NO. 24 SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 707 | 29/03/2020 | ACTAS SEMANALES DEL MES DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 708 | 30/03/2020 | PROGRAMACIÓN 31 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 709 | 30/03/2020 | RV_ PROGRAMACIÓN 31 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 710 | 30/03/2020 | TAPAS PARA CAJA DE INSPECCIÓN ESPECIALES (ANTIVANDALISMO) | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 711 | 30/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA325 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 712 | 30/03/2020 | PROCEDIMIENTOS PARA RADICAR DOCUMENTACIÓN AL CONSORCIO SMARTY-SCAIN 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 713 | 31/03/2020 | EJECUCIÓN AL 30 DE MARZO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 714 | 31/03/2020 | OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 715 | 31/03/2020 | REPORTE ACTIVIDADES EJECUTADAS | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 716 | 31/03/2020 | RV_ EJECUCIÓN AL 27 DE MARZO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A E.S.P | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 717 | 31/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA326 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 718 | 31/03/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA327 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 719 | 31/03/2020 | PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 720 | 1/04/2020 | EJECUCIÓN AL 01 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 721 | 1/04/2020 | PROGRAMACIÓN 01 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 722 | 1/04/2020 | RADICACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 723 | 1/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA327 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 724 | 1/04/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 31 DE MARZO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 725 | 1/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA327 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 726 | 2/04/2020 | EJECUCIÓN AL 01 DE ABRIL 2020 V1 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 727 | 2/04/2020 | PROGRAMACIÓN 02 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 728 | 2/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA326 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 729 | 2/04/2020 | UTSMVC-780-CODENSA329 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 730 | 2/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA326 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 731 | 2/04/2020 | UTSMVC-780-CODENSA329 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 732 | 3/04/2020 | UTSMVC-780-CODENSA331 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 733 | 3/04/2020 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00833-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 734 | 3/04/2020 | EJECUCIÓN AL 02 Y 03 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 735 | 3/04/2020 | PROGRAMACIÓN 03 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 736 | 3/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA331 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 737 | 3/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA331 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 738 | 4/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA327 -2019. 1PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 739 | 4/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA334 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 740 | 4/04/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 03 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 741 | 5/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA337 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 742 | 6/04/2020 | RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN NÚMERO 03 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y CODENSA S.A E.S.P. | CSS-P136-00128-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 743 | 6/04/2020 | FWD_ ENTREGA 0015 CAMARAS INVITACIÓN PARA COLABORAR | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 744 | 6/04/2020 | PROGRAMACIÓN 06 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 745 | 6/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA338 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 746 | 6/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA339 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 747 | 6/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA340 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 748 | 6/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA341 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 749 | 7/04/2020 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00839-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 750 | 7/04/2020 | CONTRATO 756 DE 2019 PÓLIZAS MODIFICATORIO NO. 3 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 751 | 7/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA342 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 752 | 7/04/2020 | P136-CODENSA-00839-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019. | P136-CODENSA-00839-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 753 | 8/04/2020 | ACTA DE CONCILIACIÓN NO.10 ACTIVIDADES FEBRERO-MARZO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 754 | 8/04/2020 | EJECUCIÓN AL 06 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 755 | 8/04/2020 | ACTA DE CONCILIACIÓN NO.10 ACTIVIDADES FEBRERO-MARZO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 756 | 9/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA343 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 757 | 9/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA344 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 758 | 9/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA345 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 759 | 11/04/2020 | TAPAS PARA CAJA DE INSPECCIÓN ESPECIALES (ANTIVANDALISMO) | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 760 | 13/04/2020 | OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA A LOS SOPORTES DIGITALES DE LAS ENTREGAS 13 A LA 15 POR PARTE DEL CONTRATISTA CODENSA S.A E.S.P., PARA EL MES DE MARZO DE 2020 | P136-CODENSA-00848-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 761 | 13/04/2020 | EJECUCIÓN AL 13 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 762 | 13/04/2020 | FWD_ RENOVACIÓN PMT TÍPICO 20200311 Y NUEVOS PMT VÍAS PRINCIPALES | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 763 | 13/04/2020 | PÓLIZAS MODIFICATORIO NO. 3CONTRATO NO. 1020-2019 VF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 764 | 13/04/2020 | PÓLIZAS MODIFICATORIO NO. 3CONTRATO NO. 1020-2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 765 | 13/04/2020 | PROGRAMACIÓN 13 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 766 | 13/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA346 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 767 | 13/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA347 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 768 | 14/04/2020 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00851-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 769 | 14/04/2020 | OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO CODENSA MESES FEBRERO-MARZO DE 2020 CONTRATO 756 DE 2019. | P136-CODENSA-00852-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 770 | 14/04/2020 | EJECUCIÓN AL 14 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 771 | 14/04/2020 | P136-CODENSA-00851-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 772 | 14/04/2020 | P136-CODENSA-00852-2020. OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO CODENSA MESES FEBRERO-MARZO DE 2020 CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 773 | 14/04/2020 | PROGRAMACIÓN 14 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 774 | 14/04/2020 | RV_ MODIFICATORIO NO 3 AL CONTRATO DE SERVICIO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 775 | 14/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA348 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 776 | 14/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA349 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 777 | 14/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA350 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 778 | 14/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA351 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 779 | 14/04/2020 | FWD_ RETIRO PROVISIONAL DE CÁMARA DE SEGURIDADPLAZA DE BOLIVAR | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 780 | 14/04/2020 | P136-CODENSA-00851-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | P136-CODENSA-00851-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 781 | 14/04/2020 | P136-CODENSA-00852-2020. OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO CODENSA MESES FEBRERO-MARZO DE 2020 CONTRATO 756 DE 2019_ | P136-CODENSA-00852-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 782 | 14/04/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 13 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 783 | 14/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA350 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 784 | 15/04/2020 | PROGRAMACIÓN 15 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 785 | 16/04/2020 | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 756 DE 2019. | CSS-P136-00138-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 786 | 16/04/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 15 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 787 | 16/04/2020 | EJECUCIÓN AL 15 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 788 | 16/04/2020 | EJECUCIÓN AL 16.1 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 789 | 16/04/2020 | PROGRAMACIÓN 16 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 790 | 16/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA352 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 791 | 16/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA353 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 792 | 16/04/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 15 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 793 | 16/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA353 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 794 | 17/04/2020 | EJECUCIÓN AL 16 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 795 | 17/04/2020 | EJECUCIÓN AL 17 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 796 | 17/04/2020 | PROGRAMACIÓN 17 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 797 | 17/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA354 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 798 | 18/04/2020 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00862-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 799 | 18/04/2020 | PUNTOS DE CÁMARA CON VALORES DE VOLTAJE ELEVADOS PARA REALIZAR VISITA NOCTURNA | P136-CODENSA-00864-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 800 | 18/04/2020 | P136-CODENSA-00862-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019. | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 801 | 18/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA355 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 802 | 18/04/2020 | P136-CODENSA-00862-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019. | P136-CODENSA-00862-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 803 | 18/04/2020 | P136-CODENSA-00864-2020. PUNTOS DE CÁMARA CON VALORES DE VOLTAJE ELEVADOS PARA REALIZAR VISITA NOCTURNA | P136-CODENSA-00864-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 804 | 18/04/2020 | VISITA PARA REALIZAR NUEVAMENTE SITE SURVEY PUNTO DE CÁMARA AL1716 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 805 | 20/04/2020 | EJECUCIÓN AL 20 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|--------------------|---|-------------------|
| 806 | 20/04/2020 | PROGRAMACIÓN 20 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 807 | 21/04/2020 | EJECUCIÓN AL 21 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 808 | 21/04/2020 | PROGRAMACIÓN 21 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 809 | 21/04/2020 | VISITA PARA REALIZAR NUEVAMENTE SITE SURVEY PUNTO DE CÁMARA AL1716 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 810 | 21/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA356 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 811 | 21/04/2020 | FWD_ SGT-COL-1643-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO RAFAEL URIBE URIBE PUNTOS MB1097, MB1095_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 812 | 21/04/2020 | RE_ SGT-COL-1643-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO RAFAEL URIBE URIBE PUNTOS MB1097, MB1095 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 813 | 21/04/2020 | RE_ SGT-COL-1644-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO LOS MÁRTIRES PUNTOS MB1195, MB1196, P189, AL1742, AL1708, AL1709 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 814 | 21/04/2020 | RE_ SGT-COL-1645-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGATIVÁ PUNTO AL1450_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 815 | 21/04/2020 | RV_ SGT-COL-1641-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO RAFAEL URIBE URIBE PUNTO MB1072 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 816 | 21/04/2020 | RV_ SGT-COL-1643-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO RAFAEL URIBE URIBE PUNTOS MB1097, MB1095_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 817 | 21/04/2020 | RV_ SGT-COL-1650-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO RAFAEL URIBE URIBE PUNTOS P140, P141_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 818 | 21/04/2020 | RV_ SGT-COL-1651-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGATIVÁ PUNTO PCE19438_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|-------------------------|---|-------------------|
| 819 | 21/04/2020 | RV_ SGT-COL-1652-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO LOS MÁRTIRES PUNTOS CVID22167, CVID22171, MB1190_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 820 | 21/04/2020 | 4 PUNTOS PARA MIGRAR A RED DE USO EJECUCIÓN INMEDIATA_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 821 | 21/04/2020 | ACTAS SEMANALES DE SEGUIMIENTO CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 822 | 21/04/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CODENSA AL 20 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 823 | 22/04/2020 | EJECUCIÓN AL 22 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 824 | 22/04/2020 | PROGRAMACIÓN 22 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 825 | 23/04/2020 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00878-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 826 | 23/04/2020 | EJECUCIÓN AL 23 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 827 | 23/04/2020 | PROGRAMACIÓN 23 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 828 | 23/04/2020 | INVITACIÓN_ REUNIÓN CON LA SUPERVISIÓN JUE 23 DE ABR DE 2020 3PM5PM (COT) (CAMILO.VELASCO@SCJ.GOV.CO) | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 829 | 23/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA357 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 830 | 23/04/2020 | P136-CODENSA-00878-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019.1_ | P136-CODENSA-00878-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 831 | 23/04/2020 | P136-CODENSA-00900-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00900-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 832 | 23/04/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 22 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 833 | 24/04/2020 | PROGRAMACIÓN 24 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 834 | 24/04/2020 | UTSMVC-780-CODENSA358 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 835 | 24/04/2020 | UTSMVC-780-CODENSA359 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 836 | 24/04/2020 | UTSMVC-780-CODENSA360 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 837 | 24/04/2020 | UTSMVC-780-CODENSA361 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 838 | 24/04/2020 | RV_ SGT-COL-1664-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTOS P280, PCE19369, CVID22075, AL2657, AL2733, CCEL11_003_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 839 | 24/04/2020 | UTSMVC-780-CODENSA359 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|---------------------|---|-------------------|
| 840 | 24/04/2020 | UTSMVC-780-CODENSA360 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 841 | 24/04/2020 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 23 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 842 | 25/04/2020 | UTSMVC-780-CODENSA362 - 2019PÓLIZAS MODIFICATORIO NO. 3CONTRATO NO. 1020-2019 VERSIÓN FIRMADA | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 843 | 26/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSVMC-780-CODENSA363 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 844 | 26/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSVMC-780-CODENSA364 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 845 | 27/04/2020 | EJECUCIÓN AL 27 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 846 | 27/04/2020 | PROGRAMACIÓN 27 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 847 | 27/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSVMC-780-CODENSA366 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 848 | 27/04/2020 | RV_ SGT-COL-1666-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTOS AL2610, AL2714, AL2747, CCEL11_099_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 849 | 28/04/2020 | EJECUCIÓN AL 28 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 850 | 28/04/2020 | PROGRAMACIÓN 28 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 851 | 28/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSVMC-780-CODENSA367 -2019 V | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 852 | 28/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSVMC-780-CODENSA367 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 853 | 29/04/2020 | ANÁLISIS PROPUESTA EMITIDA POR CODENSA S.A E.S.P, FRENTE A LOS CASOS DE VANDALISMO QUE SE PRESENTAN EN LA CÁMARA AL1716., PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | CSS-P136-00142-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 854 | 29/04/2020 | CONCEPTO TÉCNICO PROPUESTA TAPA ANTI VANDALISMO EMITIDO POR CODENSA S.A E.S.P., PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | CSS-P136-00143-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 855 | 29/04/2020 | EJECUCIÓN AL 29 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 856 | 29/04/2020 | PÓLIZAS MODIFICATORIO NO. 3CONTRATO NO. 1020-2019 VERSIÓN FIRMADA | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 857 | 29/04/2020 | PROGRAMACIÓN 29 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 858 | 29/04/2020 | RV_ SGT-COL-1672-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTOS AL2585, CCEL11_062_PROGRAMACIÓN 30 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 859 | 29/04/2020 | UTSMVC-780-CODENSA358 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 860 | 29/04/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 28 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 861 | 29/04/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA CON FECHA DE CORTE AL 29 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 862 | 30/04/2020 | PROGRAMACIÓN 30 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 863 | 30/04/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSVMC-780-CODENSA368 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 864 | 30/04/2020 | PROGRAMACIÓN 29 DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 865 | 30/04/2020 | OFICIOS CONCEPTO TÉCNICO TAPAS ESPECIALES Y CANALIZACIÓN PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA PUNTO DE CÁMARA AL1716 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 866 | 1/05/2020 | EJECUCIÓN AL 30 DE ABRIL 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 867 | 1/05/2020 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00900-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 868 | 1/05/2020 | P136-CODENSA-00900-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 869 | 3/05/2020 | PROGRAMACIÓN 05 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 870 | 3/05/2020 | UTSMVC-780-CODENSA369 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 871 | 3/05/2020 | UTSMVC-780-CODENSA369 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 872 | 4/05/2020 | EJECUCIÓN AL 05 DE MAYO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 873 | 4/05/2020 | PRESUPUESRO CAMARA SCJ17E120006 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 874 | 4/05/2020 | RV_ ENTREGA 016 CAMARAS INVITACIÓN PARA COLABORAR | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 875 | 4/05/2020 | RV_ SGT-COL-1677-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTOS AL1278, AL1328, CCEL08_044_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 876 | 5/05/2020 | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 756 DE 2019. | CSS-P136-00146-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 877 | 5/05/2020 | PROGRAMACIÓN 06 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 878 | 5/05/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSVMC-780-CODENSA370 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 879 | 5/05/2020 | RV_ SGT-COL-1680-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO RAFAEL URIBE URIBE PUNTOS MB1019, AL2092, AL2103 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 880 | 5/05/2020 | RV_ SGT-COL-1683-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGATIVÁ PUNTOS AL1522, CVID22031 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 881 | 5/05/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 05 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|-----------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 882 | 5/05/2020 | PÓLIZAS CONTRATO 756 DE 2019 CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 883 | 6/05/2020 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00906-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 884 | 6/05/2020 | EJECUCIÓN AL 06 DE MAYO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 885 | 6/05/2020 | EJECUCIÓN AL 07 DE MAYO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 886 | 6/05/2020 | PRELIMINAR CONCILIACIÓN NO.11 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 887 | 6/05/2020 | PROGRAMACIÓN 07 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 888 | 6/05/2020 | TAPAS PARA CAJA DE INSPECCIÓN ESPECIALES (ANTIVANDALISMO) | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 889 | 6/05/2020 | UTSMVC-780-CODENSA371 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 890 | 6/05/2020 | RECHAZADO_ INVITACIÓN_ REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 1020 DE 2019 VIE 8 DE MAY DE 2020 4_30PM6_30PM (CAMILO.VELASCO@SCJ.GOV.CO) | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 891 | 6/05/2020 | RV_ NOVEDADES MANTENIMIENTO 4-5-MAYO-2020 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 892 | 6/05/2020 | RV_ SGT-COL-1684-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTOS CCEL08_058, CCEL08_059, AL1267_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 893 | 6/05/2020 | ACTAS SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATO 756 DE 2019 MES DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 894 | 6/05/2020 | P136-CODENSA-00906-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 895 | 6/05/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 05 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 896 | 7/05/2020 | EJECUCIÓN AL 04 DE MAYO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 897 | 7/05/2020 | EJECUCIÓN AL 08 DE MAYO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 898 | 7/05/2020 | PROGRAMACIÓN 08 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 899 | 7/05/2020 | DOCUMENTOS CORTE NO. 11 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 900 | 7/05/2020 | PUNTOS DE CÁMARA PARA CAMBIO DE RED DE CONEXIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 901 | 7/05/2020 | PUNTOS DE CÁMARA QUE REQUIEREN RESPUESTA INMEDIATA DE LA CONTRATISTA CODENSA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 902 | 7/05/2020 | PERSONAL CODENSA PARA ACTIVIDAD PUNTO DE CÁMARA ESU-148 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 903 | 8/05/2020 | PROGRAMACIÓN 01 DE JUNIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 904 | 8/05/2020 | REPARACIÓN EN CINTA DE CONCRETO CCEL10_17 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| 905 | 8/05/2020 | SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TAPAS ESPECIALES.2PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 906 | 8/05/2020 | SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TAPAS ESPECIALES | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 907 | 8/05/2020 | RV_ SGT-COL-1698-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGATIVÁ PUNTO AL1520 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 908 | 8/05/2020 | RV_ SGT-COL-1699-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTOS PAQ1-1, PAQ67, PAQ20 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 909 | 8/05/2020 | SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TAPAS ESPECIALES | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 910 | 8/05/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 07 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 911 | 9/05/2020 | CANCELACIÓN DE ACTIVIDAD CÁMARA SCJ17E100019.1 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 912 | 9/05/2020 | EJECUCIÓN AL 11 DE MAYO 2020.1PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 913 | 9/05/2020 | PRESUPUESTO CAMARA FVS-1204 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 914 | 9/05/2020 | PROGRAMACIÓN 09 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 915 | 9/05/2020 | PROGRAMACIÓN 11 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 916 | 9/05/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA372 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 917 | 9/05/2020 | PUNTO PARA PANEL SOLAR ESU-191 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 918 | 10/05/2020 | RV_ SGT-COL-1686-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTOS P520, P526, PCE23688 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 919 | 11/05/2020 | EJECUCIÓN AL 11 DE MAYO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 920 | 11/05/2020 | EJECUCIÓN AL 13 DE MAYO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 921 | 11/05/2020 | PROGRAMACIÓN 12 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 922 | 11/05/2020 | PROYECCIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 923 | 11/05/2020 | REPARACION CINTA DE CONCRETO CAJA AL805NO APLICA GARANTÍA | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 924 | 11/05/2020 | REPARACIÓN CINTA DE CONCRETA CAJA MB238NO APLICA GARANTÍA | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 925 | 11/05/2020 | OFICIOS CONCEPTO TÉCNICO TAPAS ESPECIALES Y CANALIZACIÓN PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA PUNTO DE CÁMARA AL1716 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 926 | 11/05/2020 | RV_ SGT-COL-1700-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTOS P375, CVID21864, P522 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 927 | 11/05/2020 | OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO CODENSA MES DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| 928 | 11/05/2020 | PROYECCIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 929 | 11/05/2020 | TAPAS PARA CAJA DE INSPECCIÓN ESPECIALES (ANTIVANDALISMO) | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 930 | 11/05/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 09 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 931 | 12/05/2020 | DATOS PARA DESCONEXIÓN DE TRAMO INSTALACIÓN DE CÁMARA | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 932 | 12/05/2020 | PRESUPUESTO CÁMARAS FVS-3613 Y SCJ17FJ0018_2 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 933 | 12/05/2020 | PROGRAMACIÓN 13 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 934 | 12/05/2020 | RV_ SGT-COL-1705-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTOS P529, PCE23676, ALB75, P370, CCEAD_L7_15, PCE20759 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 935 | 12/05/2020 | RV_ SGT-COL-1706-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTOS CCEL08_0038, P57_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 936 | 12/05/2020 | CORRECCIÓN 677 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 937 | 12/05/2020 | OFERTAS ECONÓMICAS PENDIENTES POR RADICAR | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 938 | 13/05/2020 | GARANTÍA CINTA DE CONCRETO CÁMARA CCEL08_0038 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 939 | 13/05/2020 | EJECUCIÓN AL 14 DE MAYO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 940 | 13/05/2020 | GARANTIA CINTA DE CONCRETO CAJA CVID21953 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 941 | 13/05/2020 | GARANTIA CINTA DE CONCRETO CAJA MB-241 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 942 | 13/05/2020 | GARANTIA CINTA DE CONCRETO CAJA P75 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 943 | 13/05/2020 | INGENIERÍA FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA373 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 944 | 13/05/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA374 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 945 | 13/05/2020 | RV_ SGT-COL-1708-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS AL409, PCE18689, AL2268, P444_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 946 | 13/05/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA374 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 947 | 13/05/2020 | CONCEPTO TÉCNICO TAPA ESPECIALES | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 948 | 14/05/2020 | PRESUPUESTOS CAMARAS | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 949 | 14/05/2020 | PROGRAMACIÓN 14 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 950 | 14/05/2020 | RV_ SGT-COL-1711-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS AL2451, CCEL19_092, AL2206, CCEL19_0017_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 951 | 14/05/2020 | RV_ SGT-COL-1712-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTO AL606_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 952 | 14/05/2020 | APROBACIÓN OFERTAS ECONÓMICAS PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 953 | 14/05/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 13 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 954 | 15/05/2020 | ACTAS SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATO 756 DE 2019 MES DE ABRIL DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 955 | 15/05/2020 | EJECUCIÓN AL 15 DE MAYO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 956 | 15/05/2020 | PROGRAMACIÓN 15 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 957 | 15/05/2020 | PROGRAMACIÓN 19 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 958 | 16/05/2020 | GARANTIA CINTA DE CONCRETO CAJA AL-2737 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 959 | 16/05/2020 | PRESUPUESTO CAMARA 350-5024 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 960 | 16/05/2020 | PRESUPUESTO CÁMARA ESU-157 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 961 | 16/05/2020 | PRESUPUESTO CAMARA FS_110104 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 962 | 16/05/2020 | PRESUPUESTO CAMARA FSC0012 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 963 | 16/05/2020 | PRESUPUESTO CÁMARA SCJ17E090002 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 964 | 16/05/2020 | PRESUPUESTO CAMARA SCJ17FJ0007_2 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 965 | 16/05/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA375 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 966 | 17/05/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA376 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 967 | 17/05/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA376 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 968 | 18/05/2020 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00940-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 969 | 18/05/2020 | EJECUCIÓN AL 19 DE MAYO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 970 | 18/05/2020 | P136-CODENSA-00906-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 971 | 18/05/2020 | PRESUPUESTO CAMARA SCJ17E120006 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 972 | 18/05/2020 | PROYECCIÓN ACTA NO.35 SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATO 756 DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 973 | 18/05/2020 | P136-CODENSA-00940-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| 974 | 18/05/2020 | PROYECCIÓN ACTA NO.35 SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATO 756 DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 975 | 18/05/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 15 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 976 | 19/05/2020 | PROGRAMACIÓN 20 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 977 | 19/05/2020 | REGISTRO FOTOGRÁFICO CÁMARA PCE23676 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 978 | 19/05/2020 | RV_ DP 20205410258211 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 979 | 19/05/2020 | RV_ SGT-COL-1716-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTOS PAQ31, P530_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 980 | 19/05/2020 | RV_ SGT-COL-1719-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS P442, AL2220, P459, AL2313_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 981 | 19/05/2020 | RV_ SGT-COL-1720-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUENTE ARANDA PUNTOS MB925, AL1967, P247, P246, AL333, MB946, AL1969 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 982 | 19/05/2020 | RV_ SGT-COL-1720-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUENTE ARANDA PUNTOS MB925, AL1967, P247, P246, AL333, MB946, AL1969_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 983 | 19/05/2020 | RV_ SGT-COL-1717-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUENTE ARANDA PUNTOS AL1738, MB965, AL1986, CVID22211, P242, AL2003, MB939 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 984 | 20/05/2020 | EJECUCIÓN AL 20 DE MAYO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 985 | 20/05/2020 | EJECUCIÓN AL 30 DE MAYO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 986 | 20/05/2020 | MANTENIMIENTO GARANTÍA CINTA DE CONCRETO CÁMARA P370 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 987 | 20/05/2020 | OFERTA CS280SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 988 | 20/05/2020 | PROGRAMACIÓN 21 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 989 | 20/05/2020 | SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TAPAS ESPECIALES.V2PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 990 | 20/05/2020 | RV_ SGT-COL-1722-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUENTE ARANDA PUNTOS PCE23861, AL353, AL1982, CVID22192, AL1965_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 991 | 20/05/2020 | RV_ SGT-COL-1723-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS AL414, PCE18750, CCEL19_116_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 992 | 20/05/2020 | AUTORIZACIÓN SEGUNDA ORDEN DE COMPRA TAPAS ESPECIALES | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 993 | 20/05/2020 | PUNTO DE CÁMARA MB1072 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 994 | 20/05/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CONDENA AL 20 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 995 | 20/05/2020 | SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO DE MEBOG PARA ACTIVIDADES CÁMARA AL1716 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 996 | 21/05/2020 | PRESUPUESTO CÁMARA SCJ17E010003 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 997 | 21/05/2020 | PRESUPUESTO CAMARA SCJ17E070001 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 998 | 21/05/2020 | PRESUPUESTO CAMARA SCJ17E160001 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 999 | 21/05/2020 | RE_ PROGRAMACIÓN 20 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1000 | 21/05/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA377 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1001 | 21/05/2020 | RV_ SGT-COL-1725-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUENTE ARANDA PUNTOS AL1957, AL1954, PCE26182, P237, AL348, P250_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1002 | 21/05/2020 | ACTA REUNIÓN SEGUIMIENTO SEMANAL 20 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1003 | 22/05/2020 | PRESUPUESTO CÁMARA ESU-157.1PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1004 | 22/05/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA378 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1005 | 23/05/2020 | CONCEPTO TÉCNICO PARA LA CONTINUIDAD DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA CON EL OPERADOR DE RED CODENSA S.A E.S.P., DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA DE BOGOTÁ. | CSS-P136-00160-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1006 | 23/05/2020 | CORRECCIÓN 677 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1007 | 23/05/2020 | PROGRAMACIÓN 26 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1008 | 23/05/2020 | CONCEPTO TÉCNICO CONTINUIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA SDSCJ Y CODENSA S.A E.S.P. RADICADO NO.20205410264131 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1009 | 24/05/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA379 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1010 | 24/05/2020 | RV_ SGT-COL-1727-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUENTE ARANDA PUNTO AL1959_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1011 | 24/05/2020 | RV_ SGT-COL-1728-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTO PCE24025_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1012 | 24/05/2020 | RV_ SGT-COL-1729-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS P465, CCEL19_0025, PCE21219, CCEL19_0010_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1013 | 25/05/2020 | APROBACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS ENVIADAS | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1014 | 26/05/2020 | OFICIOS CONCEPTO TÉCNICO TAPAS ESPECIALES Y CANALIZACIÓN PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA PUNTO DE CÁMARA AL1716 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1015 | 26/05/2020 | PROGRAMACIÓN 27 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1016 | 26/05/2020 | REASIGNACION DE ACTIVIDADES DE CAMARAS_ | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1017 | 26/05/2020 | RV_ SGT-COL-1730-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO TUNJUELITO PUNTO P413_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1018 | 26/05/2020 | RV_ SGT-COL-1731-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS CCEL19_0008, AL2307, AL2276, AL2309_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1019 | 27/05/2020 | CONCEPTO TÉCNICO CONTINUIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA SDSCJ Y CODENSA S.A E.S.P. RADICADO NO.20205410264131 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1020 | 27/05/2020 | DOCUMENTOS CORTE NO. 11 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1021 | 27/05/2020 | PROGRAMACIÓN 28 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1022 | 27/05/2020 | RE_ PROGRAMACIÓN 27 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1023 | 27/05/2020 | RV_ SGT-COL-1735-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO FONTIBÓN PUNTO MB533 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1024 | 28/05/2020 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-00980-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1025 | 28/05/2020 | PROGRAMACIÓN 29 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1026 | 28/05/2020 | RE_ REASIGNACION DE ACTIVIDADES DE CAMARAS_ | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1027 | 28/05/2020 | RV_ SGT-COL-1737-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO USME PUNTO AL1095_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1028 | 28/05/2020 | P136-CODENSA-00980-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1029 | 29/05/2020 | CANCELACIÓN DE ACTIVIDAD CÁMARA SCJ17E100019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1030 | 29/05/2020 | PROGRAMACIÓN 04 DE MAYO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1031 | 29/05/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA381 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1032 | 29/05/2020 | RV_ SGT-COL-1741-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO FONTIBÓN MB482, MB528_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1033 | 29/05/2020 | RV_ SGT-COL-1742-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO TUNJUELITO PUNTOS AL1178, CVID21830, MB30_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|--|--------------------|---|-------------------|
| 1034 | 29/05/2020 | RV_ SGT-COL-1743-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGATIVÁ PUNTO CVID24045_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1035 | 30/05/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA375 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1036 | 30/05/2020 | RV_ SGT-COL-1675-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTOS AL598, AL2737_ | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1037 | 30/05/2020 | RV_ SGT-COL-1676-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTOS CCEL08_0023, CVID21953, P75 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1038 | 30/05/2020 | OFICIOS CONCEPTO TÉCNICO TAPAS ESPECIALES Y CANALIZACIÓN PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA PUNTO DE CÁMARA AL1716 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1039 | 1/06/2020 | DATOS PARA DESCONEXIÓN DE TRAFIO INSTALACIÓN DE CAMARA.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1040 | 1/06/2020 | PRESUPUESTO CAMARA SCJ17E130003.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1041 | 1/06/2020 | PROGRAMACIÓN 01 DE JULIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1042 | 1/06/2020 | RV_ SGT-COL-1745-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGATIVÁ PUNTO AL1467_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1043 | 1/06/2020 | RV_ SGT-COL-1746-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO FONTIBÓN AL1408, AL1394, AL1393_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1044 | 1/06/2020 | RV_ SGT-COL-1747-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO USME PUNTOS AL947, AL1073_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1045 | 1/06/2020 | AVANCE EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 29 DE MAYO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1046 | 2/06/2020 | ACTAS SEGUIMIENTO SEMANAL_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1047 | 2/06/2020 | PRESUPUESTO CÁMARA FVS 4021.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1048 | 2/06/2020 | RE_ TERCERA RECORDACION VENCIMIENTO CARTERA CODENSA S.A. ESP_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1049 | 2/06/2020 | RV_ SGT-COL-1750-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGATIVÁ PUNTOS AL1455, AL1477_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|-----------|---|--------------------|---|-------------------|
| 1050 | 2/06/2020 | RV_ SGT-COL-1751-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO USME PUNTO CVID21784_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1051 | 2/06/2020 | RV_ SGT-COL-1752-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO RAFAEL URIBE URIBE PUNTOS AL388, AL2171_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1052 | 3/06/2020 | CRONOGRAMA ACTUALIZADO JUNIO 2020 (2).PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1053 | 3/06/2020 | CRONOGRAMA ACTUALIZADO JUNIO 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1054 | 3/06/2020 | CRONOGRAMA ACTUALIZADO.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1055 | 3/06/2020 | EJECUCIÓN AL 03 JUNIO 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1056 | 3/06/2020 | PROGRAMACIÓN 02 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1057 | 3/06/2020 | PROGRAMACIÓN 03 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1058 | 3/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 382 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1059 | 3/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 383 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1060 | 3/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 384 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1061 | 3/06/2020 | RV_ SGT-COL-1719-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS P442, AL2220, P459, AL2313_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1062 | 3/06/2020 | RV_ SGT-COL-1754-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS AL2461, CCEL19_030_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1063 | 3/06/2020 | RV_ SGT-COL-1755-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUENTE ARANDA PUNTO P218_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1064 | 3/06/2020 | RV_ SGT-COL-1756-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGATIVÁ PUNTOS CCEL10_17, CCEL10_25.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|-----------|---|----------------------|---|---|
| 1065 | 3/06/2020 | RV_ SGT-COL-1757-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO USME PUNTO AL172_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1066 | 3/06/2020 | RV_ SGT-COL-1758-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO RAFAEL URIBE URIBE PUNTO MB1080_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1067 | 3/06/2020 | RV_ SGT-COL-1759-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTO P465_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1068 | 3/06/2020 | CRONOGRAMA ACTUALIZADO.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1069 | 3/06/2020 | AVANCE EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 02 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1070 | 4/06/2020 | RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN NÚMERO 04 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y CODENSA S.A E.S.P | CSS-P136-00162-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1071 | 4/06/2020 | ALERTA SOBRE POSIBLE DAÑO Y PERDIDA DE GARANTÍA DE EQUIPOS INSTALADOS EN DATACENTER (BOMBEROS) Y C4, | CSS-P136-00163-2020 | SMARTY-SCAIN 2020 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1072 | 4/06/2020 | RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN NÚMERO 04 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y CODENSA S.A E.S.P. | P136-SSCJ-01006-2020 | SMARTY-SCAIN 2021 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1073 | 4/06/2020 | ACTA DE PRE CONCILIACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS MES DE MAYO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1074 | 4/06/2020 | PROGRAMACIÓN 04 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1075 | 4/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1761-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUENTE ARANDA PUNTO MB928, AL1963_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1076 | 4/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1762-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO USME PUNTOS AL991, AL982, CVID21797_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|-----------|---|---------------------------------|--|--|
| 1077 | 4/06/2020 | FWD_SGT-COL-1763-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGATIVÁ PUNTOS P99, P96_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1078 | 4/06/2020 | P136-SSCJ-01006-2020. RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN NÚMERO 04 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1079 | 5/06/2020 | DOCUMENTOS CORTE NO. 12.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1080 | 5/06/2020 | EJECUCIÓN AL 05 JUNIO 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1081 | 5/06/2020 | NIRZA.FRACICA@ESINCO.COM.CO SENT YOU FILES VÍA WETRANSFER.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1082 | 5/06/2020 | RE_SOLICITUD INFORMACIÓN DE CARACTERIZACIÓN DE REDES SECAS.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1083 | 6/06/2020 | PROGRAMACIÓN 05 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1084 | 6/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC- 780-CODENSA- 385 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1085 | 6/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC- 780-CODENSA- 386 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1086 | 6/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC- 780-CODENSA- 387 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1087 | 7/06/2020 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136- CODENSA- 01019-2020 | SMARTY- SCAIN 2022 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1088 | 7/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC- 780-CODENSA- 388 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1089 | 7/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC- 780-CODENSA- 389 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1090 | 7/06/2020 | P136-UTMTO-01016-2020-RESPUESTA A PROPUESTA ECONÓMICA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA E INSTALACIÓN DE LA TAPA DE SEGURIDAD.PDF | P136-UTMTO- 01016-2020 | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1091 | 7/06/2020 | VALOR PAGOS 2020 TERRITORIALIZACIÓN.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1092 | 7/06/2020 | P136-CODENSA-01019-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 .PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1093 | 7/06/2020 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 05 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1094 | 7/06/2020 | VALOR PAGOS 2020 TERRITORIALIZACIÓN.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
Contrato 1020 de 2019
Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
01/07/2020– 30/07/2020
Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|-----------|---|-------------------------|---|---|
| | | | | | JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1095 | 8/06/2020 | GARANTÍA CINTA DE CONCRETO CAJA DE PASO P246.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1096 | 8/06/2020 | OFERTA CAMARA FVS-2805 SITE SURVEY.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1097 | 8/06/2020 | PRESUPUESTO CAMARA SCJ17E090025 (SITE SURVEY).PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1098 | 8/06/2020 | PROGRAMACIÓN 08 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1099 | 8/06/2020 | REAPRACION CINTA DE CONCRETO AL1095 NO APLICA GARANTIA.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1100 | 8/06/2020 | REPARACIÓN DE CAJA AL353 NO APLICA GARANTIA.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1101 | 8/06/2020 | REPARACIÓN CINTA DE CONCRETO CÁMARA P530.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1102 | 8/06/2020 | FWD_ NOVEDADES - TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUENTE ARANDA.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1103 | 8/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1770-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGATIVÁ PUNTO AL1432_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1104 | 8/06/2020 | P136-CODENSA-01019-2020. INFORME DEL ESTADO ACTUAL PARA LAS CAJAS DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA DE BOGOTÁ D.C_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1105 | 9/06/2020 | TRASLADO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CARACTERIZACIÓN DE REDES SECAS PROYECTO FINDETER. | P136-CODENSA-01025-2020 | SMARTY-SCAIN 2023 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1106 | 9/06/2020 | EJECUCIÓN AL 08 JUNIO 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1107 | 9/06/2020 | OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1108 | 9/06/2020 | PROGRAMACIÓN 09 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1109 | 9/06/2020 | REPARACIÓN DE CAJA AL1957 NO APLICA GARANTIA.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1110 | 9/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1771-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGATIVÁ PUNTOS AL1441, AL1450, AL1543_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|--|---------------------------------|--|--|
| 1111 | 9/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1772-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO RAFAEL URIBE URIBE PUNTOS AL383, AL389, P135, PCE20064_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1112 | 9/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1773-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO USME PUNTOS AL857, CVID21659_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1113 | 9/06/2020 | INFORMACIÓN MODIFICATORIO NO.4.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1114 | 10/06/2020 | CONCEPTO TÉCNICO ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE TAPA ANTIVANDÁLICA, PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | CSS-P136- 00166-2020 | SMARTY- SCAIN 2024 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1115 | 10/06/2020 | APROBACIÓN INFORME MENSUAL MES DE MAYO DE 2020 | P136- CODENSA- 01031-2020 | SMARTY- SCAIN 2025 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1116 | 10/06/2020 | ACTA DE PRE CONCILIACIÓN AJUSTADA.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1117 | 10/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1720-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGATIVÁ PUNTOS CVID24048, P105, PCE19438_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1118 | 10/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1776-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO RAFAEL URIBE URIBE PUNTOS P136, P141_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1119 | 10/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1777-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGATIVÁ PUNTOS CVID24048, P105, PCE19438_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1120 | 10/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1778-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SAN CRISTÓBAL PUNTO AL1863_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1121 | 10/06/2020 | P136-CODENSA-01031-2020. APROBACIÓN INFORME MENSUAL MES DE MAYO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1122 | 11/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1780-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SAN CRISTÓBAL PUNTOS MB166, MB228_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|--|--------------------|---|---|
| 1123 | 11/06/2020 | FWD_SGT-COL-1781-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGATIVÁ PUNTO AL1439_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1124 | 11/06/2020 | OFICIOS RADICADOS ANTE LA SDSCJ.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1125 | 12/06/2020 | EJECUCIÓN AL 11 JUNIO 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1126 | 12/06/2020 | PRESUPUESTO CÁMARA 350-4812.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1127 | 12/06/2020 | PRESUPUESTO CÁMARA 350-4874.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1128 | 12/06/2020 | PRESUPUESTO CÁMARA FVS-4620.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1129 | 12/06/2020 | PRESUPUESTO CAMARA SCJ17E110081 V2.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1130 | 12/06/2020 | PRESUPUESTO CAMARA SCJ17E110081.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1131 | 12/06/2020 | PROGRAMACIÓN 10 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1132 | 12/06/2020 | FWD_SGT-COL-1782-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO LOS MÁRTIRES PUNTOS CCEL14_12, CVID22171, CVID22167, AL1708_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1133 | 12/06/2020 | FWD_SGT-COL-1783-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO RAFAEL URIBE URIBE PUNTO MB1095_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1134 | 14/06/2020 | PROGRAMACIÓN 12 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1135 | 14/06/2020 | PROGRAMACIÓN 30 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1136 | 14/06/2020 | SITE SURVEY SCJ17FJ0025.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1137 | 14/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 390 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1138 | 14/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 391 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1139 | 14/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 392 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1140 | 14/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 393 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1141 | 14/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 394 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1142 | 14/06/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 11 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | UT SMVC |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|---|-------------------------|---|---|
| 1143 | 16/06/2020 | APROBACIÓN DE COSTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE TAPAS ESPECIALES (ANTI - VANDALISMO). | P136-SSCJ-01046-2020 | SMARTY-SCAIN 2026 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1144 | 16/06/2020 | REGISTRO FOTOGRÁFICO CÁMARA SCJ17E010003.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1145 | 16/06/2020 | RE-P136-CODENSA-01019-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1146 | 16/06/2020 | SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TAPAS ESPECIALES.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1147 | 16/06/2020 | P136-SSCJ-01046-2020. APROBACIÓN DE COSTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE TAPAS ESPECIALES (ANTI - VANDALISMO)_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1148 | 17/06/2020 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-01057-2020 | SMARTY-SCAIN 2027 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1149 | 17/06/2020 | P136-CODENSA-01057-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1150 | 17/06/2020 | DAÑOS REPORTADOS POR FDL Y INTERVENTORÍA EN LAS CAJAS DE INSPECCIÓN DE LOS CONTRATOS IAD 601 Y 732ATO.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1151 | 17/06/2020 | OFICIOS RADICADOS ANTE LA SDSCJ.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1152 | 17/06/2020 | P136-CODENSA-01057-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1153 | 17/06/2020 | DAÑOS REPORTADOS POR FDL Y INTERVENTORÍA EN LAS CAJAS DE INSPECCIÓN DE LOS CONTRATOS IAD 601 Y 732ATO.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1154 | 18/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1784-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SAN CRISTÓBAL PUNTOS AL805, PCE22400_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|---|--------------------|---|---------------------|
| 1155 | 18/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1786-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTO CVID22088_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1156 | 18/06/2020 | P136-MEBOG-01066-2020.-VISITAS DE SITE SURVEY PARA EL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA 101 PROYECTO ESU UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1157 | 18/06/2020 | PUNTOS ESCALADOS A CODENSA CORTE 18-06-2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1158 | 18/06/2020 | SOLICITUD DEL DENUNCIÓ ANTE LA FISCALÍA PARA CORRECTIVOS ASIGNADOS EL 16 DE JUNIO DE 2020_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1159 | 18/06/2020 | SOLICITUD DEL DENUNCIÓ ANTE LA FISCALÍA PARA CORRECTIVOS ASIGNADOS EL 16 DE JUNIO DE 2020_ | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1160 | 19/06/2020 | AUTOMATIC REPLY_ PUNTOS ESCALADOS A CODENSA CORTE 18-06-2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1161 | 19/06/2020 | PROGRAMACIÓN 16 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1162 | 19/06/2020 | PROGRAMACIÓN 17 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1163 | 19/06/2020 | PROGRAMACIÓN 18 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1164 | 19/06/2020 | RV_ RECORDACION VENCIMIENTO CARTERA CODENSA S.A. ESP_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1165 | 19/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 395 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1166 | 19/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 396 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1167 | 20/06/2020 | RE_ SGT-COL-1790-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO LOS MÁRTIRES PUNTOS MB1196 CCEL14_01, CCEL14_02, AL1743, AL1720, AL1721, CCEL14_08, PCE26022, AL1729_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1168 | 22/06/2020 | PROGRAMACIÓN 19 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1169 | 22/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1787-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO LOS MÁRTIRES PUNTOS AL1709, MB1190, AL1742, AL1716, P188, MB1195_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1170 | 22/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1791-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SAN CRISTÓBAL PUNTOS MB241, CVID21726, CVID21697, MB243_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1171 | 23/06/2020 | EJECUCIÓN AL 23 JUNIO 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|--|--------------------|---|-------------------|
| 1172 | 23/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 397 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1173 | 23/06/2020 | FWD_ NOVEDADES MANTENIMIENTO 19 -21-JUNIO-2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1174 | 23/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1793-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO LOS MÁRTIRES PUNTOS MB1186, MB1183, CVID22152, AL1724, AL1722, CVID22166, P193, P194_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1175 | 23/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1794-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTO AL2750_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1176 | 23/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1795-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SAN CRISTÓBAL PUNTO MB209_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1177 | 24/06/2020 | EJECUCIÓN AL 24 JUNIO 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1178 | 24/06/2020 | PROGRAMACIÓN 23 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1179 | 24/06/2020 | PROGRAMACIÓN 24 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1180 | 24/06/2020 | RADICADO 02670118-RE_ SOLICITUD INFORMACIÓN DE CARACTERIZACIÓN DE REDES SECAS.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1181 | 24/06/2020 | RE_ EJECUCIÓN AL 18 JUNIO 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1182 | 24/06/2020 | SEGUNDA RECORDACION VENCIMIENTO CARTERA CODENSA S.A. ESP_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1183 | 24/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 398 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1184 | 24/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 399 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1185 | 24/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1797-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUENTE ARANDA PUNTOS AL1967, P247, AL333, P246, MB946, AL1969_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1186 | 24/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1798-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTOS CCEL11_053, AL2747, AL2616_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|--|-----------------------|--|------------------------|
| 1187 | 24/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1799-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SAN CRISTÓBAL PUNTOS P305, MB186, P313_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1188 | 24/06/2020 | INVITACIÓN PARA REALIZAR LECTURA DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO 756 DE 2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1189 | 24/06/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 24 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1190 | 25/06/2020 | FWD_ NOVEDADES MANTENIMIENTO 20-JUNIO-2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1191 | 25/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1805-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUENTE ARANDA PUNTOS MB925, AL1738, MB965, AL1986, CVID22211, AL2003, P242_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1192 | 25/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1806-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTO AL2737_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1193 | 25/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1807-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SAN CRISTÓBAL PUNTOS MB162, AL833, MB188, AL855_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1194 | 26/06/2020 | PROGRAMACIÓN 25 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1195 | 26/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1808-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUENTE ARANDA PUNTOS PCE23861, AL353, CVID22192, AL1965, AL1982, P225, P218_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1196 | 26/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1809-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTO CCEL11_103_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1197 | 26/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1810-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTOS AL1285, AL1241, PCE18805_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1198 | 27/06/2020 | EJECUCIÓN AL 26 JUNIO 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|---|-------------------------|---|---|
| 1199 | 29/06/2020 | OBSERVACIONES DE LA PRÓRROGA DEL PMT | P136-UTMTO-01101-2020 | SMARTY-SCAIN 2028 | UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 1200 | 30/06/2020 | RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN NÚMERO 04 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y CODENSA S.A E.S.P. | CSS-P136-00183-2020 | SMARTY-SCAIN 2029 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1201 | 30/06/2020 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-01109-2020 | SMARTY-SCAIN 2030 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1202 | 30/06/2020 | EJECUCIÓN AL 30 JUNIO 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1203 | 30/06/2020 | PROGRAMACIÓN 26 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1204 | 30/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 400 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1205 | 30/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 401 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1206 | 30/06/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 402 -2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1207 | 30/06/2020 | FWD_ NOVEDADES CICLO 3 MTTO BARRIOS UNIDOS.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1208 | 30/06/2020 | FWD_ SGT-COL-1812-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTOS CCEL11_062, P266, AL2585_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1209 | 30/06/2020 | MATRIZ LECTURA DE OBLIGACIONES.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1210 | 30/06/2020 | P136-CODENSA-01109-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1211 | 30/06/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 25 DE JUNIO DE 2020.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1212 | 30/06/2020 | OBSERVACIONES _ATENCIÓN DE PUNTOS PREVENTIVOS DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2020_.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1213 | 30/06/2020 | RADICADO MODIFICATORIO NO.4 CONTRATO 756 DE 2019.PDF | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1214 | 30/06/2020 | P136-CODENSA-01109-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_. | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1215 | 1/07/2020 | ACTIVIDADES INSTALACIÓN DE TAPAS ANTIVANDALISM1 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|-----------|---|--------------------|---|---------------------|
| 1216 | 1/07/2020 | FIRMAS ACTAS DE SEGUIMIENTO SEMANAL MES DE JUNIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1217 | 1/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 403 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1218 | 1/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 404 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1219 | 1/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1814-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTOS P75, CVID21956_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1220 | 1/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1815-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO LOS MÁRTIRES PUNTO P189_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1221 | 1/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1816-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUENTE ARANDA PUNTOS P250, AL1957, AL1963, AL1954, PCE26182, P237, AL348, MB928, AL1959_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1222 | 1/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1817-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTOS AL2730, CCEL11_158_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1223 | 1/07/2020 | ACTIVIDADES INSTALACIÓN DE TAPAS ANTIVANDALISMO | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1224 | 1/07/2020 | FIRMAS ACTAS DE SEGUIMIENTO SEMANAL MES DE JUNIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1225 | 1/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1814-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTOS P75, CVID21956 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1226 | 1/07/2020 | PUNTOS ESCALADOS A CODENSA CORTE 01-07-2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1227 | 1/07/2020 | AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 30 DE JUNIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1228 | 2/07/2020 | EJECUCIÓN AL 02 JUNIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1229 | 2/07/2020 | PROGRAMACIÓN 02 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1230 | 2/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 405 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1231 | 2/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 406 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1232 | 2/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1818-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTOS AL223_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|-----------|--|-----------------------|--|----------------------|
| 1233 | 2/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1819-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTOS AL2728, CCEL11_003_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1234 | 2/07/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 02 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1235 | 3/07/2020 | FWD_ P136-SSCJ-00997-2020- REPORTE DE NOVEDAD PRESENTADA EN EL PUNTO 5243 UBICADO EN LA PLAZA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 350_ | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1236 | 3/07/2020 | PROGRAMACIÓN 03 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1237 | 3/07/2020 | RV_ CONCILIACIÓN ENTREGA NO 18 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1238 | 3/07/2020 | FWD_ P136-SSCJ-00997-2020- REPORTE DE NOVEDAD PRESENTADA EN EL PUNTO 5243 UBICADO EN LA PLAZA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 350_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1239 | 3/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1820-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHAPINERO PUNTO P3_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1240 | 3/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1821-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTOS CCEL11_099, AL2714, CCEL11_051, PCE20834_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1241 | 3/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1822-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTOS AL204, AL1249_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1242 | 5/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC- 780-CODENSA- 407 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1243 | 5/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC- 780-CODENSA- 408 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1244 | 5/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC- 780-CODENSA- 409 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1245 | 5/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC- 780-CODENSA- 407 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1246 | 6/07/2020 | ACTA REUNIÓN LECTURA DE OBLIGACIONES Y SEGUIMIENTO SEMANAL AL CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1247 | 6/07/2020 | ACTIVIDADES INSTALACIÓN DE TAPAS ANTIVANDALISMO | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|-----------|--|--------------------|---|---------------------|
| 1248 | 6/07/2020 | CONCILIACIÓN V.F | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1249 | 6/07/2020 | CONCILIACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1250 | 6/07/2020 | EJECUCIÓN AL 06 JULIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1251 | 6/07/2020 | PROGRAMACIÓN 06 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1252 | 6/07/2020 | RESPUESTA AUTOMÁTICA_ ACTA REUNIÓN LECTURA DE OBLIGACIONES Y SEGUIMIENTO SEMANAL AL CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1253 | 6/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 410 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1254 | 6/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1823-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO RAFAEL URIBE URIBE PUNTO AL2185_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1255 | 6/07/2020 | ACTA REUNIÓN LECTURA DE OBLIGACIONES Y SEGUIMIENTO SEMANAL AL CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1256 | 6/07/2020 | CONCILIACIÓN FACTURA NO. 13 MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1257 | 6/07/2020 | CONCILIACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1258 | 6/07/2020 | ATENCIÓN DE PUNTOS PREVENTIVOS DEL 06 AL 30 DE JULIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1259 | 7/07/2020 | AJUSTE CONCILIACIÓN NO.13 MES DE JUNIO DE2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1260 | 7/07/2020 | DOCUMENTOS CORTE NO. 13 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1261 | 7/07/2020 | PROGRAMACIÓN 07 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1262 | 7/07/2020 | CSS-P136-00192-2020 - SOLICITUD DE TRASLADO DEL PUNTO CCEL04_011 LOCALIDAD DE SANTA FE_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1263 | 7/07/2020 | FWD_ NOVEDADES CICLO 3 MTTO TEUSAQUILLO | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1264 | 7/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1827-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO TUNJUELITO PUNTO P413_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|-----------|--|---------------------------------|--|------------------------|
| 1265 | 7/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1828-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTOS CCEL08_058, CCEL08_059, AL1291_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1266 | 7/07/2020 | AJUSTE CONCILIACIÓN NO.13 MES DE JUNIO DE2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1267 | 7/07/2020 | P136-MEBOG-01121-2020.-VISITAS DE SITE SURVEY PARA LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA PAQ62 PROYECTO ALCALDÍAS Y SCJ17E070048 | P136-MEBOG- 01121-2020 | SMARTY- SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1268 | 8/07/2020 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136- CODENSA- 01130-2020 | SMARTY- SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1269 | 8/07/2020 | EJECUCIÓN AL 08 JULIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1270 | 8/07/2020 | P136-CODENSA-01130-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_ | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1271 | 8/07/2020 | PROGRAMACIÓN 08 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1272 | 8/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1834-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO LOS MÁRTIRES PUNTO AL1743_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1273 | 8/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1835-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTOS CCEL11_028, CCEL11_092, CCEL11_020, AL606_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1274 | 8/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1835-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTOS CCEL11_028, CCEL11_092, CCEL11_020, AL606_1 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1275 | 8/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1836-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTO CVID21953_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1276 | 8/07/2020 | MODIFICATORIO N4 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1277 | 8/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1835-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBA PUNTOS CCEL11_028, CCEL11_092, CCEL11_020, AL606 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|--|-------------------------|---|---|
| 1278 | 8/07/2020 | P136-CODENSA-01130-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-01130-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1279 | 8/07/2020 | SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS PARA EL CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1280 | 8/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 410 -2019 (PUNTO DESCARTADO PARA SOLUCIÓN POR CODENSA PANEL SOLAR) | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1281 | 9/07/2020 | EJECUCIÓN AL 09 JULIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1282 | 9/07/2020 | PROGRAMACIÓN 09 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1283 | 9/07/2020 | PROGRAMACIÓN 10 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1284 | 9/07/2020 | RADICADO DENUNCIO DAÑO EN BIEN AJENO | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1285 | 9/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 411 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1286 | 9/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 412 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1287 | 9/07/2020 | SDM-SPMT-99439-20 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1288 | 9/07/2020 | RADICADO DENUNCIO DAÑO EN BIEN AJENO | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1289 | 9/07/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 08 D JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1290 | 10/07/2020 | SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS PARA EL CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1291 | 10/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 413 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1292 | 10/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1839-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO TUNJUELITO PUNTOS MB301, AL1178, CVID21830_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1293 | 10/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1840-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO SAN CRISTÓBAL PUNTO AL801_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1294 | 10/07/2020 | ADICIÓN PARA FIRMA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1295 | 10/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 413 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1296 | 10/07/2020 | ATENCIÓN DE PUNTOS PREVENTIVOS DEL 10 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1297 | 11/07/2020 | EJECUCIÓN AL 10 JULIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|--|--------------------|---|---|
| 1298 | 11/07/2020 | PROGRAMACIÓN 13 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1299 | 11/07/2020 | ATENCIÓN DE PUNTOS PREVENTIVOS DEL 11 AL 30 DE JULIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1300 | 11/07/2020 | ATENCIÓN DE PUNTOS PREVENTIVOS DEL 13 AL 30 DE JULIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1301 | 12/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1837-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTO AL1313_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1302 | 13/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1841-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTOS AL1326, CVID21911_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1303 | 13/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1842-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTOS PAQ34, P375, PCE23676_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1304 | 13/07/2020 | DOCUMENTOS CORTE NO. 13 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1305 | 13/07/2020 | PUNTO DE CÁMARA CCEL04_011 LOCALIDAD DE SANTA FE | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1306 | 14/07/2020 | ACEPTADA_ INVITACIÓN ACTUALIZADA_ REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CONTRATO 756 DE 2019 MIÉRCOLES 15 DE JUL DE 2020 3PM - 5PM (COT) (DAVID.AVILA@ENEL.COM) | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1307 | 14/07/2020 | DENUNCIOS ANTE LA FISCALIA | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1308 | 14/07/2020 | EJECUCIÓN AL 13 JULIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1309 | 14/07/2020 | ENTREGA # 19 SECRETARIA DISTRITAL | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1310 | 14/07/2020 | PROGRAMACIÓN 14 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1311 | 14/07/2020 | PROGRAMACIÓN 15 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1312 | 14/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 414 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1313 | 14/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTSMVC-780-CODENSA- 415 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|--|---------------------------------|--|------------------------|
| 1314 | 14/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1847-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTO PCE24025_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1315 | 14/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1848-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTO AL2341_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1316 | 14/07/2020 | CANCELAR ACTIVIDADES DUPLICADAS EN ASIGNACIÓN DE 16 Y 30 DE JUNIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1317 | 14/07/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 13 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1318 | 15/07/2020 | P136-CODENSA-01130-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019_1 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1319 | 15/07/2020 | PROGRAMACIÓN 16 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1320 | 15/07/2020 | RV_ PROYECCIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD - 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1321 | 15/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1846-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTOS P370, P367, ALB106, ALB105, ALB116_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1322 | 15/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1854-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTO AL1372_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1323 | 15/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1855-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTOS CCEL08_0038, AL1358_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1324 | 15/07/2020 | P136-UTMTO-01163-2020 SOLICITUD DE DESMONTE DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA PAQ62, CVID21953 PROYECTO Y SCJ17E070048 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1325 | 16/07/2020 | RECOMENDACIÓN PARA CIERRE DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136- CODENSA- 01178-2020 | SMARTY- SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1326 | 16/07/2020 | PROGRAMACIÓN 17 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1327 | 16/07/2020 | ACTA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1328 | 16/07/2020 | P136-CODENSA-01178-2020. RECOMENDACIÓN PARA CIERRE DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136- CODENSA- 01178-2020 | SMARTY- SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
Contrato 1020 de 2019
Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
01/07/2020– 30/07/2020
Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|---|-------------------------|---|---------------------|
| 1329 | 17/07/2020 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-01181-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1330 | 17/07/2020 | CARTA DENUNCIO DE LA FISCALÍA | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1331 | 17/07/2020 | EJECUCIÓN AL 16 JULIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1332 | 17/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 416 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1333 | 17/07/2020 | DENUNCIA CON RADICADO 110016000021202050363 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1334 | 17/07/2020 | P136-CODENSA-01181-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-01181-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1335 | 17/07/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 16 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1336 | 20/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1858-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS AL2220, AL2299_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1337 | 20/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1859-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTOS CCEAD_L7_23, PAQ1-1, PAQ1, SGT4_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1338 | 20/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1860-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTOS CCEL08_044, CCEL08_045 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1339 | 21/07/2020 | ACEPTADA_ INVITACIÓN_ REUNIÓN DE SEGUIMIENTO JUE 23 DE JUL DE 2020 9AM - 11AM (COT) (DAVID.AVILA@ENEL.COM) | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1340 | 21/07/2020 | EJECUCIÓN AL 21 JULIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1341 | 21/07/2020 | PROGRAMACIÓN 21 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1342 | 21/07/2020 | FWD_ NOVEDADES CICLO 3 MTTO USAQUEN 1 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1343 | 21/07/2020 | FWD_ NOVEDADES CICLO 3 MTTO USAQUEN | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|--|-----------------------|--|--|
| 1344 | 21/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1862-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS P442, P444, AL2268, AL409_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1345 | 21/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1863-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTOS MB415-1, P518_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1346 | 21/07/2020 | INTERVENCIONES NO PROGRAMADAS DEL 13 AL 20 DE JULIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1347 | 21/07/2020 | ATENCIÓN PREVENTIVOS DEL 21 AL 30 DE JULIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1348 | 21/07/2020 | ATENCIÓN PREVENTIVOS DEL 21 AL 30 DE JULIO 20201 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1349 | 22/07/2020 | AL2585 INSTALACION DE TAPA ANTI VANDALICA | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1350 | 22/07/2020 | PROGRAMACIÓN 23 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1351 | 22/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1867-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTO PCE23688_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1352 | 22/07/2020 | AL2585 INSTALACION DE TAPA ANTI VANDALICA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1353 | 22/07/2020 | ATENCION PREVENTIVOS DEL DEL 22 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY- SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1354 | 23/07/2020 | EJECUCIÓN AL 22 JULIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1355 | 23/07/2020 | INFORME # 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO INSTALACION DE TAPAS ANTI-VANDALICAS | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1356 | 23/07/2020 | INFORME PARCIAL CORTE 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO TAPAS ANTIVANDÁLICAS | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1357 | 23/07/2020 | INFORME TAPAS ANTI-VANDÁLICAS | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1358 | 23/07/2020 | P136-CODENSA-01181-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 (CRONOGRAMA FINAL) | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|--|---------------------|---|---|
| 1359 | 23/07/2020 | PROGRAMACIÓN 24 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1360 | 23/07/2020 | SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS PARA EL CONTRATO 756 DE 2019(SUBSANACIÓN) | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1361 | 23/07/2020 | ATENCION PREVENTIVOS DEL DEL 22 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1362 | 23/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1865-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTO CCEL19_030_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1363 | 23/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1866-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTO AL1309_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1364 | 24/07/2020 | INSUMO PARA DAR RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN DE LA LOCALIDAD CHAPINERO CON RADICADO 2020- 5410333651. | CSS-P136-00209-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1365 | 24/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1868-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS CCEL19_111 AL2451 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1366 | 24/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1869-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO KENNEDY PUNTOS AL210, AL1344_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1367 | 24/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1870-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTOS CVID21864, P532_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1368 | 24/07/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 22 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1369 | 24/07/2020 | CSS-P136-00209-2020 - INSUMO PARA DAR RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN DE LA LOCALIDAD CHAPINERO CON RADICADO 2020 - 5410333651_ | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1370 | 25/07/2020 | PROGRAMACIÓN 25 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1371 | 27/07/2020 | FALLA ELÉCTRICA NO ATENDIDA CÁMARA AL 1278 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|--|-----------------------|---|---------------------|
| 1372 | 27/07/2020 | FALLA ELÉCTRICA NO ATENDIDA CÁMARA FVS-3009 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1373 | 27/07/2020 | PROGRAMACIÓN 27 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1374 | 27/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 417 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1375 | 27/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1873-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS AL505, P465, P459_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1376 | 27/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1877-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTO CCAD_L7_111_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1377 | 27/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 417 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1378 | 27/07/2020 | FWD_ P136-SSCJ-00997-2020- REPORTE DE NOVEDAD PRESENTADA EN EL PUNTO 5243 UBICADO EN LA PLAZA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 350 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1379 | 27/07/2020 | P136-MEBOG-01203-2020.-SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA AL1278 | P136-MEBOG-01203-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1380 | 27/07/2020 | FALLA ELÉCTRICA NO ATENDIDA CÁMARA AL 1278 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1381 | 27/07/2020 | FALLA ELÉCTRICA NO ATENDIDA CÁMARA FVS-3009 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1382 | 28/07/2020 | EJECUCIÓN AL 28 JULIO 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1383 | 28/07/2020 | INFORME # 3 - REGISTRO FOTOGRAFICO INSTALACION DE TAPAS ANTI-VANDALICAS | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1384 | 28/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 418 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1385 | 28/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1878-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO FONTIBÓN PUNTO MB482_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1386 | 28/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1879-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTO PAQ67_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1387 | 28/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 418 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|--|-------------------------|---|---|
| 1388 | 28/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 402 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1389 | 29/07/2020 | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 756 DE 2019. | CSS-P136-00211-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1390 | 29/07/2020 | ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-01210-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1391 | 29/07/2020 | CRONOGRAMA ACTUALIZADO SECRETARÍA V2 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1392 | 29/07/2020 | PROGRAMACIÓN 29 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | CODENSA S.A. E.S.P. | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1393 | 29/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 419 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | UT SMVC | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1394 | 29/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1881-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS CCEL19_040, MB1104, PCE18750_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1395 | 29/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1882-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSA PUNTOS PAQ20, P522_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1396 | 29/07/2020 | RV_ ÓRDENES DE PAGO CTO 756 DE 914 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1397 | 29/07/2020 | DOCUMENTOS SOLICITADOS | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1398 | 29/07/2020 | FALLO PUNTO CODENSA UTMVC-780-CODENSA- 419 -2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1399 | 29/07/2020 | P136-CODENSA-01210-2020. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO 756 DE 2019 | P136-CODENSA-01210-2020 | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1400 | 29/07/2020 | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CODENSA AL 28 DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1401 | 29/07/2020 | CSS-P136-00211-2020-RADICADO VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1402 | 29/07/2020 | FWD_ ATENCIÓN DE PUNTOS PREVENTIVOS DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|------|------------|---|--------------------|---|---|
| 1403 | 29/07/2020 | RADICADO VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 1404 | 30/07/2020 | FWD_ SGT-COL-1883-20 NOTIFICACIÓN NOVEDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIUDAD BOLÍVAR PUNTOS AL2206, CCEL19_0017_ | CORREO ELECTRÓNICO | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C | SMARTY-SCAIN 2019 |
| 1405 | 30/07/2020 | ACTA SEMANA 44 PARA FIRMA | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | CODENSA S.A. E.S.P. |
| 1406 | 30/07/2020 | PUNTOS ESCALADOS A CODENSA CORTE 30-07-2020 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | UT SMVC |
| 1407 | 30/07/2020 | RADICADO MODIFICATORIO NO.4 CONTRATO 756 DE 2019 | CORREO ELECTRÓNICO | SMARTY-SCAIN 2019 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |

Tabla 142. Comunicaciones CODENSA S.A. E.S.P.

5.3 ESTADO GENERAL FINANCIERO

Para el presente informe se presenta el avance en la ejecución del contrato donde a la fecha se encuentran aún pendientes por facturar el valor de ciento ochenta y seis millones seiscientos ochenta y tres mil cuatrocientos dieciséis pesos M/CTE (\$ 186.683.416), lo cual corresponde al tres porcientos (3%) del valor total del contrato 756 de 2019, por valor de Cinco mil seiscientos tres millones trescientos sesenta y dos mil setecientos noventa pesos M/CTE (\$ 5.603.362.790), como se aprecia en la tabla No.143.

| DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) |
|---|------------------|------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO | \$ 5.020.613.340 | 90% |
| VALOR ADICION 1 | \$ 582.749.450 | 10% |
| VAOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 5.603.362.790 | 100% |
| VALOR FACTURADO | \$ 5.087.892.881 | 91% |
| VALOR LIBERADO A LOS FONDOS DE LA SDSCJ (*) | \$ 328.786.492 | 6% |
| VALOR PENDIENTE POR FACTURAR | \$ 186.683.417 | 3% |

Tabla 143. Estado Financiero Contrato 756 de 2019 IVA incluido

(*) El presente valor se reintegró a los fondos de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, por solicitud del supervisor del contrato; estos dineros quedaron debidamente soportados en el modificadorio No. 2 firmado el pasado 20 de diciembre de 2019.

De conformidad con lo descrito en el “Anexo No. 02 – Cláusulas Específicas”, apartado “Obligaciones de Carácter Administrativo, Financiero y Contable”, La Interventoría para este período, realizó el correspondiente seguimiento y acompañamiento a la ejecución de los recursos asignados al contrato, así:

5.3.1 SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Se presenta a continuación, la proyección de los valores pendientes por pagar los cuales corresponden a las actividades ejecutadas durante el mes de julio de 2020, del cual el acta de conciliación No.14 aún no se descuenta del presupuesto de Cinco mil seiscientos tres millones trecientos sesenta y dos mil setecientos noventa pesos M/CTE (\$ 5.603.362.790) del presupuesto establecido para la ejecución del contrato, de acuerdo a la tabla No.144:

| CONCILIACION | PERIODO | CONEXIONES | MANTENIMIENTOS | VALOR TOTAL | ESTADO DEL PROCESO DE FACTURACIÓN |
|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---|
| ACTA NO. 14 | JULIO DE 2020 | \$ 0 | \$ 168.708.337 | \$ 168.708.337 | POR RADICAR EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 |
| VALOR TOTAL CONCILIACION | | \$ 0 | \$ 168.708.337 | \$ 168.708.337 | |

Tabla 144. Seguimiento Presupuestal contrato 756 de 2019 para el mes de julio de 2020

5.4 SEGUIMIENTO JURÍDICO

La presente relación da cuenta del estado legal del contrato al 30 de julio de 2020.

| INFORMACIÓN CONTRACTUAL | |
|----------------------------|--|
| No. CONTRATO | 756 DE 2019 |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN |
| NOMBRE CONTRATISTA | CODENSA S.A. E.S.P. |
| FECHA DE CONTRATO | 12-MAR-19 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 18-MAR-19 |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 5.020.613.340 |
| OBJETO CONTRACTUAL | CONTRATAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SDSCJ, EN LAS VEINTE (20) LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PÚBLICA DE LA CIUDAD, ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | 6 MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO |
| MODIFICATORIO NO 01 | 3 MESES 23 DÍAS |
| MODIFICATORIO NO 02 | 2 MESES 27 DÍAS |
| MODIFICATORIO NO 03 | 3 MESES 0 DÍAS |
| MODIFICATORIO NO 04 | 24 DÍAS |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | 16 MESES 13 DÍAS |
| VALOR ADICIÓN AL CONTRATO | \$ 582.749.450 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$ 5.603.362.790 |
| ESTADO JURÍDICO | EN LIQUIDACIÓN |

Tabla 145. Información Contractual CODENSA

A la fecha de elaboración del presente informe, se da inicio al proceso de liquidación del contrato 756 de 2019 una vez se cumple con la fecha de finalización de las actividades contempladas en el acuerdo celebrado el pasado 12 de marzo de 2019, el cual fue modificado en cuatro ocasiones, siendo esta última en la cual se estableció la fecha definitiva para la finalización del contrato (30 de julio de 2020), de donde se establece que no es necesaria la opción de realizar una nueva modificación, quedando a la espera de un contrato nuevo si este fuera el caso.

5.4.1 Garantías

En atención a la verificación del cumplimiento de la obligación contractual señalada en la cláusula séptima, literal c en su numeral 5 del contrato de interventoría No. 1020 de 2019, que prescribe:

“(...) 5). Verificar durante la vigencia de los proyectos, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en los contratos. (...)”

La interventoría procedió con la validación jurídica de cada una de las garantías exigidas a los contratistas en el marco de cada uno de los contratos tal como se describe en el capítulo del respectivo contrato, identificando que los amparos constituidos en cada una de las pólizas se ajustan a los términos y condiciones establecidos contractualmente, como en lo contemplado en el libro 2 parte 2 título 1 capítulo 2 de la sección 3 del Decreto 1082 de 2015, así:

| Tipo de póliza | Requerimiento | Numero de póliza | Desde | hasta | valor | Verificación |
|--|---|------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|
| Cumplimiento | El valor asegurado debe ser equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y SEIS (6) MESES más, en todo caso debe estar vigente para la liquidación del contrato. Este amparo debe constituirse desde la fecha de suscripción del contrato. | 2323843-6 | 18-mar-19 | 30-ene-21 | \$ 1.120.672.558,00 | CUMPLE |
| Calidad del servicio | Calidad del servicio: Por el monto de equivalente al VEINTE por ciento 20% del valor del contrato, por el término de ejecución del contrato y DOS (2) AÑOS más, en todo caso debe estar vigente para la liquidación del contrato. Este amparo debe constituirse desde la fecha de suscripción del contrato | 2323843-6 | 30-jul-20 | 30-jul-22 | \$ 1.120.672.558,00 | CUMPLE |
| Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | El valor asegurado debe ser equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y tres (3) años más. Este amparo debe constituirse desde la fecha de suscripción del contrato. | 2323843-6 | 18-mar-19 | 30-jul-23 | 280.168.139,50 | CUMPLE |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| Tipo de póliza | Requerimiento | Numero de póliza | Desde | hasta | valor | Verificación |
|---|---|------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|
| Calidad y funcionamiento correcto de los bienes | El valor asegurado debe ser equivalente al VEINTE por ciento 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y DOS (2) AÑOS más. | 2323843-6 | 30-jul-20 | 30-jul-22 | \$ 1.120.672.558,00 | CUMPLE |
| Responsabilidad Civil Extracontractual: | Por una cuantía equivalente 500 SMMLV con una duración igual al plazo de ejecución del mismo | 0617694-0 | 18-mar-20 | 30-jul-20 | \$ 438.901.500,00 | CUMPLE |

Tabla 146. Garantías – CODENSA

5.5 SEGUIMIENTO TÉCNICO

Respecto al seguimiento de las actividades en el orden técnico ejecutadas por el Contratista Codensa S.A E.S.P., la Interventoría realizó el correspondiente acompañamiento de las mismas, como resultados que se enuncian los seguidamente para el mes de julio de 2020:

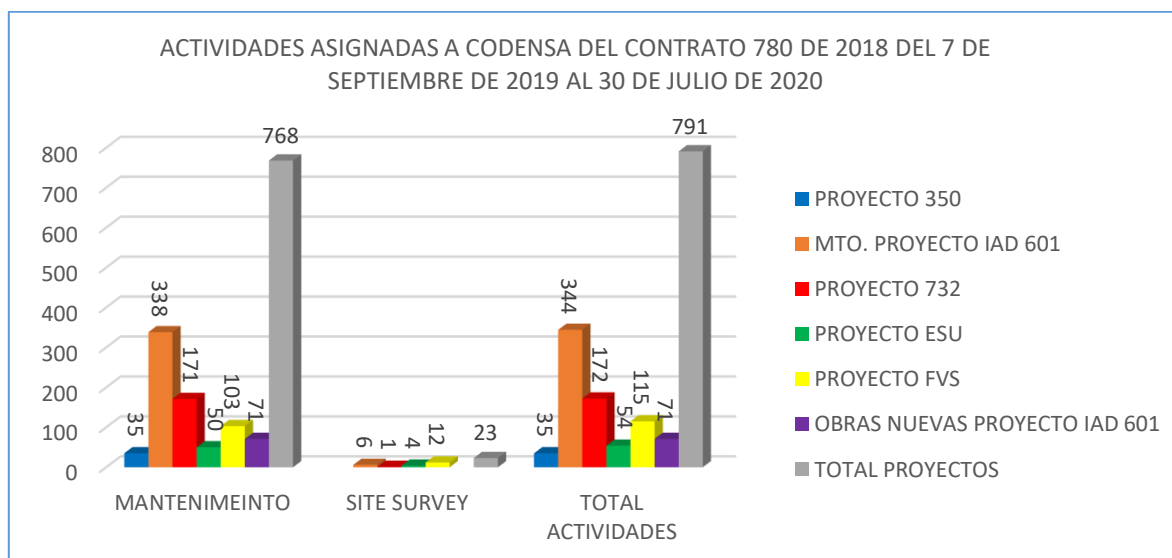


Ilustración 2. Actividades asignadas a CODENSA S.A E.S.P., contrato 780 de 2019

La ilustración anterior refleja el total de actividades asignadas por esta interventoría al contratista CODENSA S.A E.S.P.; durante su gestión desde el 07 de septiembre de 2019 al 30 de Julio de 2020, para atender a los diferentes requerimientos solicitados por parte del contrato de mantenimiento 780 de 2019 y los requerimientos solicitados por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), los que corresponden a la atención de mantenimientos por garantías para subsanar las cajas de inspección CS274 por daños en los acabados y estructuras realizadas en los puntos de cámara nuevos de los contratos IAD 601 y 732 de 2017, restaurar tapas vandalizadas por terceros y construcción de cajas de inspección por daños ocasionados por tercero; a su vez se han atendido las garantías por fallas en las redes de distribución del operador de red Codensa S.A E.S.P., para el contrato 583 de 2017 y los proyectos ESU, 350 y FVS respectivamente, incluyendo

también las actividades requeridas de visitas conjuntas para solucionar definitivamente las fallas reportadas y asociadas a los puntos de cámaras del sistema de videovigilancia ciudadana del Distrito Capital.

5.5.1 Actividades de mantenimiento ejecutadas frente al contrato 780 de 2019

Para el periodo comprendido del 07 de septiembre de 2019 al 30 de julio de 2020, se han asignado por parte de la Interventoría 791 solicitudes para la atención de las diferentes actividades contempladas en el objeto del contrato 756 de 2019, tales como mantenimientos, site survey, construcción de cajas de inspección CS274 y energizaciones nuevas para los puntos de cámaras del sistema de videovigilancia de la ciudad de Bogotá D.C.

En el mes de julio de 2020, se asignaron 34 solicitudes. De igual manera, el contratista atendió dio cumplimiento a los requerimientos asignados durante el mes de julio de 2020 y un número de actividades pendientes del mes anterior, lo que se puede evidenciar de acuerdo a la siguiente distribución, partiendo del tipo de mantenimientos atendido comprendido en correctivos y garantías, para un total de 125 actividades ejecutadas, las cuales se dividen en: 3 garantías por obras civiles, las cuales se ejecutaron para los contratos 732 de 2017 y 601 de 2017; 20 mantenimientos correspondientes a actividades correctivas de fallas eléctricas a los proyectos 732 de 2017, IAD 601 de 2017, FVS, ESU y 350; 5 cambios de punto de conexión de red de alumbrado público a red de uso comercial y 100 cambios de tapas vandalizadas en las distintas localidades de la ciudad.

A la fecha del presente informe, se realizaron un total de 620 visitas efectivas, dando solución definitiva a las fallas reportadas por el contrato 780 de 2019. A su vez, se cancelaron un total de 31 actividades debido a distintas causas como las intermitencias presentadas en las redes del operador de red Codensa S.A E.S.P., solucionándose por sí solas posterior a la fecha del reporte emitido por el contratista UT SMVC y actividades canceladas por esta interventoría para dar prioridad a casos de mayor prioridad para ser atendidos por Codensa S.A E.S.P.

Una vez se concluye el tiempo de ejecución del contrato 756 de 2019 el 30 de julio de 2020, se dejaron de atender un total de 61 actividades comprendidas en 51 garantías por daños presentados en la estructura de las cajas de inspección CS274 y 10 reconstrucciones totales en las cajas de inspección CS274 por daños causados por terceros de acuerdo a los reportes emitidos por los distintos fondos de desarrollo local de la ciudad.

En nuestra calidad de interventores bajo el contrato 1020 de 2019, suscrito con la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, informamos que, al cierre del presente informe, Codensa S.A E.S.P., reporta 12 puntos de cámaras, en los cuales no es posible realizar actividades para cambiar su actual punto de conexión de la red de alumbrado público a la red de uso comercial, como se evidencia en la tabla No.145. Esto obedece, a que no se encuentra infraestructura en redes de baja tensión asociadas a la distribución de uso comercial y/o residencial en las cuales se pueda realizar los cambios para solucionar de manera definitiva las fallas eléctricas reportadas por el componente de mantenimiento.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| FECHA DE ASIGNACIÓN | CODIGO DE CÁMARA | DIRECCIÓN | PROYECTO | ACTIVIDAD | Comunicado de interventoría | Fecha atención del Mto. |
|---------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| 24/09/2019 | SCJ17E090027 | AK 72 AC 26 | PROYECTO 732 | MANTENIMIENTO | P136-CODENSA-00062-2019 | 9/10/2019 |
| 24/09/2019 | SCJ17E090017 | KR 68 D CL 24 | PROYECTO 732 | MANTENIMIENTO | P136-CODENSA-00062-2019 | 3/10/2019 |
| 11/10/2019 | SCJ17E100025 | CL 87 KR 69 | PROYECTO 732 | MANTENIMIENTO | P136-CODENSA-00153-2019 | 7/11/2019 |
| 17/10/2019 | FVS-2401 | AV BOYACA 24 SUR | PROYECTO FVS | MANTENIMIENTO | P136-CODENSA-00189-2019 | 19/10/2019 |
| 21/10/2019 | FVS-3609 | AC 26 KR 68 | PROYECTO FVS | MANTENIMIENTO | P136-CODENSA-00189-2019 | 7/11/2019 |
| 26/11/2019 | SCJ17E110023 | CL 151 KR 101 | PROYECTO 732 | MANTENIMIENTO | P136-CODENSA-00392-2019 | 5/12/2019 |
| 26/11/2019 | SCJ17E090067 | CL 24 KR 68 A | PROYECTO 732 | MANTENIMIENTO | P136-CODENSA-00392-2019 | 4/12/2019 |
| 23/01/2020 | FVS-1202 | DG 92 TV 20 | PROYECTO FVS | MANTENIMIENTO | P136-CODENSA-00614-2020 | 5/02/2020 |
| 17/02/2020 | 350-4932 | CL 52 F SUR KR 24 C | PROYECTO 350 | MANTENIMIENTO | P136-CODENSA-00668-2020 | 21/02/2020 |
| 24/02/2020 | ESU-157 | KR 68 CL 78 | PROYECTO ESU | MANTENIMIENTO | P136-CODENSA-00705-2020 | 31/03/2020 |
| 7/04/2020 | SCJ17E090078 | CL 24 A KR 69 | PROYECTO 732 | MANTENIMIENTO | P136-CODENSA-00839-2020 | 20/04/2020 |
| 06/05/2020 | SCJ17E090072 | KR 86 AC 17 | PROYECTO 732 | MANTENIMIENTO | GARANTIA | 13/05/2020 |

Tabla 147. Acumulados puntos sin cambio de red de alumbrado público a red de uso comercial

Gráficamente se puede apreciar el avance general de las actividades de mantenimiento realizados por Codensa S.A E.S.P., asociadas al contrato 780 de 2019 en la ilustración No.2.

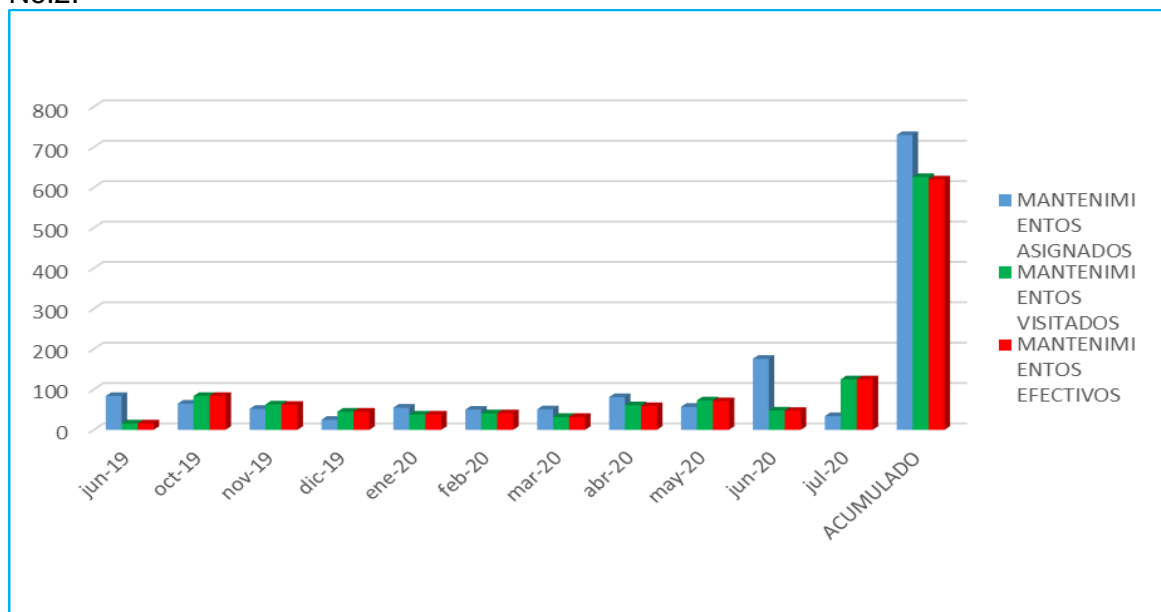


Ilustración 3. Acumulativo actividades de mantenimientos ejecutados en 07septiembre de 2019 al 30 julio de 2020

Se informa que, al presente corte, se ejecutaron un total de 122 cambios de puntos de conexión para dar solución a las fallas eléctricas reportadas por el contratista de

mantenimiento, estas actividades incluyeron el cambio de la acometida eléctrica y del punto de conexión conectado en las redes de alumbrado público, migrándolos a la red de uso comercial.

5.6 SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y MEDIO AMBIENTE

Como parte de las obligaciones del Consorcio Smarty - Scain 2019, se realizaron acompañamientos que permitieron identificar, verificar y exigir a CODENSA S.A E.S.P., las acciones correctivas necesarias para que la ejecución de cualquier actividad relacionada con el proyecto sea segura.

5.6.1 Objetivo


Reportar los aspectos en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de la empresa CODENSA S.A. E.S.P y que se presentan durante el desarrollo de las actividades ejecutadas en julio del 2020, como obligación adquirida según el contrato 756-2019.

5.6.2 Seguridad y salud en el trabajo



Equipo de trabajo del implementador

Conforme a la ejecución de las labores realizadas por CODENSA S.A. E.S.P., dentro del periodo anteriormente mencionado, la interventoría realizó el acompañamiento respectivo en campo, supervisando, recomendando y exigiendo que los vehículos y el personal del contratista cumplan con la normatividad legal nacional vigente aplicable en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente acorde a las actividades de **MANTENIMIENTO DE FALLAS ELÉCTRICAS.**

En consecuencia, del anterior, la interventoría relaciona el listado de acompañamiento realizado, los hallazgos encontrados y las acciones llevadas a cabo para prevenir, mitigar y corregir cualquier situación que pueda generar un riesgo laboral, ambiental y/o de emergencia sanitaria COVID-19.

| FECHA | LUGAR | PUNTO | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | CONCEPTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|------------|----------------|------------------|--|--|---|
| 03/07/2020 | CIUDAD BOLÍVAR | SCJ17E190 015 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. CODENSA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE, TENIENDO EN CUENTA QUE ES VISITA CONJUNTA CON LA UTS MVC Y ETB. SE UTILIZA PMT DE LA UTS MVC CONFORME A LA ACTIVIDAD |  |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| FECHA | LUGAR | PUNTO | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | CONCEPTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|------------|---------|----------------|--|--|--|
| | | | | CONJUNTA, DONDE ADICIONAL SE REALIZA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO DADO QUE LAS ACTIVIDADES SON EN ESCALERA. | |
| 09/07/2020 | KENNEDY | ESU-145 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. CODENSA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE REALIZA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO, ENCERRAMIENTO, ACTIVIDAD SOBRE EL ANDEN. |  |
| 21/07/2020 | SANTAFÉ | CCEL04_01 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. CODENSA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE REALIZA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO, SOBRE ANDEN. SE REALIZA PAUSAS ACTIVAS POR PARTE DE LA SUPERVISORA DE SST ANTES DE INICIAR TAREAS. |  |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| FECHA | LUGAR | PUNTO | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | CONCEPTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|------------|----------------|----------------|--|---|---|
| 22/07/2020 | SANTAFÉ | CCEL04_01 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. CODENSA | <p>ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE.</p> <p>SE REALIZA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.</p> <p>SE REALIZA CHARLA DE HIGIENE POSTURAL POR PARTE DE LA SUPERVISORA SST ANTES DE INICIAR TAREAS.</p> |  |
| 23/07/2020 | BARRIOS UNIDOS | C1E02-1166 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. CODENSA | <p>ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE.</p> <p>SE REALIZA CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES POR PARTE DE LA SUPERVISORA SST ANTES DE INICIAR TAREAS.</p> |  |
| 28/07/2020 | CHAPINERO | C1E02-1176 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. CODENSA | <p>ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE.</p> <p>SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DE CAJA.</p> |  |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.


| FECHA | LUGAR | PUNTO | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | CONCEPTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|------------|---------|--------|--|--|---|
| 29/07/2020 | KENNEDY | AL1278 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. CODENSA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. |  |

Tabla 148. Listado de acompañamiento realizado.

Las evidencias fotográficas se muestran en el Anexo “Registro fotográfico”.

Incidentes

Se identifica un registro de cero (0) incidentes en la ejecución de actividades en campo en la ciudad de Bogotá D.C., en relación con la ejecución del contrato 756 de 2019.

Accidentes de trabajo

No se registra ocurrencia de accidentes de trabajo, ni trabajadores afectados en aislamiento preventivo o por contagio de COVID-19 para el mes de julio 2020.

5.6.3 Observaciones y/o Recomendaciones

Se solicita mantener las buenas prácticas de S.S.T por parte del equipo de trabajo; es de resaltar que tomaron acciones mejora frente a charlas de diversos temas antes de iniciar sus labores.

Se cuenta con la seguridad social paga para el mes de julio 2020.

Tener en cuenta el cumplimiento del PMT, conforme a lo exigido por parte de la SDM (Secretaría Distrital de Movilidad con vigencia del 10 de junio 2020 al 10 de septiembre 2020).

5.7 RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFORMES DEL CONTRATISTA

Para el presente informe, se reporta que aún se está a la espera de recibir el informe técnico correspondiente al mes de julio de 2020, para dar comienzo a la revisión respectiva para su posterior aprobación y con ello dar continuidad al proceso de facturación correspondiente, dentro de los tiempos determinados en los cronogramas establecidos por la SDSCJ para la radicación y pago de la factura correspondiente al mes de julio de 2020, y de este modo dar inicio a la liquidación del contrato 756 de 2019.

5.8 ANÁLISIS DE RIESGO

| CAUSA | EVENTO | CONSECUENCIA | GESTIÓN INTERVENTORÍA |
|---|--|---|--|
| Debido a que se presenten lluvias en las distintas localidades de la ciudad de Bogotá. | Es posible que se generen constantes suspensiones en las actividades diarias. | Lo que ocasionaría retrasos en la ejecución de las actividades programadas para el día en campo. | La Interventoría solicitará al Contratista CODENSA S.A. E.S.P., que incremente las cuadrillas de ejecución para que aproveche los tiempos secos así reponer los tiempos que se han afectado por las lluvias en la ciudad o que implemente el sistema de carpas para poder trabajar durante los periodos de lluvia y de este modo no afectar las actividades de obra civil. |
| Entrega por parte de CODENSA S.A. E.S.P., de todas las ofertas económicas para las actividades de mantenimiento sujetas a cambio de tipo de red. | A la fecha de corte y elaboración del presente informe, no se ha realizado la revisión total de toda la documentación de trabajos efectuados, durante el periodo de febrero de 2020. | Presentar el debido informe económico que cuantifica el costo total de los recursos necesarios para llevar a cabo los cambios de conexión de red AP a red de Uso comercial. | Se han efectuado reuniones en conjunto de lectura nuevamente de las obligaciones del contratista, en donde se estipula la fecha máxima de respuesta, para la entrega de ofertas y documentación, para poder realizar los informes correspondientes al mes en del presente informe. |
| Terminar la prórroga establecida para la ejecución de las actividades contempladas y no agotar los recursos del presupuesto asignado al contrato 756 de 2019. | Es posible no alcanzar el agotamiento se pueda agotar los recursos estipulados en el presupuesto del contrato 756 de 2019. | Lo que implica no poder cerrar en cero el presupuesto del contrato obligando a realizar devolución de los saldos a la SDSCJ | La Interventoría solicitará al Contratista CODENSA S.A. E.S.P., realice los replanteos en su operación diaria con el fin de poder atender la mayor parte de las actividades asignadas y ejecutar las actividades de cambio de red contemplados en la justificación técnica del modificatorio No.3 al contrato 756 de 2019, lo cual implica que se realicen actividades por valores de trescientos millones en el mes de mayo de 2020 y doscientos ochenta y do millones para el mes de junio de la misma anualidad. De lo contrario deberá replantear las estrategias de trabajo y solicitar prórroga de tiempo finalizando el mes de junio de 2020. |
| Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el país a causa del COVID-19. | Es posible que se generen constantes suspensiones en las actividades diarias. | Lo que ocasionaría retrasos en la ejecución de las actividades programadas para el día en campo. | La Interventoría solicitará al Contratista CODENSA S.A. E.S.P., que informe y radique todas las decisiones que se tomen referentes a la mitigación al riesgo de contagio en su fuerza de trabajo con el fin de tomar las medidas necesarias que ajusten los cronogramas establecidos y a su vez informar a la secretaría de seguridad, convivencia y justicia dichas novedades. |

Tabla 149. Análisis de Riesgo – CODENSA S.A. E.S.P.

5.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ Se entrega por parte del contratista Codensa S.A. E.S.P., el cronograma para comenzar el proceso de liquidación y cierre del contrato 756 de 2019, para dar cumplimiento al objeto contractual durante el mes de agosto de 2020.
- ✓ Se requiere que el contratista Codensa S.A E.S.P., entregue el total de la información documental requerida para adelantar el proceso de conciliación de la facturación correspondiente a las actividades ejecutadas durante el mes de julio de 2020 y los soportes requeridos para dar cierre al contrato.
- ✓ Se solicita al contratista Codensa S.A E.S.P., se acoja a los tiempos establecidos en el cronograma estipulado para la liquidación y cierre del contrato 756 de 2019 y cumpla con las entregas de información, documentos solicitados.

- ✓ Se informa a la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), que al cierre del presente informe quedan pendiente por ejecutar 62 actividades por falta de tiempo, a su vez se manifiesta que estas actividades corresponden a los reportes emitidos por los distintos fondos de desarrollo locales y copiados al consorcio Smarty-Scain 2019 para su gestión con el contratista Codensa S.A E.S.P., durante la vigencia del contrato 756 de 2019 hasta el pasado 30 de julio de 2020 como se expresa en el modificadorio No.4 firmado el 6 de julio de 2020. Es de aclarar que 52 actividades de las 62 mencionadas corresponden a garantías por daños en la estructura de las cajas de inspección CS274 las cuales serán atendidas a partir del 30 de julio de 2020, estas actividades corresponden a la obligación adquiridas en los contratos 583 de 2017 y 756 de 2019 donde el contratista debe responder por los daños que presenten los materiales utilizados y los acabados en las obras ejecutadas por espacio de dos (2) años a partir de su recepción a satisfacción por la interventoría. Por lo anterior estas actividades no afectan el proceso de liquidación y cierre del contrato 756 de 2019. Una vez ejecutadas estas actividades por el contratista deberán ser reportadas al supervisor del contrato en la SDSCJ para su verificación y recepción de las actividades adelantadas.

- ✓ Las 10 actividades restantes corresponden a correctivos que de igual manera fueron reportados por los distintos fondos de desarrollo locales de la ciudad y copiados al consorcio Smarty-Scain 2019 de igual manera no fueron ejecutados por falta de tiempo al contrato 756 de 2019, estas actividades deberán ser atendidas en el futuro a través de una nueva contratación o como determine la SDSCJ.

6. CONTRATO NO. 914 DE 2019 – ETB

6.1 FICHA TÉCNICA

| A. INFORMACIÓN GENERAL | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|------------------------|
| NIT | 889.999.115-8 | | | |
| RAZÓN SOCIAL | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P -ETB- | | | |
| CIUDAD | BOGOTÁ D.C | | | |
| DIRECCIÓN | BOGOTÁ D.C | | | |
| TELÉFONO | Cra 8 #20 – 22 Piso 7 | | | |
| I. DATOS DEL CONTRATO | | | | |
| CONTRATO No. | 914-2019 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 19/06/2019 | |
| FECHA ACTA DE INICIO CONTRATO | 19/06/2019 | FECHA DE TERMINACIÓN | 19/01/2020 | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 18.475.048.538 Incluido IVA del 19% | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 18.475.048.538 Incluido IVA del 19% | |
| OBJETO | Prestar los servicios de conectividad para el sistema de videovigilancia de Bogotá, red WAN, internet móvil y voz empleados por los organismos de seguridad e inteligencia del estado con jurisdicción en el distrito capital y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. | | | |
| ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA | 07/09/2019 | | | |
| II. Modificación N° 01 | | | | |
| PRORROGA | 0 días | FECHA FINAL | 18/01/2020 | |
| ADICION | \$ 0 | VALOR TOTAL | \$ 18.475.048.538 | |
| III. Modificación N° 02 | | | | |
| PRORROGA | 2 MESES Y 19 DIAS | FECHA FINAL | 6/04/2020 | |
| ADICION | \$ 4.956.814.406 | VALOR TOTAL | \$ 23.431.862.944 | |
| IV. Modificación No 03 | | | | |
| PRORROGA | 3 MESES | FECHA FINAL | 6/07/2020 | |
| ADICION | \$ 7.716.755.283 | VALOR TOTAL | \$ 31.148.618.227 | |
| V. Modificación No 4 | | | | |
| PRORROGA | 24 DIAS | FECHA FINAL | 30/07/2020 | |
| ADICION | \$ 1.898.211.814 | VALOR TOTAL | \$ 33.046.830.041 | |
| PLAZO EJECUCION TOTAL | 13 MESES Y 13 DIAS | | | |
| OBJETO | Interventoría administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica y ambiental, para los proyectos del sistema de videovigilancia de Bogotá. | | | |
| FECHA FIRMA ACTA DE INICIO | 19/06/2019 | | | |
| VI. DATOS DEL CONTRATISTA | | | | |
| NOMBRE CONTACTO | ROL | CORREO ELECTRÓNICO | | |
| Cesar Castañeda | Gerente de proyecto | cesar.castanedan@etb.com.co | | |
| B. ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) | |
| 1 | Valor inicial del Contrato – Concepto Videovigilancia | 18.475.048.538 | 56% | |
| 2 | Valor Adición 2 | 4.956.814.406 | 15% | |
| 3 | Valor adición 3 | 7.716.755.283 | 23% | |
| 4 | Valor adición 4 | 1.898.211.814 | 6% | |
| 5 | Valor Total | 33.046.830.041 | 100% | |
| 6 | Valor facturado | 28.322.120.125 | 86% | |
| 7 | Valor pendiente por ejecutar | 4.724.709.916 | 14% | |
| C. INFORMACIÓN JURÍDICA | | | | |
| I. GARANTÍAS DEL CONTRATO | | | | |
| ASEGURADORA | No. DE PÓLIZA | TIPO DE AMPARO | VALOR | PERÍODO DE COBERTURA |
| CHUBB | 2100563400000 4 | Cumplimiento de contrato | \$ 4.686.372.588.80 | 19/06/19 A 06/10/20 |
| | 2100563400000 4 | Calidad del servicio | \$ 4.686.372.588.80 | 19/06/19 A 06/10/20 |
| | 2100563400000 4 | Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones | \$ 1.171.593.147.20 | 19/06/19 A 06/04/23 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | 2100563400000 4 | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | \$ 4.686.372.588.80 | 19/06/2019 A 06/10/2020 |
|--|--------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| | 1200398800000 2 | Responsabilidad civil extracontractual | \$ 1.171.593.147.20 | 19/06/19 A 06/04/20 |
| II. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN ANS | | CANTIDAD DE SERVICIOS INCUMPLIDOS | DESCUENTO |
| 1 | Desconexión total | | 0 | NA |
| 2 | Operación degradada | | 0 | NA |
| 3 | Falla no grave | | 0 | NA |
| 4 | Disponibilidad | | 19 | \$ 1.476.630 |
| 5 | Puesta en Funcionamiento | | 0 | NA |
| Observaciones: Como resultado del proceso de conciliación realizado el pasado 7 de julio de 2020 se aplicó penalización por los ANS de "Disponibilidad", correspondientes a los casos presentados del 1 al 30 de junio de 2020. | | | | |

Tabla 150. Ficha Técnica – ETB Contrato 914 - 2019

6.2 ESTADO GENERAL FINANCIERO:

| MODIFICACION No 02 | | | |
|--------------------|-------------------|-------------|------------------|
| PRORROGA | 2 MESES Y 19 DIAS | FECHA FINAL | 6/04/2020 |
| ADICION | \$4.956.814.406 | VALOR TOTAL | \$23.431.862.944 |

Tabla 151. Información Otrosí No. 02 – ETB

| MODIFICACION No 03 CONTRATO 914 DE 2019 ETB | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|
| PRORROGA | 3 MESES | FECHA FINAL | 6/07/2020 |
| ADICION | \$ 7.716.755.283 | VALOR TOTAL | \$31.148.618.227 |

Tabla 152. Información Otrosí No. 03 – ETB

| MODIFICACION No 04 CONTRATO 914 DE 2019 ETB | | | |
|---|------------------|-------------|-------------------|
| PRORROGA | 24 DIAS | FECHA FINAL | 30/07/2020 |
| ADICION | \$ 1.898.211.814 | VALOR TOTAL | \$ 33.046.830.041 |

Tabla 153. Información Otrosí No. 04 – ETB

| DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) |
|------------------------------|--------------------------|-------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 18.475.048.538 | 56% |
| VALOR ADICIÓN 1 | \$ 4.956.814.406 | 15% |
| VALOR ADICIÓN 3 | \$ 7.716.755.283 | 23% |
| VALOR ADICIÓN 4 | \$ 1.898.211.814 | 6% |
| VALOR TOTAL | \$ 33.046.830.041 | 100% |
| VALOR FACTURADO | \$ 28.322.120.125 | 86% |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$ 4.724.709.916 | 14% |

Tabla 154. Información financiera ETB

| MES | VALOR SERVICIOS | DESCUENTO ANS | TOTAL, ANTES DE IVA | TOTAL, CON IVA |
|-----------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| JUNIO 2019 | \$ 645.521.594 | \$ 12.538.890 | \$ 632.982.704 | \$ 753.249.417 |
| JULIO 2019 | \$ 1.665.845.559 | \$ 34.455.150 | \$ 1.631.390.409 | \$ 1.941.354.587 |
| AGOSTO 2019 | \$ 1.766.928.997 | \$ 2.311.020 | \$ 1.764.617.978 | \$ 2.099.895.394 |
| SEPTIEMBRE 2019 | \$ 1.851.361.059 | \$ 1.883.799 | \$ 1.849.477.261 | \$ 2.200.877.940 |
| OCTUBRE 2019 | \$ 1.938.865.842 | \$ 18.281.180 | \$ 1.920.584.662 | \$ 2.285.495.748 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| MES | VALOR SERVICIOS | DESCUENTO ANS | TOTAL, ANTES DE IVA | TOTAL, CON IVA |
|----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| NOVIEMBRE 2019 | \$ 1.993.191.667 | \$ 9.284.101 | \$ 1.983.907.566 | \$ 2.360.850.004 |
| DICIEMBRE 2019 | \$ 2.035.001.477 | \$ 2.052.450 | \$ 2.032.949.028 | \$ 2.419.209.343 |
| ENERO 2020 | \$ 2.033.873.272 | \$ 1.705.905 | \$ 2.032.167.367 | \$ 2.418.279.167 |
| FEBRERO 2020 | \$ 2.030.008.416 | \$ 1.218.024 | \$ 2.028.790.392 | \$ 2.414.260.566 |
| MARZO 2020 | \$ 1.999.493.450 | \$ 3.852.971 | \$ 1.995.640.479 | \$ 2.374.812.170 |
| ABRIL 2020 | \$ 1.986.602.757 | \$ 3.051.900 | \$ 1.983.550.857 | \$ 2.360.425.522 |
| MAYO 2020 | \$ 1.990.957.507 | \$ 2.223.000 | \$ 1.988.734.507 | \$ 2.366.594.063 |
| JUNIO 2020 | \$ 1.956.784.363 | \$ 1.476.630 | \$ 1.955.307.733 | \$ 2.326.816.204 |
| TOTAL | \$ 23.894.435.959 | \$ 94.335.020 | \$ 23.800.100.942 | \$ 28.322.120.125 |

Tabla 155. ANS

Las facturas de los meses junio, julio y agosto de 2019, fueron revisadas y aprobadas por la interventoría Consorcio Seguridad Capital, y a partir del siete (7) de septiembre de 2019 hasta la fecha han sido revisadas y aprobadas por el Consorcio Smarty Scain 2019.

6.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por la Interventoría con el objetivo de realizar el seguimiento a la ejecución contractual:

6.3.1 Actas de reunión de seguimiento

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | No. ACTA |
|-----|------------|---|----------|
| 1 | 13/09/2019 | PRESENTACIÓN INTERVENTORÍA Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 914 | 001 |
| 2 | 16/09/2019 | ENLACE COSEC Y C4 | 002 |
| 3 | 20/09/2019 | SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 914 | 003 |
| 4 | 27/09/2019 | SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 914 | 004 |
| 5 | 04/10/2019 | PRE-CONCILIACIÓN ETB | 005 |
| 6 | 07/10/2019 | CONCILIACIÓN ETB | 006 |
| 7 | 11/10/2019 | REUNION DE SEGUIMIENTO ETB | 007 |
| 8 | 15/10/2019 | ENLACE COSEC Y C4 | 008 |
| 9 | 18/10/2019 | ENLACE COSEC Y C4 | 009 |
| 10 | 23/10/2019 | CASOS ASEGURAMIENTO | 010 |
| 11 | 24/10/2019 | REUNION DE SEGUIMIENTO ETB | 011 |
| 12 | 30/10/2019 | REUNION DE SEGUIMIENTO ETB | 012 |
| 13 | 05/11/2019 | PRE-CONCILIACION OCTUBRE ETB | 013 |
| 14 | 08/11/2019 | CONCILIACIÓN OCTUBRE ETB | 014 |
| 15 | 21/11/2019 | REUNION DE SEGUIMIENTO ETB | 015 |
| 16 | 27/11/2019 | REUNION DE SEGUIMIENTO ETB | 016 |
| 17 | 3/12/2019 | PRE-CONCILIACIÓN NOVIEMBRE ETB | 017 |
| 18 | 5/12/2019 | ENLACE BACKUP C4 Y COSEC ETB - UT SMVC | 018 |
| 19 | 6/12/2019 | CONCILIACIÓN NOVIEMBRE ETB | 019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | No. ACTA |
|-----|------------|--------------------------------|----------|
| 20 | 11/12/2019 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 020 |
| 21 | 18/12/2019 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 021 |
| 22 | 26/12/2019 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 022 |
| 23 | 02/01/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 023 |
| 24 | 03/01/2020 | PRE-CONCILIACION DICIEMBRE ETB | 024 |
| 25 | 08/01/2020 | CONCILIACIÓN DICIEMBRE ETB | 025 |
| 26 | 09/01/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 026 |
| 27 | 17/01/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 027 |
| 28 | 23/01/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 028 |
| 29 | 31/01/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 029 |
| 30 | 03/02/2020 | PRE-CONCILIACION ENERO ETB | 030 |
| 31 | 06/02/2020 | CONCILIACIÓN ENERO ETB | 031 |
| 32 | 07/02/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 032 |
| 33 | 13/02/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 033 |
| 34 | 18/02/2020 | ENLACE BUCKUP Y VRF COSEC | 034 |
| 35 | 21/02/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 035 |
| 36 | 28/02/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 036 |
| 37 | 02/03/2020 | PRE-CONCILIACION FEBRERO ETB | 037 |
| 38 | 05/03/2020 | CONCILIACIÓN FEBRERO ETB | 038 |
| 39 | 09/03/2020 | ENLACE BACKUP Y VRF COSEC | 039 |
| 40 | 13/03/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 040 |
| 41 | 16/03/2020 | ENLACE BACKUP Y VRF COSEC | 041 |
| 42 | 20/03/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 042 |
| 43 | 27/03/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 043 |
| 44 | 02/04/2020 | PRE-CONCILIACION MARZO ETB | 044 |
| 45 | 03/04/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 045 |
| 46 | 06/04/2020 | CONCILIACIÓN MARZO ETB | 046 |
| 47 | 08/04/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 047 |
| 48 | 17/04/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 048 |
| 49 | 24/04/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 049 |
| 50 | 29/04/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 050 |
| 51 | 4/05/2020 | PRE-CONCILIACION ABRIL ETB | 051 |
| 52 | 07/05/2020 | CONCILIACIÓN ABRIL ETB | 052 |
| 53 | 08/05/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 053 |
| 54 | 15/05/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 054 |
| 55 | 22/05/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 055 |
| 56 | 26/05/2020 | MIGRACION VRF COSEC | 056 |
| 57 | 29/05/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 057 |
| 58 | 29/05/2020 | MIGRACION VRF COSEC | 058 |
| 59 | 02/06/2020 | PRE-CONCILIACION MAYO ETB | 059 |
| 60 | 05/06/2020 | REUNION DE SEGUMIENTO ETB | 060 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | No. ACTA |
|-----|------------|-----------------------------|----------|
| 61 | 05/06/2020 | CONCILIACIÓN MAYO ETB | 061 |
| 62 | 12/06/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO ETB | 062 |
| 63 | 18/06/2020 | LECTURA DE OBLIGACIONES ETB | 063 |
| 64 | 19/06/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO ETB | 064 |
| 65 | 26/06/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO ETB | 065 |
| 66 | 02/07/2020 | PRE-CONCILIACION JUNIO ETB | 066 |
| 67 | 03/07/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO ETB | 067 |
| 68 | 07/07/2020 | CONCILIACIÓN JUNIO ETB | 068 |
| 69 | 09/07/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO ETB | 069 |
| 70 | 16/07/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO ETB | 070 |
| 71 | 24/07/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO ETB | 071 |
| 72 | 30/07/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO ETB | 072 |

Tabla 156. Actas de reunión de seguimiento.**6.3.2 Comunicaciones**

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|-----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 12/09/2019 | SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO DE SAN CRISTOBAL | P136 -ETB-00004-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 2 | 12/09/2019 | PUNTOS CON FALLA DE VISUALIZACIÓN O ACCESO EN C4 EN EL FDL USAQUÉN | P136 -ETB-00005-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 3 | 12/09/2019 | SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO EN LOS MÁRTIRES | P136 -ETB-00006-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 4 | 12/09/2019 | SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO ENGATIVÁ | P136 -ETB-00007-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 5 | 13/09/2019 | SOLICITUD DE HINCADO DE POSTE - PUNTOS MEBOG | P136-UTMTO-00010-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 6 | 16/09/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00022-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 7 | 16/09/2019 | VISITA CONJUNTA DE 10 PUNTOS DE CÁMARAS DEL PROYECTO ESU Y 350 | P136-ETB-00024-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 8 | 16/09/2019 | PUNTOS DE CÁMARA REPORTADOS A ETB Y AL MOMENTO NO TIENE PEM | P136-ETB-00025-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 9 | 17/09/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00029-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 10 | 18/09/2019 | PRORROGA USAQUEN | P136-ETB-00032-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 11 | 18/09/2019 | SOLICITUD APROVISIONAMIENTO PUNTOS EL REDENTOR | P136-ETB-00033-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 12 | 18/09/2019 | PUNTOS DE CÁMARA REPORTADOS A ETB Y AL MOMENTO NO TIENE PEM | P136-ETB-00035-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 13 | 18/09/2019 | PRORROGA MARTIRES | P136-ETB-00037-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 14 | 19/09/2019 | PROYECCION PAC OCTUBRE Y NOVIEMBRE | P136-ETB-00041-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 15 | 19/09/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00049-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 16 | 19/09/2019 | SOLICITUD USUARIO TARIFICADOR CONSUMO POR DEMANDA | P136-ETB-00052-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 17 | 21/09/2019 | FALLA DEL SERVICIO CAV30CI1124604 - KR 45 CL 128 B - ALCALDÍAS - CONTRATO NO. 914 DE 2019 | P136-ETB-00054-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 18 | 21/09/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00055-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|----------------------|---------------|--------------|
| 19 | 21/09/2019 | FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO CON CONEXIÓN LTE Y CONEXIÓN POR FIBRA ÓPTICA | P136-ETB-00056-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 20 | 24/09/2019 | JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN DE RADIO ENLACE EN CHOACHI Y CIUDAD BOLIVAR | P136-ETB-00063-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 21 | 24/09/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00065-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 22 | 25/09/2019 | TRAMITAR PERMISOS DE ACCESO WI-FI EN C4 | P136-SSCJ-00070-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 23 | 25/09/2019 | TRAMITE DE PERMISOS DE INGRESO AL CAE REDENTOR | P136-SSCJ-00072-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 24 | 26/09/2019 | PUNTOS DE CÁMARA REPORTADOS A ETB Y AL MOMENTO NO TIENE PEM | P136-ETB-00079-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 25 | 26/09/2019 | REITERACION 1. PLAN DE TRABAJO PARA LA VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE 8GB COSECS NUEVOS. | P136-ETB-00080-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 26 | 26/09/2019 | FALLA DEL SERVICIO DE 5 PUNTOS DE CÁMARA DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES DEL PROYECTO ALCALDÍAS | P136-ETB-00083-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 27 | 26/09/2019 | FALLA DEL SERVICIO DE 9 PUNTOS DE CÁMARA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DEL PROYECTO ALCALDÍAS | P136-ETB-00084-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 28 | 27/09/2019 | SOLICITUD INTERVENTORÍA PARQUE SIMON BOLIVAR | P136-ETB-00087-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 29 | 28/09/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00089-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 30 | 1/10/2019 | VISITA CONJUNTA DE 7 PUNTOS DE CÁMARAS DEL PROYECTO ALCALDÍAS | P136-ETB-00102-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 31 | 1/10/2019 | FALLA DE ENERGÍA SOLUCIONADA PUNTO DE CÁMARA AL2595 | P136-ETB-00103-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 32 | 2/10/2019 | VISITA CONJUNTA DE 3 PUNTOS DE CÁMARAS DEL PROYECTO 732 | P136-ETB-00107-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 33 | 3/10/2019 | FALLA ENLACE PRINCIPAL DEL C4 - CAV30CI1078540 – CL 20 68 A 06 – C4 | P136-ETB-00116-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 34 | 3/10/2019 | TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO AL CAE REDENTOR | P136-SSCJ-00118-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 35 | 4/10/2019 | SOLICITUD DE INFORME DE LA FALLA MASIVA EN C4 | P136-ETB-00125-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 36 | 4/10/2019 | TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO AL C4 PARA INSTALACIÓN DEL CANAL DE BUCUP. | P136-SED-00127-2019 | INTERVENTORÍA | SED |
| 37 | 6/10/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00130-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 38 | 7/10/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00132-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 39 | 8/10/2019 | REITERACION No.1. SOLICITUD INTERVENTORÍA PARQUE SIMON BOLIVAR | P136-ETB-00134-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 40 | 8/10/2019 | REPORTE DE AVANCE DIARIO DE LA INSTALACIÓN DEL ENLACE BACKUP DE C4. | P136-ETB-00135-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 41 | 9/10/2019 | TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO AL CAE REDENTOR | P136-SSCJ-00137-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 42 | 9/10/2019 | ACTIVACIÓN DEL ENLACE CAV30CI1082349 - CARRERA80XCALLE38SUR | P136-ETB-00140-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 43 | 9/10/2019 | ESTADO DE AVANCE DEL PUNTO C831051 AUTOPISTA NORTE CON 127 | P136-ETB-00141-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|----------------------|---------------|--------------|
| 44 | 9/10/2019 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE COSECS | P136-SSCJ-00144-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 45 | 10/10/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00152-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 46 | 16/10/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00175-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 47 | 16/10/2019 | ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO C4 | P136-SSCJ-00176-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 48 | 17/10/2019 | SOLICITUD DE TRASLADO DEL SERVICIO CON ID - CAV30CI1129609 | P136-ETB-00185-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 49 | 17/10/2019 | GEORREFERENCIA DEL PUNTO DE CÁMARA P532 APROBADO PARA LA LOCALIDAD DE BOSA | P136-ETB-00187-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 50 | 17/10/2019 | SOLICITUD DE CAMBIO DE ROUTER EN 2 PUNTOS DE CÁMARA DEL PROYECTO 732. | P136-ETB-00188-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 51 | 17/10/2019 | FALLA ENLACE PUNTO DE CÁMARA CAV30CI112583 – KR 4 CL 1 C– ALCALDÍAS - CONTRATO NO. 914 DE 2019 | P136-ETB-00190-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 52 | 17/10/2019 | APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE | P136-ETB-00191-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 53 | 17/10/2019 | FALLA ENLACE PUNTO DE CÁMARA CAV30CI112579 – CL 1 BIS C KR 2 A ESTE – ALCALDÍAS - CONTRATO NO. 914 DE 2019 | P136-ETB-00192-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 54 | 17/10/2019 | FALLA ENLACE PUNTO DE CÁMARA CAV30CI112900 – AV BOYACÁ CL 5 A COSTADO OCCIDENTAL – ALCALDÍAS - CONTRATO NO. 914 DE 2019 | P136-ETB-00193-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 55 | 17/10/2019 | FALLA DE 3 ENLACES DE PUNTOS DE CÁMARAS DEL PROYECTO ALCALDÍAS - CONTRATO NO. 914 DE 2019 | P136-ETB-00195-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 56 | 17/10/2019 | FALLA ENLACE PUNTO DE CÁMARA CAV30CI1129587 – KR 5 CL 34 – ALCALDÍAS - CONTRATO NO. 914 DE 2019 | P136-ETB-00196-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 57 | 17/10/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00197-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 58 | 18/10/2019 | SOLICITUD VISITA CONJUNTA PARA EL PUNTO DE CÁMARA PAQ31 | P136-ETB-00201-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 59 | 19/10/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00206-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 60 | 21/10/2019 | ENLACES DE ALCALDÍAS SIN RESPUESTA. | P136-ETB-00208-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 61 | 21/10/2019 | SOLICITUD CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN PUNTOS DE CÁMARA EN RADIO ENLACE | P136-ETB-00210-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 62 | 21/10/2019 | AVANCES PUNTOS DE CÁMARA DEL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR | P136-ETB-00212-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 63 | 21/10/2019 | SOLICITUD CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN PUNTOS DE CÁMARA EN RADIO ENLACE | P136-ETB-00215-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 64 | 22/10/2019 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE COSECS. | P136-SSCJ-00218-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 65 | 23/10/2019 | DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DURANTE LAS ELECCIONES | P136-ETB-00221-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 66 | 23/10/2019 | FALLA DE 6 ENLACES DE PUNTOS DE CÁMARAS DEL PROYECTO ALCALDÍAS - CONTRATO NO. 914 DE 2019 | P136-ETB-00222-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|----------------------|---------------|--------------|
| 67 | 24/10/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00227-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 68 | 24/10/2019 | SOLICITUD DE CAMBIO DE ROUTER EN 2 PUNTOS DE CÁMARA DEL PROYECTO 732 | P136-ETB-00234-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 69 | 24/10/2019 | ACTIVACIÓN DEL ENLACE CAV30CI1037513 - AV CIRCUNVALAR X RIO ARZOBISPO | P136-ETB-00235-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 70 | 25/10/2019 | TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO AL CAE REDENTOR | P136-SSCJ-00241-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 71 | 25/10/2019 | SOLICITUD DE AVANCES DE LOS 6 PUNTOS DE CIUDAD BOLÍVAR POR CONECTIVIDAD DE FIBRA | P136-ETB-00243-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 72 | 25/10/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00244-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 73 | 26/10/2019 | ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED DE CONECTIVIDAD INSTALADA | P136-ETB-00245-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 74 | 28/10/2019 | ENLACE BACKUP DE C4. | P136-ETB-00246-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 75 | 28/10/2019 | FALLA DE 16 ENLACES DE PUNTOS DE CÁMARAS DEL PROYECTO ALCALDÍAS - CONTRATO NO. 914 DE 2019 | P136-ETB-00247-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 76 | 29/10/2019 | ENLACES DE ALCALDÍAS SIN RESPUESTA. | P136-ETB-00257-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 77 | 29/10/2019 | AVANCES PUNTOS DE CÁMARA DEL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR | P136-ETB-00259-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 78 | 30/10/2019 | FALLA DE 5 ENLACES DE PUNTOS DE CÁMARAS DEL PROYECTO ALCALDÍAS | P136-ETB-00265-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 79 | 30/10/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00267-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 80 | 6/11/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00281-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 81 | 6/11/2019 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO PEM ENLACE BACKUP C4 | P136-SSCJ-00285-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 82 | 7/11/2019 | SOLICITUD DE INFORME DE LA VENTANA FALLIDA ENLACE BACKUP C4 | P136-ETB-00288-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 83 | 7/11/2019 | VISITA CONJUNTA DE 2 PUNTOS DE CÁMARAS DEL PROYECTO ALCALDÍAS | P136-ETB-00289-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 84 | 8/11/2019 | FACTURACIÓN CONTRATO 914 | P136-SSCJ-00292-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 85 | 8/11/2019 | SOLICITUD VISITA CONJUNTA PARA EL PUNTO DE CÁMARA AL2595 | P136-ETB-00293-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 86 | 8/11/2019 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE BACKUP C4 | P136-SSCJ-00294-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 87 | 9/11/2019 | PUNTOS DE CÁMARA SIN VISUALIZACIÓN EN C4 | P136-ETB-00300-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 88 | 12/11/2019 | ENRUTAMIENTO ROUTER C4 | P136-ETB-00305-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 89 | 13/11/2019 | VISITA CONJUNTA DE 2 PUNTOS DE CÁMARAS | P136-ETB-00307-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 90 | 13/11/2019 | ACTIVACIÓN DEL ENLACE CAV30CI1100715 - KILOMETRO 5 VIA LA CALERA | P136-ETB-00313-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 91 | 13/11/2019 | SUSPENSIÓN DE 4 ENLACES DEL PROYECTO 732. | P136-ETB-00314-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 92 | 15/11/2019 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO PEM ENLACE BACKUP C4 | P136-SSCJ-00321-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|----------------------|---------------|--------------|
| 93 | 15/11/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00322-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 94 | 15/11/2019 | APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OCTUBRE | P136-ETB-00323-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 95 | 18/11/2019 | PUNTOS DE CÁMARAS CON VIABILIDAD PARA ETB | P136-ETB-00328-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 96 | 18/11/2019 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE PRINCIPAL C4 | P136-ETB-00330-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 97 | 18/11/2019 | FALLA DE 34 ENLACES DE PUNTOS DE CÁMARAS DEL PROYECTO ALCALDÍAS | P136-ETB-00331-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 98 | 18/11/2019 | ENLACES DE ALCALDÍAS SIN RESPUESTA. | P136-ETB-00332-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 99 | 18/11/2019 | AFECTACIÓN DE CAJA INTERNA | P136-ETB-00333-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 100 | 18/11/2019 | CAMBIO DE ROUTER EN 2 PUNTOS DE CÁMARA DEL PROYECTO 732. | P136-ETB-00335-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 101 | 18/11/2019 | REPORTE SEMANAL DE LOS PUNTOS DE CÁMARA QUE SON RETIRADOS DEL ANILLO. | P136-ETB-00336-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 102 | 18/11/2019 | TRASLADO DE LA CAMARA 249 - CAV30CI1079572 | P136-ETB-00338-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 103 | 18/11/2019 | PROYECCION PAC DICIEMBRE | P136-ETB-00339-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 104 | 19/11/2019 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE PRINCIPAL C4 | P136-ETB-00343-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 105 | 19/11/2019 | ENLACE BACKUP C4 | P136-SSCJ-00346-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 106 | 20/11/2019 | ENLACE BACKUP C4 | P136-SSCJ-00348-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 107 | 20/11/2019 | SOLICITUD DEL CONTROL DE CAMBIOS DEL ROUTER PPAL/BACKUP | P136-ETB-00349-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 108 | 20/11/2019 | TRAMITE DE PERMISOS AL DATA CENTER DE BOMBEROS DEL C4 | P136-SSCJ-00355-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 109 | 25/11/2019 | TRAMITE DE PERMISOS DE INGRESO AL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR | P136-IDRD-00364-2019 | INTERVENTORÍA | IDRD |
| 110 | 25/11/2019 | FALLA DE 4 ENLACES DE PUNTOS DE CÁMARAS DEL PROYECTO ALCALDÍAS | P136-ETB-00366-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 111 | 26/11/2019 | SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO DE 3 ENLACE DE SUBA | P136-ETB-00381-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 112 | 27/11/2019 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN: INGRESO Y APOYO DE ISS EN PREMIER ONE | P136-SSCJ-00390-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 113 | 28/11/2019 | REPORTE SEMANAL DE LOS PUNTOS DE CÁMARA QUE SON RETIRADOS DEL ANILLO. | P136-ETB-00397-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 114 | 28/11/2019 | VENTANAS DE MANTENIMIENTO - ETB | P136-SSCJ-00399-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 115 | 1/12/2019 | ELIMINACIÓN CONFIGURACIÓN MULTICAST DE LOS ROUTER. | P136-ETB-00404-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 116 | 2/12/2019 | VENTANAS DE MANTENIMIENTO - EQUIPO TARIFICADOR CUNI | P136-SSCJ-00406-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 117 | 4/12/2019 | SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO DE 6 ENLACES EN CIUDAD BOLIVAR | P136-ETB-00416-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 118 | 4/12/2019 | TRASLADO DE LA CAMARA 249 - CAV30CI1079572 | P136-ETB-00418-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 119 | 4/12/2019 | INSTALACIÓN DEL ENLACE CAV30CI1100715 - KILOMETRO 5 VIA LA CALERA | P136-ETB-00419-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 120 | 5/12/2019 | FALLA DEL SERVICIO DE 11 PUNTOS DE CÁMARA DE LA LOCALIDAD DE BOSA DEL PROYECTO ALCALDÍAS | P136-ETB-00423-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|----------------------|---------------|--------------|
| 121 | 5/12/2019 | SOLICITUD INFORME FALLA MASIVA EN C4 EL 5 DICIEMBRE DE 2019. | P136-ETB-00430-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 122 | 6/12/2019 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE PRINCIPAL C4 | P136-SSCJ-00431-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 123 | 6/12/2019 | FALLA DEL SERVICIO DE 10 PUNTOS DE CÁMARA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DEL PROYECTO ALCALDÍA | P136-ETB-00435-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 124 | 9/12/2019 | REITERACION No. 1. TRASLADO DE LA CÁMARA 249 - CAV30CI1079572 | P136-ETB-00440-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 125 | 9/12/2019 | REITERACIÓN 1. INSTALACIÓN DEL ENLACE CAV30CI1100715 - KILOMETRO 5 VIA LA CALERA | P136-ETB-00441-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 126 | 9/12/2019 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE COSEC BARRIOS UNIDOS | P136-SSCJ-00444-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 127 | 9/12/2019 | OBSERVACIONES ACTAS APROVISIONAMIENTO SEPTIEMBRE 2019 | P136-ETB-00446-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 128 | 11/12/2019 | APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE | P136-ETB-00457-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 129 | 11/12/2019 | VISITA DE SITE SURVEY: PROYECCIÓN TRASLADO DE 2 PUNTOS DE CÁMARA. | P136-ETB-00458-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 130 | 12/12/2019 | FALLA ENLACE PUNTO DE CÁMARA AL2268 - CAV30CI1111667 - TV 73 H CL 75 B SUR - PROYECTO ALCALDÍAS | P136-ETB-00462-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 131 | 12/12/2019 | VISITA PUNTOS DE CÁMARA DEL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR | P136-ETB-00464-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 132 | 12/12/2019 | ELIMINACIÓN CONFIGURACIÓN MULTICAST DE LA RED MPLS. | P136-ETB-00465-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 133 | 12/12/2019 | FALLA DEL SERVICIO DE 8 PUNTOS DE CÁMARA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DEL PROYECTO ALCALDÍAS | P136-ETB-00467-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 134 | 12/12/2019 | TRASLADO DE CÁMARAS: 222 - CAV30CI1088870 Y 225 - CAV30CI1088867 | P136-ETB-00469-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 135 | 18/12/2019 | VISITA CONJUNTA: APROVISIONAMIENTO CÁMARA P459 | P136-ETB-00482-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 136 | 18/12/2019 | VISITA CONJUNTA DE 2 PUNTOS DE CÁMARAS - CONTRATO NO. 914 DE 2019 | P136-ETB-00483-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 137 | 18/12/2019 | RECOMENDACIÓN PRÓRROGA NO. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 914 DE 2019, CONTRATISTA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOT | CSS-P136-00075-2019 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 138 | 19/12/2019 | FALLA DEL SERVICIO DE 2 PUNTOS DE CÁMARA DEL PROYECTO ALCALDÍAS | P136-ETB-00489-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 139 | 19/12/2019 | MIGRACIÓN VRF COSEC. | P136-ETB-00490-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 140 | 19/12/2019 | SOLICITUD INTERVENTORÍA PUNTO DE CAMARA 212. | P136-ETB-00493-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 141 | 19/12/2019 | TRASLADO DE CÁMARAS: 221, 223 Y 224 DEL PROYECTO ESU | P136-ETB-00494-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 142 | 23/12/2019 | VISITAS DE SITE SURVEY PARA LOS 2 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA DEL CAE REDENTOR SCJ18ESP00007_1 Y SCJ17FJ0002 PARA TRASLADAR AL PAR | CSS-P136-00076-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 143 | 23/12/2019 | VISITAS DE SITE SURVEY PARA LOS 2 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA DEL | P136-ETB-00507-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|----------------------|---------------|--------------|
| | | CAE REDENTOR SCJ18ESP00007_1 Y SCJ17FJ0002 PARA TRASLADAR AL PAR | | | |
| 144 | 24/12/2019 | VISITA CONJUNTA DE 2 PUNTOS DE CÁMARAS | P136-ETB-00513-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 145 | 24/12/2019 | VISITA CONJUNTA PUNTOS DE CÁMARA PORTAL AMÉRICAS CAV30CI1066813 | P136-ETB-00516-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 146 | 31/12/2019 | TRASLADO DE CÁMARAS: 211 Y 213 DEL PROYECTO ESU | P136-ETB-00530-2019 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 147 | 8/01/2020 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE PRINCIPAL C4 | P136-SSCJ-00552-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 148 | 8/01/2020 | SOLICITUD MOP Y PERSONAL PARA LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL ENLACE BACKUP. | P136-ETB-00555-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 149 | 9/01/2020 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE COSEC BARRIOS UNIDOS | P136-SSCJ-00557-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 150 | 9/01/2020 | REVISIÓN SATURACIÓN DE CÁMARAS EN EL COSEC DE ENGATIVA | P136-ETB-00558-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 151 | 9/01/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: PRUEBA DE ENLACE BACKUP | P136-SSCJ-00559-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 152 | 9/01/2020 | VISITA CONJUNTA DE 3 PUNTOS DE CÁMARAS | P136-ETB-00560-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 153 | 13/01/2020 | RECOMENDACIÓN PRÓRROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 914 DE 2019, CONTRATISTA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. | CSS-P136-00081-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 154 | 13/01/2020 | INFORME REVISIÓN DE ENLACES EN EL COSEC DE ENGATIVA | P136-ETB-00564-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 155 | 14/01/2020 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE PRINCIPAL C4 | P136-SSCJ-00576-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 156 | 15/01/2020 | APROBACIÓN INFORME MENSUAL Y VALORES A FACTURAR DE DICIEMBRE 2019 | P136-ETB-00583-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 157 | 17/01/2020 | FALLA ENLACE PUNTO DE CÁMARA CAV30CI1049501- CLLE 16F BIS NO. 102-70 - COLEGIO PABLO NERUDA - CONTRATO NO. 914 DE 2019 | P136-ETB-00594-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 158 | 17/01/2020 | FALLA ENLACE PUNTO DE CÁMARA CAV30CI1049564- CRA. 87B # 79C SUR - 51 - COLEGIO SAN BERNARDINO | P136-ETB-00595-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 159 | 17/01/2020 | TRASLADO DE PUNTOS DE CÁMARAS CON PANEL SOLAR | P136-ETB-00596-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 160 | 17/01/2020 | VISITA DE SITE SURVEY: PROYECCIÓN TRASLADO DE 11 PUNTOS DE CÁMARA. | P136-ETB-00597-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 161 | 17/01/2020 | SOLICITUD MOP Y PERSONAL PARA LA VENTANA DEL COSEC BARRIOS UNIDOS | P136-ETB-00598-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 162 | 20/01/2020 | SOLICITUD MOP Y PERSONAL PARA LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL ENLACE BACKUP. | P136-ETB-00602-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 163 | 22/01/2020 | MIGRACIÓN VRF COSEC. | P136-ETB-00610-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 164 | 22/01/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: PRUEBA DE ENLACE BACKUP C4 | P136-SSCJ-00611-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|-----------------------|---------------|--------------|
| 165 | 22/01/2020 | TRAMITE PERMISOS DE INGRESO A LA CÁRCEL DISTRITAL CARRERA 8 CON CALLE 1C | P136-SSCJ-00612-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 166 | 22/01/2020 | SOLICITUD PÓLIZAS DE GARANTÍAS ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO 914 DE 2019 | P136-ETB-00613-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 167 | 28/01/2020 | SOLICITUD DE INFORME DE LA VENTANA FALLIDA PRUEBA DE ENLACE BACKUP C4 | P136-ETB-00622-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 168 | 28/01/2020 | TRASLADO DE CÁMARA 214 DEL PROYECTO ESU | P136-ETB-00623-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 169 | 3/02/2020 | SOLICITUD MOP Y PERSONAL PARA LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL ENLACE BACKUP. | P136-ETB-00642-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 170 | 3/02/2020 | REITERACION 1: SOLICITUD DE INFORME DE LA VENTANA FALLIDA PRUEBA DE ENLACE BACKUP C4 | P136-ETB-00643-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 171 | 5/02/2020 | REVISIÓN SATURACIÓN DE CÁMARAS | P136-ETB-00650-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 172 | 5/02/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: PRUEBA DE ENLACE BACKUP C4 | P136-SSCJ-00651-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 173 | 6/02/2020 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CÁMARA DE LA CARRERA 60 CON CALLE 42. | P136-MEBOG-00656-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 174 | 6/02/2020 | VISITA CONJUNTA DEL PUNTO DE CAMARA 3602 FVS CON ID DE SERVICIO CAV30CI1087578 - CONTRATO NO. 914 DE 2019 | P136-ETB-00657-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 175 | 10/02/2020 | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 914 DE 2019. | CSS-P136-00100-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 176 | 10/02/2020 | REPROGRAMACIÓN VENTANA DE MANTENIMIENTO: PRUEBA DE ENLACE BACKUP C4 | P136-SSCJ-00664-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 177 | 11/02/2020 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CÁMARA DE LA CARRERA 60 CON CALLE 42. | P136-MEBOG-00668-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 178 | 12/02/2020 | SOLICITUD DE INFORME DE LA VENTANA FALLIDA PRUEBA DE ENLACE BACKUP C4 | P136-ETB-00669-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 179 | 12/02/2020 | APROBACIÓN INFORME MENSUAL Y VALORES A FACTURAR DE ENERO 2020 | P136-ETB-00672-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 180 | 13/02/2020 | VISITA CONJUNTA DEL PUNTO DE CAMARA AL1716 ALCALDÍAS CON ID DE SERVICIO CAV30CI1111617 | P136-ETB-00674-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 181 | 13/02/2020 | TRASLADO DE CÁMARA 227 DEL PROYECTO ESU | P136-ETB-00675-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 182 | 24/02/2020 | ENLACE BACKUP Y VRF COSEC. | P136-ETB-00709-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 183 | 25/02/2020 | REPORTE DE CASOS INFORMATIVOS | P136-ETB-00714-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 184 | 25/02/2020 | TRAMITE PERMISOS DE INGRESO A LA CÁRCEL DISTRITAL CARRERA 8 CON CALLE 1C | P136-ETB-00715-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 185 | 25/02/2020 | INFORME SOBRE LOS HECHOS PRESENTADOS CON ENLACE DE BACKUP C4 | CSS-P136-00109-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 186 | 26/02/2020 | ACTAS APROVISIONAMIENTO PENDIENTES | P136-ETB-00722-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 187 | 26/02/2020 | CONSUMO PUNTOS DE CÁMARA CON MODEM LTE | P136-ETB-00724-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|----------------------|---------------|--------------|
| 188 | 27/02/2020 | SOLICITUD APROVISIONAMIENTO PUNTOS PARQUE CARACOLI | P136-ETB-00727-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 189 | 6/03/2020 | SOLICITUD DE SITE SURVEY PARA EL PUNTO AL1716 - CAV30CI1111617 - KR 20 CL 12 A | P136-ETB-00750-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 190 | 11/03/2020 | APROBACIÓN INFORME MENSUAL Y VALORES A FACTURAR DE FEBRERO 2020 | P136-ETB-00768-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 191 | 16/03/2020 | INFORME VENTANA DE MANTENIMIENTO EN EL COSEC DE ENGATIVA. | P136-ETB-00775-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 192 | 16/03/2020 | REVISIÓN DE ALARMAS PRESENTADAS EN EL ROUTER PRINCIPAL C4. | P136-ETB-00776-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 193 | 16/03/2020 | RETIRAR EL ROUTER ASR 1001-X DEL DATACENTER. | P136-ETB-00777-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 194 | 16/03/2020 | RESPUESTA CONCEJAL JORGE LUIS COLMENARES: "ETB COBRA POR MANTENIMIENTO DE CÁMARAS QUE NO SIRVEN EN LA CIUDAD" | CSS-P136-00118-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 195 | 17/03/2020 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE ROUTER PRINCIPAL. | P136-SSCJ-00779-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 196 | 18/03/2020 | VISITA DE SITE SURVEY PUNTO DE CAMARA SCJ17E110090 CON ID CAV30CI1091301 | P136-ETB-00786-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 197 | 19/03/2020 | SOLICITUD DE RESULTADOS MESA TÉCNICA. | P136-ETB-00794-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 198 | 19/03/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DEL ROUTER PRINCIPAL | P136-SSCJ-00795-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 199 | 19/03/2020 | INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA N°6 DEL CONTRATO 914: VISITAS DE SITE SURVEY | P136-ETB-00797-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 200 | 19/03/2020 | PERSONAL DE ETB DISPONIBLE DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2020. | P136-SSCJ-00799-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 201 | 20/03/2020 | OBSERVACIONES ACTAS APROVISIONAMIENTO | P136-ETB-00802-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 202 | 24/03/2020 | VISITA CONJUNTA DE 3 PUNTOS DE CÁMARAS | P136-ETB-00808-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 203 | 26/03/2020 | SITE SURVEY (CAV30CI1091301 - CAV30CI1063009) | P136-ETB-00818-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 204 | 30/03/2020 | RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA | P136-ETB-00823-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 205 | 30/03/2020 | CONSUMO PUNTOS DE CÁMARA CON MODEM LTE | P136-ETB-00824-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 206 | 3/04/2020 | RECOMENDACIÓN PRÓRROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 914 DE 2019, CONTRATISTA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | CSS-P136-00127-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 207 | 3/04/2020 | ENLACE O VPN POR EMERGENCIA | P136-ETB-00836-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 208 | 7/04/2020 | VISITA CONJUNTA DEL PUNTO DE CÁMARA CCEL11_099 CON ID: CAV30CI1135324 | P136-ETB-00838-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 209 | 13/04/2020 | SOLICITUD PÓLIZAS DE GARANTÍAS ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO 914 DE 2019 | P136-ETB-00849-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 210 | 13/04/2020 | VISITA CONJUNTA DE 4 PUNTOS DE CÁMARAS | P136-ETB-00850-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 211 | 15/04/2020 | APROBACIÓN INFORME MENSUAL Y VALORES A FACTURAR DE MARZO 2020 | P136-ETB-00853-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|----------------------|---------------|--------------|
| 212 | 15/04/2020 | VISITA CONJUNTA DEL PUNTO DE CÁMARA SCJ17E190039 CON ID CAV30CI1092153 | P136-ETB-00856-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 213 | 16/04/2020 | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 914 DE 2019. | CSS-P136-00139-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 214 | 16/04/2020 | SOLICITUD DE REINICIO DE ACTIVIDADES PARA EL CANAL BACKUP, MIGRACION VRF COSEC Y CAMBIO DEL ROUTER PRINCIPAL. | P136-SSCJ-00858-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 215 | 20/04/2020 | VISITA CONJUNTA DE 2 PUNTOS DE CÁMARAS | P136-ETB-00866-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 216 | 21/04/2020 | SOLICITUD MOP Y LISTADO DEL PERSONAL TÉCNICO PARA EL CAMBIO DEL ROUTER | P136-ETB-00873-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 217 | 23/04/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DEL ROUTER PRINCIPAL | P136-SSCJ-00879-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 218 | 24/04/2020 | SOLICITUD DE VIABILIDAD PARA EL PUNTO AL1716 - CAV30CI1111617 - KR 20 CL 12 A | P136-ETB-00883-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 219 | 24/04/2020 | FALLA ENLACE PUNTO DE CÁMARA MOVIL - 203 - IP: 1.17.5.38, PROYECTO ESU | P136-ETB-00884-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 220 | 27/04/2020 | SOLICITUD MOP Y LISTADO DEL PERSONAL TÉCNICO PARA EL CAMBIO DEL ROUTER | P136-ETB-00889-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 221 | 27/04/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DEL ROUTER PRINCIPAL | P136-SSCJ-00890-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 222 | 30/04/2020 | CONSUMO PUNTOS DE CÁMARA CON MODEM LTE | P136-ETB-00895-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 223 | 30/04/2020 | ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED DE CONECTIVIDAD INSTALADA | P136-ETB-00896-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 224 | 4/05/2020 | SOLICITUD DEL INFORME VENTANA: CAMBIO DEL ROUTER PRINCIPAL DEL SISTEMA | P136-ETB-00904-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 225 | 7/05/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: RE-CONFIGURACIÓN DEL DISEÑO LAN | P136-SSCJ-00909-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 226 | 8/05/2020 | VENTANAS DE MANTENIMIENTO - ETB | P136-SSCJ-00910-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 227 | 11/05/2020 | SOLICITUD DEL INFORME VENTANA: RECONFIGURACIÓN LAN | P136-ETB-00917-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 228 | 11/05/2020 | VISITA CONJUNTA DEL PUNTO DE CÁMARA 148 CON ID CAV30CI1062927, PROYECTO ESU | P136-ETB-00919-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 229 | 12/05/2020 | SOLICITUD MOP Y PERSONAL PARA LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL ENLACE BACKUP. | P136-ETB-00921-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 230 | 13/05/2020 | APROBACIÓN INFORME MENSUAL Y VALORES A FACTURAR DE ABRIL 2020 | P136-ETB-00929-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 231 | 14/05/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: PRUEBA DE ENLACE BACKUP C4 | P136-SSCJ-00931-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 232 | 18/05/2020 | SOLICITUD DEL INFORME VENTANA: PRUEBA ENLACE BACKUP | P136-ETB-00939-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 233 | 18/05/2020 | PLAN DE TRABAJO VRF COSEC | P136-ETB-00941-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 234 | 18/05/2020 | SOLICITUD DE RESULTADOS DE LA VIABILIDAD PARA EL PUNTO AL1716 - CAV30CI1111617 - KR 20 CL 12 A | P136-ETB-00943-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 235 | 20/05/2020 | SOLICITUD DE RESULTADOS DE LA VIABILIDAD PARA EL PUNTO AL1716 - CAV30CI1111617 - KR 20 CL 12 A | P136-ETB-00949-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|----------------------|---------------|--------------|
| 236 | 20/05/2020 | FALLA DEL ENLACE PRINCIPAL CAV30CI1067838 – CL 20 68 A - 06 | P136-ETB-00956-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 237 | 20/05/2020 | SOLICITUD PLAN DE MOVILIDAD. | P136-ETB-00957-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 238 | 21/05/2020 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE PRINCIPAL C4 | P136-SSCJ-00959-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 239 | 22/05/2020 | SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO DE MEBOG PARA ACTIVIDADES CÁMARA AL1716 | P136-SSCJ-00963-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 240 | 22/05/2020 | FALLA PRESENTADA EN EL CANAL PRINCIPAL CAV30CI1067838 | P136-ETB-00964-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 241 | 22/05/2020 | SOLICITUD DEL INFORME VENTANA: MANTENIMIENTO DEL ENLACE PRINCIPAL CAV30CI1067838 | P136-ETB-00965-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 242 | 23/05/2020 | SOLICITUD DE CONFIGURACIÓN DE LA IP DE LA UPS EN EL ENLACE CAV30CI1071175 – CALLE 34 X CRA 7 – FVS | P136-ETB-00968-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 243 | 28/05/2020 | SOLICITUD DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD EN COSEC PUENTE ARANDA. | P136-ETB-00984-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 244 | 29/05/2020 | VISITA CONJUNTA DE 3 PUNTOS DE CÁMARAS | P136-ETB-00987-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 245 | 1/06/2020 | VISITA CONJUNTA DE 3 PUNTOS DE CÁMARAS | P136-ETB-00999-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 246 | 3/06/2020 | SOLICITUD DE ANUNCIAMIENTO DE LA IP DE UPS EN LA RED MPLS DEL ENLACE CAV30CI1002527 – CALLE 38 SUR CON CARRERA 95A – FVS | P136-ETB-01004-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 247 | 5/06/2020 | CONSUMO PUNTOS DE CÁMARA CON MODEM LTE | P136-ETB-01012-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 248 | 5/06/2020 | SOLICITUD DEL INFORME MIGRACIÓN VRF COSEC CIUDAD BOLÍVAR. | P136-ETB-01014-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 249 | 5/06/2020 | SOLICITUD DEL INFORME MIGRACIÓN VRF COSEC PUENTE ARANDA | P136-ETB-01015-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 250 | 8/06/2020 | SOLICITUD DE CARACTERIZACIÓN DE LAS REDES DE FIBRA ÓPTICA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | P136-ETB-01024-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 251 | 11/06/2020 | APROBACIÓN INFORME MENSUAL Y VALORES A FACTURAR DE MAYO 2020 | P136-ETB-01035-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 252 | 12/06/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: MIGRACIÓN VRF COSEC CIUDAD BOLÍVAR Y PUENTE ARANDA | P136-SSCJ-01041-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 253 | 13/06/2020 | SOLICITUD DE ANUNCIAMIENTO DE LA IP DE UPS EN LA RED MPLS DEL ENLACE CAV30CI1070656 – CALLE 47F SUR CARRERA 72H BIS – 350. | P136-ETB-01044-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 254 | 16/06/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: MIGRACIÓN VRF COSEC BARRIOS UNIDOS | P136-SSCJ-01048-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 255 | 18/06/2020 | VISITA DE SITE SURVEY PUNTO DE CÁMARA ESU-101 CON ID CAV30CI1062955 | P136-ETB-01062-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 256 | 18/06/2020 | SOLICITUD DEL INFORME: MIGRACIÓN VRF COSEC PUENTE ARANDA Y CIUDAD BOLÍVAR | P136-ETB-01063-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 257 | 18/06/2020 | SOLICITUD DEL INFORME: MIGRACIÓN VRF COSEC BARRIOS UNIDOS | P136-ETB-01064-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 258 | 18/06/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: MIGRACIÓN VRF COSEC | P136-SSCJ-01068-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|----------------------|---------------|--------------|
| 259 | 24/06/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: MIGRACIÓN VRF COSEC | P136-SSCJ-01080-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 260 | 25/06/2020 | SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE 5 ENLACES DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. | P136-ETB-01090-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 261 | 26/06/2020 | FALLA DEL ENLACE PRINCIPAL CAV30CI1067838 – CL 20 68 A - 06 | P136-ETB-01091-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 262 | 26/06/2020 | VISITA CONJUNTA DEL PUNTO DE CÁMARA SCJ17E190015 CON ID DE SERVICIO CAV30CI1092104 | P136-ETB-01093-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 263 | 26/06/2020 | SOLICITUD DE INTENCIÓN DE PRÓRROGA DEL CONTRATO 914-2019 | P136-ETB-01094-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 264 | 27/06/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENLACE PRINCIPAL Y BACKUP | P136-SSCJ-01095-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 265 | 27/06/2020 | SOLICITUD DEL INFORME: FALLA PRESENTADA EN EL CANAL PRINCIPAL CAV30CI1067838 | P136-ETB-01096-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 266 | 27/06/2020 | SOLICITUD DE CONFIGURACIÓN DE LA IP DE LA UPS EN EL ENLACE CAV30CI1079589 – CLL 7 X CRA 7 – ESU | P136-ETB-01098-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 267 | 27/06/2020 | RESULTADOS VISITA DE SITE SURVEY PUNTO DE CÁMARA ESU-101 CON ID CAV30CI1062955 | P136-ETB-01099-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 268 | 30/06/2020 | VISITA TÉCNICA DATACENTER C4 | P136-ETB-01106-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 269 | 30/06/2020 | INFORME VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE PRINCIPAL | P136-ETB-01107-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 270 | 30/06/2020 | SOLICITUD DEL INFORME: MIGRACIÓN VRF COSEC | P136-ETB-01108-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 271 | 1/07/2020 | Recomendación prórroga al Contrato Interadministrativo No. 914 de 2019 | CSS-P136-00186-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 272 | 7/07/2020 | Solicitud pólizas de garantías adición y prórroga Contrato 914 de 2019 | P136-ETB-01124-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 273 | 7/07/2020 | Visita de Site Survey: Proyección Traslado de 2 puntos de cámara. | P136-ETB-01126-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 274 | 7/07/2020 | Traslado de Cámara 145 del Proyecto ESU | P136-ETB-01127-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 275 | 8/07/2020 | Consumo Puntos de Cámara con Modem LTE | P136-ETB-01131-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 276 | 8/07/2020 | Respuesta Derecho de Petición | CSS-P136-00194-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 277 | 9/07/2020 | Resultados visita de Site Survey de los puntos con ID CAV30CI1115580 y CAV30CI1090979. | P136-ETB-01133-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 278 | 13/07/2020 | Solicitud de autorización de ventana de mantenimiento Enlace Principal C4 | P136-SSCJ-01148-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 279 | 13/07/2020 | Traslado de Cámara CCEL04_011 del Proyecto Alcaldías. | P136-ETB-01150-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 280 | 14/07/2020 | Robotización Cámara Localidad de Suba | P136-ETB-01154-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 281 | 14/07/2020 | Observaciones Gestión Unificada | P136-ETB-01155-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 282 | 14/07/2020 | APROBACIÓN INFORME MENSUAL Y VALORES A FACTURAR DE JUNIO 2020 | P136-ETB-01160-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 283 | 15/07/2020 | Informe Ventana de Mantenimiento Enlace Principal | P136-ETB-01164-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 284 | 16/07/2020 | Traslado de Cámaras. | P136-ETB-01172-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|---|----------------------|---------------|--------------|
| 285 | 17/07/2020 | Solicitud de suspensión de 7 enlaces del sistema de videovigilancia. | P136-ETB-01180-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 286 | 21/07/2020 | Robotización Cámaras | P136-ETB-01185-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 287 | 22/07/2020 | Vigencia pólizas contrato 914 de 2019. | CSS-P136-00206-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 288 | 23/07/2020 | Solicitud de cambios para los enlaces instalados en el Parque Caracolí | P136-ETB-01191-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 289 | 23/07/2020 | Solicitud de cambios para los enlaces instalados en el CAE Redentor | P136-ETB-01192-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 290 | 23/07/2020 | Justificación desconexión de equipos del punto ESU-140 con ID CAV30CI1062896 | P136-ETB-01194-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 291 | 25/07/2020 | Falla masiva del sistema de videovigilancia | P136-ETB-01196-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 292 | 27/07/2020 | Visita conjunta del punto de cámara CCEAD_L7_23 con ID de servicio CAV30CI1114757 | P136-ETB-01204-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 293 | 28/07/2020 | Solicitud de suspensión del enlace CAV30404252 | P136-ETB-01207-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |
| 294 | 28/07/2020 | Ventana de Mantenimiento - ETB - CRQ000000064109 | P136-SSCJ-01208-2020 | INTERVENTORÍA | SDSCJ |
| 295 | 30/07/2020 | Consumo Puntos de Cámara con Modem LTE | P136-ETB-01211-2020 | INTERVENTORÍA | ETB |

Tabla 157. Comunicaciones

6.4 SEGUIMIENTO JURÍDICO

La presente relación da cuenta del estado legal del contrato al 30 de julio de 2020.

| INFORMACIÓN CONTRACTUAL | |
|-----------------------------|---|
| No. CONTRATO | 914 |
| TIPO DE CONTRATO | INTERADMINISTRATIVO |
| NOMBRE CONTRATISTA | ETB |
| FECHA DE CONTRATO | 19-JUN-19 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 19-JUN-19 |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 33.046.830.041 |
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SDSCJ |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 13 MESES 13 DIAS O HASTA QUE SE AGOTEN LOS RECURSOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO |
| ESTADO JURÍDICO | EN LIQUIDACIÓN |

Tabla 158. Información Contractual ETB

6.4.1 Seguimiento a garantías

En atención a la verificación del cumplimiento de la obligación contractual señalada en la cláusula séptima, literal c en su numeral 5 del contrato de interventoría No. 1020 de 2019, que prescribe:

“(...) 5). Verificar durante la vigencia de los proyectos, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en los contratos. (...)”

La interventoría procedió con la validación jurídica de cada una de las garantías exigidas a los contratistas en el marco de cada uno de los contratos tal como se describe en el capítulo

del respectivo contrato, identificando que los amparos constituidos en cada una de las pólizas se ajustan a los términos y condiciones establecidos contractualmente, como en lo contemplado en el libro 2 parte 2 título 1 capítulo 2 de la sección 3 del Decreto 1082 de 2015, así:

| Tipo de póliza | Requerimiento | Numero de póliza | Desde | hasta | valor | Verificación |
|--|--|------------------|----------|-----------|--------------------|--------------|
| Cumplimiento | La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, en todo caso debe estar vigente para la liquidación del contrato. El valor de esta garantía debe ser del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. | 56340 | 6-abr-20 | 30-ene-21 | \$6.609.366.008,20 | CUMPLE |
| Calidad del servicio | cuantía del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más | 56340 | 6-abr-20 | 30-ene-21 | \$6.609.366.008,20 | CUMPLE |
| Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | valor asegurado debe ser equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y tres (3) años más contados a partir de la fecha de expedición de la póliza | 56340 | 6-abr-20 | 30-jul-23 | \$1.652.341.502,05 | CUMPLE |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | Por el monto de equivalente al 20 % del valor del contrato, por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más | 56340 | 6-abr-20 | 30-ene-21 | \$6.609.366.008,20 | CUMPLE |
| Responsabilidad Civil Extracontractual: | Por una cuantía equivalente al 5% del valor del contrato con una duración igual al plazo de ejecución del mismo | 39880 | 6-abr-20 | 30-jul-20 | \$1.652.341.502,05 | CUMPLE |

Tabla 159. Seguimiento a Garantías

6.5 SEGUIMIENTO TÉCNICO

Respecto del seguimiento a las actividades de orden técnico ejecutadas por el Contratista, la Interventoría realizó el correspondiente acompañamiento de las mismas, desprendiéndose los resultados que se enuncian a continuación:

Topología C4.

Para el contrato 914 de 2019, el cual inició el 18 de junio de 2019, ETB propuso los siguientes cambios en la topología implementada.

6.5.1 Topología de Red Inicial.




Ilustración 4. Topología de Red Inicial

6.5.2 Topología de Red Final.

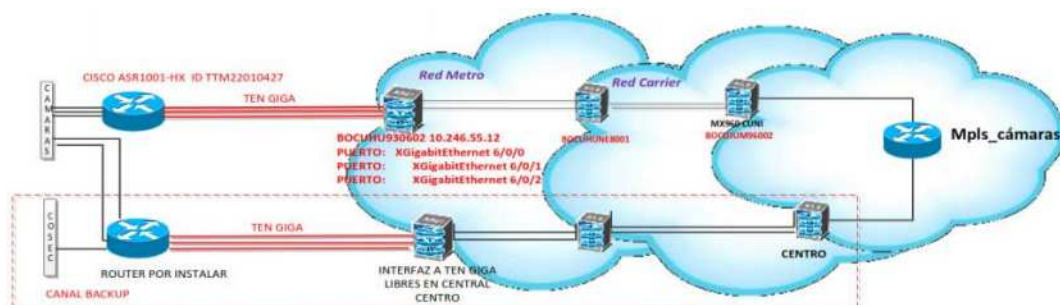


Ilustración 5. Topología de Red Final

Nota: De acuerdo con la imagen anteriormente presentada, el cambio significativo se puede apreciar la instalación de un canal de backup de 20 Gb.



Ilustración 6. Topología de Red Final 2

La anterior imagen hace referencia a una posible ampliación que ETB debe realizar en el C4, de 30 G a 40 G o 50 G, según sea el caso de saturación del canal principal al C4.

6.5.3 Enlace Backup C4

Durante el mes de julio de 2020, no fue necesario realizar otra actividad para la puesta del funcionamiento del Backup, porque este quedó activo y funcionando desde el 17 de mayo

de 2020. Para dejar activo el Backup se realizaron en el mes de mayo de 2020 las actividades que se describen a continuación:

- El 9 de mayo 2020 se realizó la ventana de Reconfiguración de la Red LAN de manera satisfactoria y sin mayores inconvenientes. En la configuración realizada por parte de la UT SMVC, se logró que el Switch Core Juniper principal asuma o se comporte como puerta de enlace y enrutamiento hacia la MPLS de todas las redes (VLAN) y de los equipos que componen los proyectos actuales de la plataforma de video vigilancia.
- El 16 de mayo 2020 se realizó la ventana de la prueba del canal Backup de manera satisfactoria. El enlace conmutó sin inconvenientes, sin pérdida de paquetes significativa ni tiempos de respuesta o latencias altas, cámaras visualizadas y operando correctamente, además de permanecer con un tráfico contante de 13.2 Gbps durante las pruebas a nivel LAN y WAN.

Por parte de Interventoría de recomienda hacer ventana de prueba del enlace del backup cada seis (6) meses para revisar el funcionamiento del canal y de esta manera prevenir falla en el enlace.

6.5.4 Topología de Red COSEC.

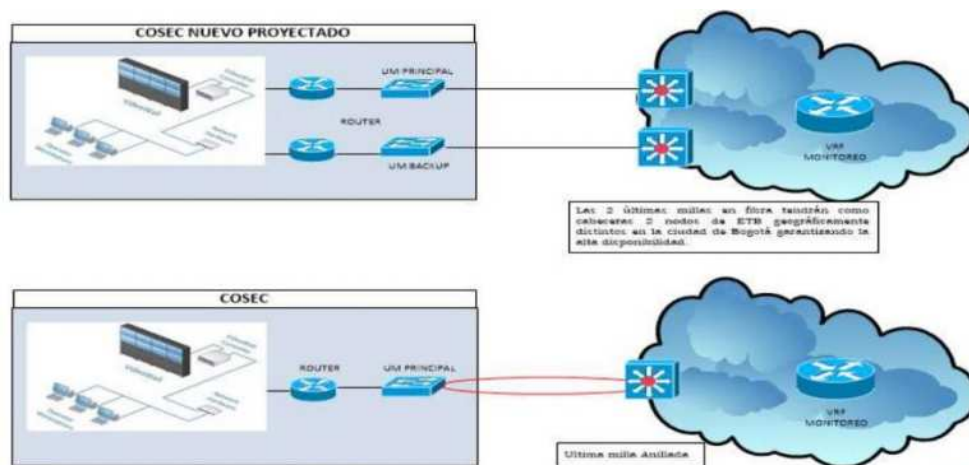


Ilustración 7. Topología De Red COSEC

Para el Contrato Interadministrativo No. 914 de 2019, se tienen siete (7) COSEC Aprovechados por ETB, los cuales se encuentran descritos en la siguiente tabla.

| SEDE | DIRECCIÓN | BW (Mbps) | SOLUCIÓN |
|--|-------------------------------------|-----------|----------|
| COSEC N°1 CENTRO DE MONITOREO DE CHAPINERO | CRA 1 CLL 57-00 | 2 GBPS | ANILLADA |
| COSEC N° 2 - CIUDAD BOLÍVAR | DG 70 SUR N° 54-14 B. SIERRA MORENA | 2 GBPS | ANILLADA |
| COSEC N° 3 - KENNEDY | CALLE 41 D N° 78 N-05 | 2 GBPS | ANILLADA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| SEDE | DIRECCIÓN | BW (Mbps) | SOLUCIÓN |
|--|--|-----------|--------------------|
| COSEC N° 4 CENTRO DE MONITOREO PUENTE ARANDA | CARRERA 34 N° 3 B – 70 | 2 GBPS | ANILLADA |
| PROYECTOS NUEVOS COSEC ENGATIVÁ | KR 78A NO. 70 54 | 512 MBPS | PRINCIPAL Y BACKUP |
| PROYECTOS NUEVO COSEC BARRIOS UNIDOS | ESTACIÓN DE POLICÍA SAN FERNANDO, AVENIDA CHILE #62-81, BOGOTÁ (1) 2257969 | 512 MBPS | PRINCIPAL Y BACKUP |
| PROYECTOS NUEVO COSEC TEUSAQUILLO | ESTACIÓN DÉCIMA TERCERA TEUSAQUILLO CRA. 13 #39-86, BOGOTÁ 321 2325735 | 512 MBPS | PRINCIPAL Y BACKUP |

Tabla 160. COSEC aprovisionados por ETB

6.5.5 Migración VRF COSEC

Durante el mes de julio de 2020, no fue necesario realizar otra actividad para la Migración VRF COSEC, porque esta quedo funcionando desde el 30 de junio de 2020 después de realizar la ventana el día 29 de junio 2020, la cual se ejecutó de manera satisfactoria. Como resultado tenemos una VRF independiente de 8GB para visualizar y monitorear las cámaras desde cada uno de los Centros de Monitoreo. Y con el fin de garantizar el funcionamiento del sistema se válida conectividad de servidores y pruebas a los diferentes proyectos, confirmando operatividad en C4 y en los Centros de Monitoreo dando fin a la actividad el 30 de junio 2020 a las 3:30 am.

Por parte de Interventoría, se informa que el COSEC Chapinero queda pendiente por la configuración de la VRF por que en estos momentos no está funcionando.

6.5.6 Traslados de puntos de cámara

Durante el mes de julio se solicitaron los siguientes traslados y se menciona en qué estado se encuentra cada uno a fecha del 30 de julio 2020.

| ÍTEM | CÓDIGO MEBOG | ID | DIRECCIÓN ACTUAL | DIRECCIÓN A TRASLADAR | OBSERVACIÓN ETB |
|------|--------------|----------------|------------------------|------------------------|--|
| 1 | CCEL04_011 | CAV30CI1112579 | CL 1 BIS C KR 2 A ESTE | CL 1 BIS C KR 2 A ESTE | A PARTIR DE LA OTRA SEMANA SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE TENDIDO Y EMPALME DE FIBRA ÓPTICA. |
| 2 | FVS-4021 | CAV30CI1037541 | CL 9 AV CARACAS | CL 9 KR 13 | A PARTIR DE LA OTRA SEMANA SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE TENDIDO Y EMPALME DE FIBRA ÓPTICA. |
| 3 | FVS-1323 | CAV30CI1038970 | CL 71 A KR 17 | CL 72 KR 17 | EL DÍA 30 DE JULIO INICIAN LAS ACTIVIDADES DE TENDIDO Y EMPALME DE FIBRA, PARA POSTERIORMENTE PROGRAMAR LA PUESTA EN MARCHA. |
| 4 | FVS-1166 | CAV30CI1038958 | CL 67 KR 17 | CL 67 KR 19 | A PARTIR DE LA OTRA SEMANA SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE TENDIDO Y EMPALME DE FIBRA ÓPTICA. |
| 5 | FVS-1312 | CAV30CI1038960 | CL 64 KR 16 | CL 64 KR 17 | A PARTIR DE LA OTRA SEMANA SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE TENDIDO Y EMPALME DE FIBRA ÓPTICA. |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|---|----------|----------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 6 | FVS-1176 | CAV30CI1049493 | CL 67 KR 5 | CL 67 KR 6 | A PARTIR DE LA OTRA SEMANA SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE TENDIDO Y EMPALME DE FIBRA ÓPTICA. |
| 7 | FVS-4117 | CAV30CI1037542 | DG 5 BIS KR 14 | DG 7 BIS KR 14 | A PARTIR DE LA OTRA SEMANA SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE TENDIDO Y EMPALME DE FIBRA ÓPTICA. |
| 8 | FVS-1144 | CAV30CI1038937 | CL 55 KR 10 | CL 55 KR 10 | EL DÍA 30 DE JULIO INICIAN LAS ACTIVIDADES DE TENDIDO Y EMPALME DE FIBRA, PARA POSTERIORMENTE PROGRAMAR LA PUESTA EN MARCHA. |
| 9 | FVS-4032 | CAV30CI1038951 | AV CIRCUNVALAR CALLE 34 | AV CIRCUNVALAR CALLE 34 | A PARTIR DE LA OTRA SEMANA SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE TENDIDO Y EMPALME DE FIBRA ÓPTICA. |

Tabla 161 Traslados de puntos de cámara

Debido a que los puntos de cámara no se alcanzaron a trasladar durante la vigencia del contrato 914 de 2019, estos serán atendidos bajo el nuevo contrato de conectividad.

6.5.7 Fase 2. Ampliación cámaras de videovigilancia de Bogotá.

| SUBPROCESO | EJECUTADO -REPORTADO | % EJECUCIÓN | POR EJECUTAR | TOTAL |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|-------|
| REPORTE DE CONECTIVIDAD | 1641 | 100% | 0 | 1641 |

Tabla 162. Fase 2 Ampliación cámaras de videovigilancia de Bogotá.

La interventoría, dentro del seguimiento diario que se realizó durante el 1 al 30 de julio de 2020 en el C4, se ha detectado las siguientes novedades con respecto a los 1641 enlaces instalados en la FASE 2.

| ESTADO ENLACES | CODENSA | ETB | OPERATIVA | TERCERO | MTTO | TOTAL GENERAL |
|----------------------------|----------|----------|-------------|----------|------------|---------------|
| OPERATIVO | | | 1463 | | | 1463 |
| SIN RESPUESTA CAMARA | | | | | 3 | 3 |
| SIN RESPUESTA CAMARA Y UPS | | | | | 1 | 1 |
| SIN RESPUESTA ENLACE | 2 | 4 | | 5 | 18 | 29 |
| SIN RESPUESTA ENLACE UPS | | | | | 2 | 2 |
| SIN RESPUESTA UPS | | | | | 143 | 143 |
| TOTAL GENERAL | 2 | 4 | 1463 | 5 | 167 | 1641 |

| CAMARAS VISUALIZADAS SIN RESPUESTA DE UPS | | |
|---|------|------|
| OPERATIVAS | 1463 | 1608 |
| OPERATIVAS SIN RESPUESTA UPS | 145 | |

Tabla 163. Seguimiento enlaces proyecto 732

6.5.8 Fase 3. Instrumento de agregación de demanda CCE-601-1-1AG-2017

Para este período, la interventoría recibió reportes por parte de ETB con respecto a los enlaces provisionados con corte 19 de diciembre de 2019, donde se finalizaron las actividades de puesta en marcha de puntos de cámara del Instrumento de agregación de demanda No. CCE-601-1-1AG-2017

ETB reportó 1674 puestas en marchas exitosas durante la ejecución del contrato 601-2017 (Alcaldías):

| ESTADO DEL PROYECTO SCJ - ALCALDIAS 1674 CAMARAS - CORTE19122019 | | | | | | |
|--|--------------------|------|--------|------------|------------------|--------|
| Actividades | Sitios Disponibles | Meta | Avance | Pendientes | Avance actividad | Avance |
| Pre-diseño y proyección preliminar * | 1674 | 1674 | 1674 | 0 | 100% | |
| Diseño cartográfico final | 1674 | | 1674 | 0 | 100% | |
| Tendidos | 1674 | | 1674 | 0 | 100% | |
| Obras civiles | 1674 | | 1674 | 0 | 100% | |
| Empalmes de fibra óptica | 1674 | | 1674 | 0 | 100% | |
| Puesta en marcha | 1674 | | 1674 | 0 | 100% | |
| Avance general ponderado | | | | | 100% | |

Ilustración 8. Estado del proyecto SCJ – Alcaldías

La Interventoría, dentro del seguimiento diario que se realizó durante el 1 al 30 de julio de 2020 en el C4, se ha detectado las siguientes novedades con respecto a los 1674 enlaces instalados en la FASE 3.

| ESTADO ENLACES | ETB | N/A | MTTO | CODENSA | TOTAL GENERAL |
|----------------------------|----------|-------------|------------|----------|---------------|
| OPERATIVO | | 1548 | | | 1548 |
| SIN RESPUESTA CAMARA | | | 7 | | 7 |
| SIN RESPUESTA CAMARA Y UPS | | | 1 | | 1 |
| SIN RESPUESTA ENLACE | 1 | | 5 | 2 | 8 |
| SIN RESPUESTA ENLACE UPS | | | | | 0 |
| SIN RESPUESTA UPS | | | 110 | | 110 |
| TOTAL GENERAL | 1 | 1548 | 123 | 2 | 1674 |

| CAMARAS VISUALIZADAS SIN RESPUESTA DE UPS | | |
|---|------|------|
| OPERATIVAS | 1548 | 1658 |
| OPERATIVAS SIN RESPUESTA UPS | 110 | |

Tabla 164. Seguimiento enlaces proyecto IAD 601

6.5.9 Herramienta de gestión y monitoreo

Para este período, la herramienta de gestión y monitoreo suministrada por ETB se encuentra actualizada con la totalidad de enlaces provisionados y facturados (proyectos FVS, colegios, Transmilenio, ESU, 350, Bogotá Mas Segura y Alcaldías). Adicionalmente, se acordó con ETB que, con el objetivo de proceder a facturar los nuevos servicios, estos deben estar monitoreados en la aplicación.

Se presenta a continuación usuario y contraseña suministrados por ETB:

LINK DE ACCESO: <https://gestionuetb.etb.com.co/ibm/console/logon.jsp>

Usuario: scj // Contraseña: 3mpr3s4S

Por medio del anterior link esta interventoría valida y revisa:

1. La relación de todos los enlaces facturados a la SDSCJ.
2. La continuidad del servicio sobre cada uno de los enlaces.
3. Ancho de banda.
4. Latencia.

6.5.10 Acuerdos de nivel de servicios (ANS)

Los tiempos de respuesta de ETB, de conformidad con lo establecido en el Anexo No. 5 del Contrato Interadministrativo No. 914 de 2019 - Oferta Comercial, se maneja de dos formas:

- ✓ **El tiempo de atención a fallas:** Está definido desde el instante que el cliente reporta el evento de falla y el personal de ETB realiza el diagnóstico. Este tiempo está definido en 2 horas (solo diagnóstico). En este transcurso se puede generar una reparación remota de la falla.
- ✓ **Tiempo de reparación:** Es el tiempo entre el diagnóstico y la solución al incidente reportado, incluye el desplazamiento y las actividades requeridas para realizar la reparación del servicio afectado.

| CARACTERIZACIÓN DE LA FALLA | | | |
|-----------------------------|---------------------|---|------------------------|
| PRIORIDAD | EFECTO | DESCRIPCIÓN | CIUDAD TIPO 1 (BOGOTÁ) |
| 1 | DESCONEXIÓN TOTAL | SE ENTIENDE QUE LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS 2 PUNTOS DE UN ENLACE SE HA INTERRUMPIDO TOTALMENTE | 4 HORAS |
| 2 | OPERACIÓN DEGRADADA | SERVICIO RESTRINGIDO; SERVICIO POR RUTA ALTERNA DE INFERIOR VELOCIDAD; LENTITUD EN EL SERVICIO DEBIDO A ERRORES EN LOS ENLACES, A RETRANSMISIONES O PERDIDAS DE PAQUETES; PRESENCIA DE FALLAS PRESENTADAS ESPORÁDICAMENTE Y QUE PUEDEN CAUSAR INTERRUPCIÓN EN EL SERVICIO POR PERIODOS DE TIEMPO CORTOS. EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LAS FALLAS DE OPERACIÓN DEGRADADA FORMARÁ PARTE DE LA INDISPONIBILIDAD, SIEMPRE Y CUANDO SEA MEDIBLE Y MAYOR A 10 SEGUNDOS. LATENCIA SEGÚN PRODUCTO Y TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA MILLA (TERRESTRE O SATELITAL). | 6 HORAS |
| 3 | FALLA NO GRAVE | SE ENTIENDE COMO LA QUE NO AFECTA NI DEGRADA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. LATENCIA SEGÚN PRODUCTO. | 6 HORAS |

Tabla 165. Tiempos de respuesta exigidos a ETB para solución de fallas

6.5.11 Falla Enlaces de los COSEC – 25 y 26 de julio 2020

El día 25 de julio de 2020 a las 10:00 am, se presentó falla en los enlaces de los COSEC de Teusaquillo, Engativá y Kennedy, el cual fue causado por el procesamiento desbordado en los equipos core de la red MPLS en el nodo Chicó por la ejecución de comandos no autorizados en el route reflector (concentrador de conexiones) de CUNI.

Por parte de ETB se realizaron cambios de configuración para reducir el procesamiento del equipo, en donde se hicieron modificaciones a la configuración del router reflector CISCO (router concentrador de conexiones) de CUNI y Chicó reduciendo en un 90% la cantidad de rutas anunciadas al equipo core, seguidamente realizaron la desactivación de los registros relacionados con la mayoría de filtros lógicos y para terminar hicieron un reinicio automático en todas las tarjetas del equipo core MPLS corporativo de Chicó. Con estas actividades se reestablece el servicio el 25 de Julio a la 1:35 pm.

Y para el domingo 26 de julio a las 01:00 am, por parte de ETB se realizaron maniobras de reinicio controlado para los equipos core MPLS CUNI y Centro conforme a la recomendación del fabricante de los equipos que estuvieron afectados, esta actividad finaliza a las 6:00 am, confirmando normalidad en el enrutamiento de los equipos y se observa tráfico normal en los servicios de videovigilancia.

6.5.12 Seguimiento casos reportados a ETB

6.5.12.1 Fase Mantenimiento

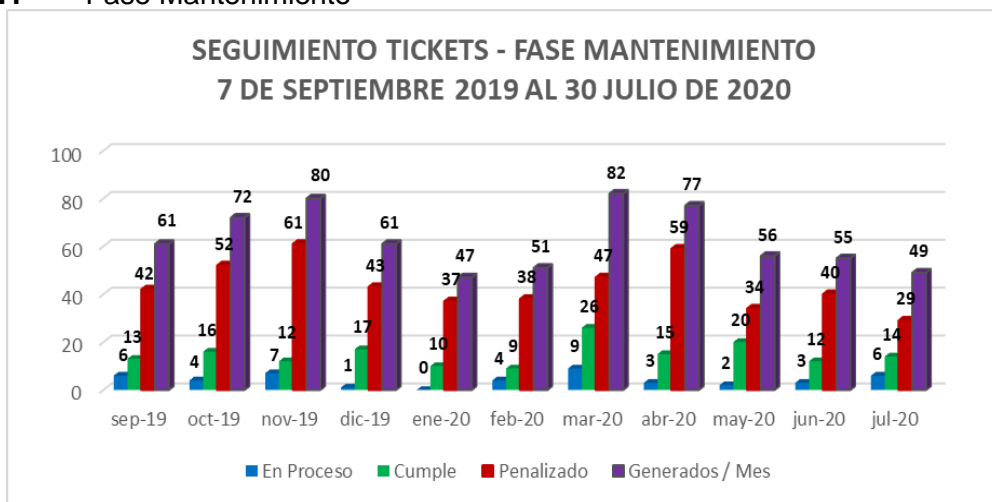


Ilustración 9. Seguimiento tickets - fase mantenimiento: 7 de septiembre 2019 al 30 julio de 2020.

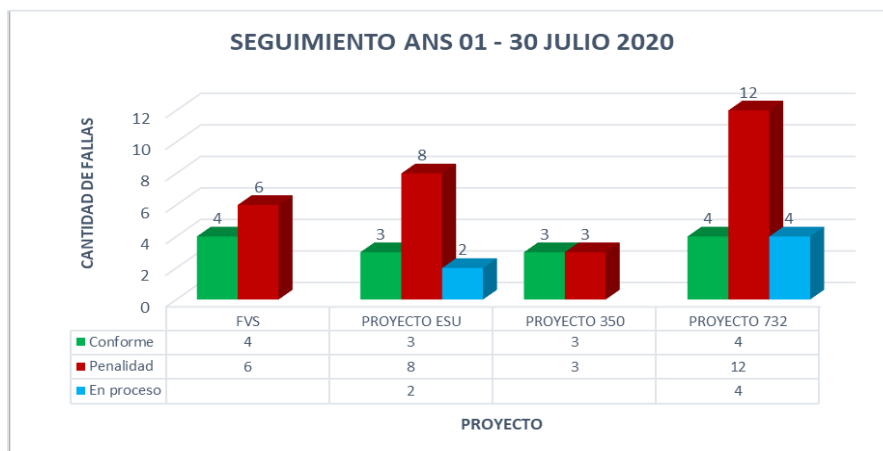


Ilustración 10. Seguimiento ANS 1 al 30 julio 2020

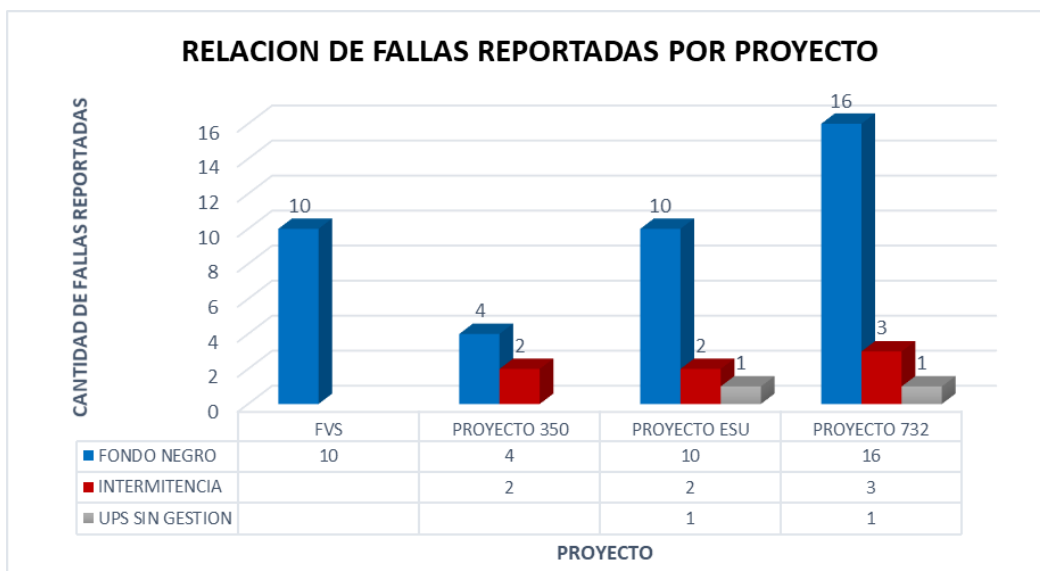


Ilustración 11. Relación de fallas reportadas por proyecto

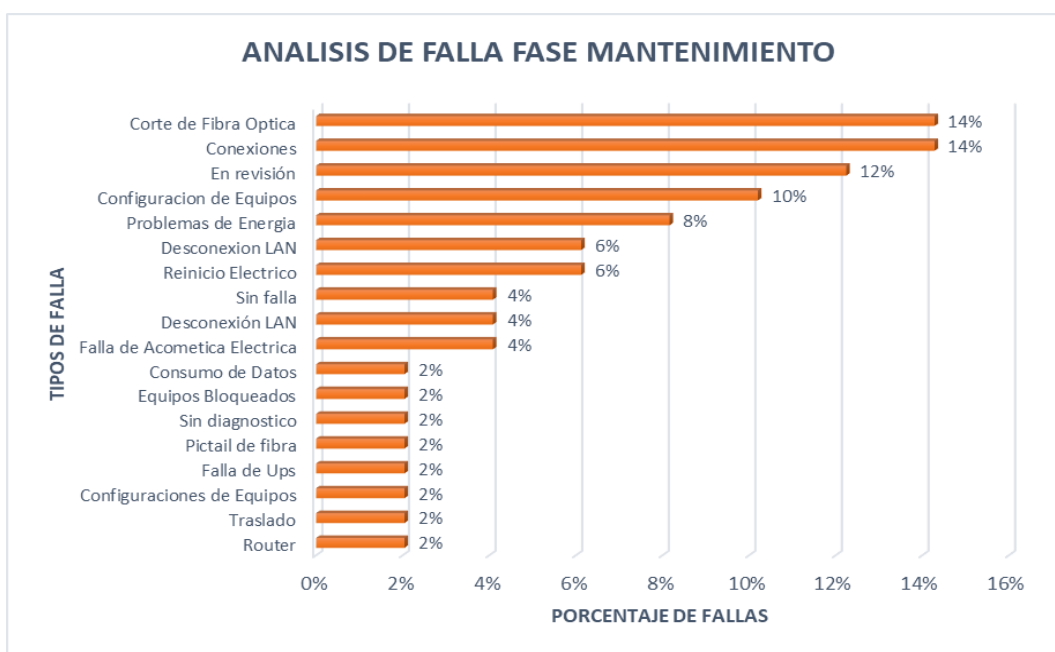


Ilustración 12. Análisis de Falla Fase Mantenimiento

En la gráfica de análisis de fallas se observa que la mayor parte de incidentes reportados a ETB son atribuibles a fallas en un 14% por cortes de fibra óptica que son ocasionados por incidentes de terceros, vandalismo, eventos climáticos y por hilos sueltos en la fibra. Otro gran porcentaje de fallas con un 14% por ajustes de conexiones de equipos que surgen por conectores flojos, mal conectados o por desconexiones en lo equipos realizadas por otros contratistas.

Cabe resaltar que, en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de julio de 2020, ETB y la Interventoría no han realizado la conciliación de estos tickets.

6.5.12.2 Contrato IAD 601

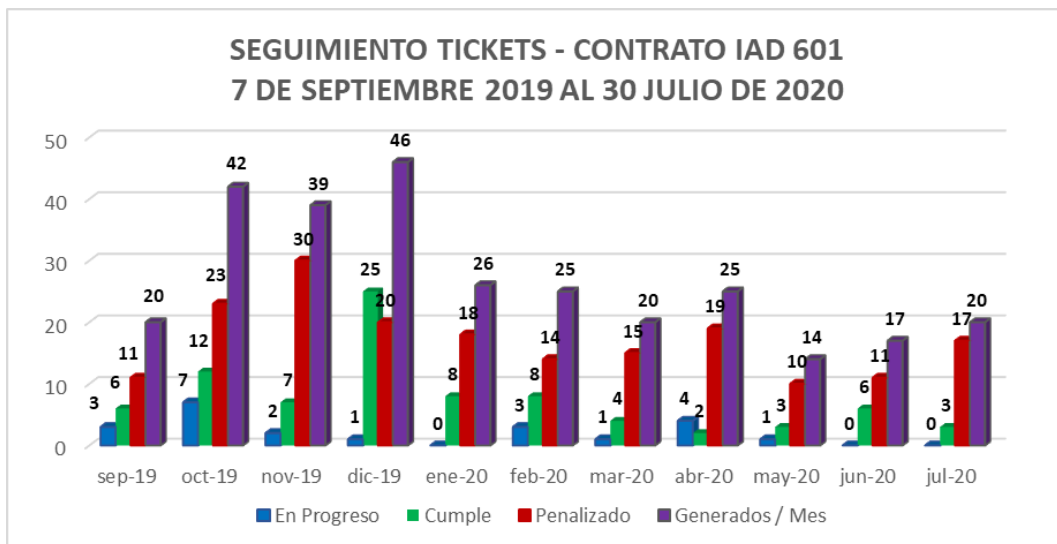


Ilustración 13. Seguimiento Tickets - Contrato IAD 601

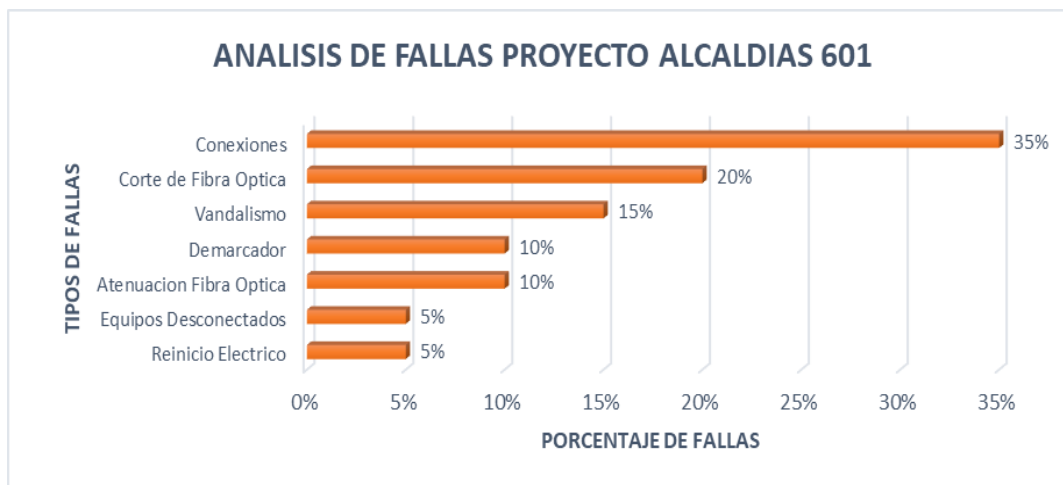


Ilustración 14. Análisis de Falla IAD 601

En la gráfica de análisis de fallas se observa que la mayor parte de incidentes reportados a ETB son atribuibles a fallas en un 35% son por ajustes de conexiones de equipos que surgen por conectores flojos, mal conectados o por desconexiones en lo equipos realizadas por otros contratistas. Otro gran porcentaje de fallas con un 20% son cortes de fibra óptica que son ocasionados por incidentes de terceros, vandalismo, eventos climáticos y por hilos sueltos en la fibra.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Cabe resaltar que, en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de julio de 2020, ETB y la Interventoría no han realizado la conciliación de estos tickets.

6.6 SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y MEDIO AMBIENTE

6.6.1 Objetivo



Reportar los aspectos en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ (E.T.B) que se presentan durante el desarrollo de las actividades ejecutadas en el mes de julio del 2020, como obligación adquirida según el contrato 1020 de 2019.

6.6.2 Seguridad y Salud en el Trabajo

Equipo de trabajo del implementador

Conforme a la ejecución de las labores realizadas por EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ (E.T.B) dentro del periodo anteriormente mencionado, la interventoría realizó el acompañamiento respectivo en campo, supervisando, recomendando y exigiendo que los vehículos y el personal del contratista cumplan con la normatividad legal nacional vigente aplicable en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente acorde a las actividades de **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**.

En consecuencia, de lo anterior, la interventoría relaciona el listado de acompañamiento realizado, los hallazgos encontrados y las acciones llevadas a cabo para prevenir, mitigar y corregir cualquier situación que pueda generar un riesgo laboral, ambiental y/o por emergencia sanitaria COVID-19.

| FECHA | LUGAR | PUNTO | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | CONCEPTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|------------|----------------|-------------|----------------------------------|---|---|
| 03/07/2020 | CIUDAD BOLÍVAR | ESU-204 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. E.T. B | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. TENIENDO EN CUENTA QUE ES VISITA CONJUNTA CON U.T.S.M.V.C. Y CODENSA |  |
| 29/07/2020 | BOSA | CCEAD_L7_23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. E.T. B | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. TENIENDO EN CUENTA QUE ES VISITA CONJUNTA CON U.T.S.M.V.C. |  |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.


| FECHA | LUGAR | PUNTO | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | CONCEPTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|------------|-----------------|--------------|----------------------------------|---|---|
| 30/07/2020 | CUIDAD, BOLÍVAR | SCJ17E190089 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. E.T. B | <p>ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE.</p> <p>TENIENDO EN CUENTA QUE ES VISITA CONJUNTA CON U.T.S.M.V.C.</p> <p>SE DETIENEN ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN EL PUNTO.</p> |  |

Tabla 166. Hallazgos encontrados MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Incidentes

No se presentan incidentes para el mes de julio 2020.

Accidentes de trabajo.

No se registra ocurrencia de accidentes para el mes de julio 2020, ni personal con sintomatología COVID-19.

6.6.3 OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.

Se exige al contratista ETB el cumplimiento del PMT con vigencia del 28 de mayo 2020 al 29 de agosto 2020.

Se exige al contratista ETB el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. (contar con PMT Vigente).

Se exige según protocolo de bioseguridad el cumplimiento estricto como medida de protección contra COVID -19.

6.7 RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFORMES DEL CONTRATISTA

A la fecha de corte del presente documento, el contratista no ha realizado la entrega del informe del mes de julio de 2020, debido a que no se ha realizado la conciliación.

6.8 ANÁLISIS DE RIESGOS

| CAUSA | EVENTO | CONSECUENCIA | GESTIÓN INTERVENTORÍA |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Fallas masivas de visualización en C4 | Desconexiones de energía que afectan los equipos y el funcionamiento del sistema de videovigilancia | Daño de equipos a causa de las fluctuaciones de energía | Se ha reportado a la secretaria las fallas frecuentes que se han presentado debido a que no se cuenta con un buen respaldo de energía en el datacenter. |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| CAUSA | EVENTO | CONSECUENCIA | GESTIÓN INTERVENTORÍA |
|--|--|--|--|
| Debido a que el aprovisionamiento del 100% de los enlaces del contrato 601 de 2017 finalizó durante el mes de diciembre, se sugirió a ETB tener presente el porcentaje de consumo del canal principal en C4. | Es posible las cámaras presenten robotización y saturación por la cantidad de ancho de banda que van a consumir la totalidad de las cámaras, debido a que ya está aprovisionado el 100% de los enlaces del contrato 601. | Lo que ocasionaría que el sistema de videovigilancia presente anomalías en las visualizaciones de las cámaras. | La interventoría solicitó a ETB realizar seguimiento permanente al consumo del enlace principal del C4, teniendo en cuenta que ya se finalizó el aprovisionamiento del 100% de enlaces del contrato 601-Alcaldías. Al momento el consumo no ha sobrepasado las 14Gb. |
| Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el país a causa del COVID-19. | Es posible que no se logre realizar todas las actividades programadas dado que ejercen diferentes variables, frente a los estados de salud y las nuevas medidas sanitas implementadas por el gobierno nacional. | Ocasionaría un retraso en la ejecución de las actividades programadas. | La interventoría, solicitó protocolos, planes de acción y seguimiento al contratista ETB frente a COVID – 19 con el fin de prevenir y mitigar contagio del personal. Así, tomar las medidas necesarias que ajusten los cronogramas de trabajo y el personal. |

Tabla 167. Análisis De Riesgos

6.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ El enlace Backup se encuentra disponible y funciona como respaldo cuando se presenten fallas en el canal principal.
- ✓ La VRF COSEC de 8GB se encuentra en funcionamiento de manera independiente en la MPLS. Desde esta VRF se puede visualizar, monitorear y configurar las cámaras desde cada uno de los Centros de Monitoreo.
- ✓ Durante el mes de julio de 2020, se solicitaron traslados de cámaras los cuales no se alcanzaron a ejecutar durante la vigencia de este contrato y estos se deben tener en cuenta para el seguimiento de esta actividad en el nuevo contrato de conectividad.
- ✓ Para las cámaras móviles se ha realizado un seguimiento sobre el consumo de datos donde se ha evidenciado que el plan móvil adquirido no es suficiente para tener las cámaras operativas todo el mes. Este consumo vario, lo que determina que cada mes las cámaras que quedan sin datos no son las mismas al mes anterior.

7. CONTRATO NO. 780 DE 2019 – UT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019

7.1 FICHA TÉCNICA

| A. INFORMACIÓN GENERAL | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|----------------------|
| NIT | 901.266.433-6 | | | |
| RAZÓN SOCIAL | UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 | | | |
| CIUDAD | BOGOTÁ | | | |
| DIRECCIÓN | Carrera 97 # 24 C-75 Muelle industrial 3 Bodega 46 | | | |
| TELÉFONO | 4132615 | | | |
| I. DATOS DEL CONTRATO | | | | |
| CONTRATO No. | 780 - 2019 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 15/03/2019 | |
| FECHA ACTA DE INICIO CONTRATO | 02/04/2019 | FECHA DE TERMINACIÓN | 01/02/2020 | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 10.000.000.000 incluido IVA del 19% | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 13.981.419.108 incluido IVA del 19% | |
| OBJETO | PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C. CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE RECURSOS. | | | |
| ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA | 02/04/2019 | | | |
| II. Modificación N° 01 | | | | |
| PRORROGA | 2 MESES Y 5 DIAS | FECHA FINAL | 06/04/2020 | |
| ADICION | \$ 0 | VALOR TOTAL | \$ 10.000.000.000 | |
| III. Modificación N° 02 | | | | |
| PRORROGA | 3 MESES | FECHA FINAL | 6/07/2020 | |
| ADICION | \$ 3.981.419.108 | VALOR TOTAL | \$ 13.981.419.108 | |
| IV. Modificación No 03 | | | | |
| PRORROGA | 24 DIAS | FECHA FINAL | 30/07/2020 | |
| ADICION | \$ 0 | VALOR TOTAL | \$ 13.981.419.108 | |
| PLAZO EJECUCION TOTAL | 15 MESES Y 29 DIAS | | | |
| FECHA FIRMA ACTA DE INICIO | 02/04/2019 | | | |
| V. DATOS DEL CONTRATISTA | | | | |
| NOMBRE CONTACTO | ROL | CORREO ELECTRÓNICO | | |
| Jefferson Herrera Abril | Gerente de proyecto | pm@serviciosmvc.com | | |
| Olga Lucía Peña Riveros | Ingeniero de Proyectos | operacion@serviciosmvc.com | | |
| William Olmos | Ingeniero Especialista HelpDesk | especialista@serviciosmvc.com | | |
| Ivonne Hernández Bermeo | Coordinadora SGSST | sgsst@serviciosmvc.com | | |
| B. ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) | |
| 1 | Valor del Contrato | \$10.000.000.000 | 72% | |
| 2 | Valor adición 1 | \$3.981.419.108 | 28% | |
| 3 | Valor total contrato | \$ 13.981.419.108 | 100% | |
| 4 | Valor Facturado | \$12.957.551.633 | 93% | |
| 5 | Valor pendiente por ejecutar | \$1.023.867.475 | 7% | |
| C. INFORMACIÓN JURÍDICA | | | | |
| I. GARANTÍAS DEL CONTRATO | | | | |
| ASEGURADORA | No. DE PÓLIZA | TIPO DE AMPARO | VALOR | PERÍODO DE COBERTURA |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| Seguros del Estado | 15-44-101210289 | Cumplimiento de contrato | \$2.000.000.000 | 26/03/19 A 27/07/20 |
|--|--|---|--------------------|---------------------|
| | 15-44-101210289 | Calidad del servicio | \$2.000.000.000 | 27/01/20 A 27/07/20 |
| | 15-44-101210289 | Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones | \$500.000.000 | 26/03/19 A 27/01/23 |
| | 15-44-101210289 | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | \$500.000.000 | 5 meses y 30 días |
| | 15-40-101057314 | Responsabilidad civil extracontractual | \$500.000.000 | 26/03/19 A 27/01/20 |
| D. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN ANS | TIPO DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO MEDICIÓN | ¿CUMPLE? |
| 1 | Calidad y oportunidad en los reportes entregados | ($2 \geq \text{Devoluciones} \geq 5$) | 0 | Sí |
| 2 | Garantía de Mantenimientos | (Fallas máximas en 1 mes = 0) | 0 | Sí |
| 3 | RTO (Recovery Time Objective) | $\text{RTO} \leq 6$ horas | 24 | NO |
| 4 | Diagnósticos fallidos máximos (1 mes calendario) | (Diagnósticos fallidos = 0) | 2 | NO |
| Observaciones: A la fecha del presente informe se está realizando la conciliación de ANS, estos serán relacionados en el informe final del contrato, estos se encuentran siendo verificadas por la interventoría. | | | | |

Tabla 168. Ficha técnica – Mantenimiento Contrato 780-2019.

7.2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por la interventoría con el objetivo de realizar el seguimiento a la ejecución contractual:

7.2.1 ACTAS DE REUNIÓN SEGUIMIENTO

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. ACTA |
|-----|------------|---|----------|
| 1 | 11/09/2019 | PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE PENDIENTES | MTO-001 |
| 2 | 16/09/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | MTO-002 |
| 3 | 20/09/2019 | REUNIÓN CENTRO COMERCIAL METRÓPOLIS | MTO-003 |
| 4 | 20/09/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – APLICATIVO WEB | MTO-004 |
| 5 | 25/09/2019 | VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE CÁMARAS – ALCALDÍAS – CHAPINERO, PUENTE ARANDA Y TUNJUELITO | MTO-005 |
| 6 | 26/09/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – APLICATIVO WEB | MTO-006 |
| 7 | 2/10/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – CONCILIACIÓN ANS | MTO-007 |
| 8 | 2/10/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | MTO-008 |
| 9 | 7/10/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | MTO-009 |
| 10 | 11/10/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – ACTA DE FACTURACIÓN | MTO-010 |
| 11 | 15/10/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | MTO-011 |
| 12 | 17/10/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – MOVIMIENTO DE PUNTO DE CÁMARA | MTO-012 |
| 13 | 29/10/2019 | REUNIÓN INICIO ESTACIONES DE POLICIA | 001 |
| 14 | 31/10/2019 | AUTORIZACIÓN A UT SMVC PARA INTERVENCIÓN DE EQUIPOS DE HIPERCONVERGENCIA | MTO-0013 |
| 15 | 31/10/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – VALIDACION MESA DE AYUDA | MTO-014 |
| 16 | 5/11/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | MTO-016 |
| 17 | 5/11/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIETO | MTO-017 |
| 18 | 6/11/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – ACTA DE FACTURACIÓN | MTO-018 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. ACTA |
|-----|------------|---|----------|
| 19 | 12/11/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | MTO-019 |
| 20 | 7/11/2019 | REUNIÓN JEFES DE SALA | MTO-020 |
| 21 | 14/11/2019 | REUNIÓN DE PANELES SOLARES | 0021 |
| 22 | 1/11/2019 | REUNIÓN DE ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA | 0022 |
| 23 | 19/11/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | MTO-023 |
| 24 | 20/11/2019 | REUNION AVANCE DE MIGRACION Y UNIFICACIÓN DE VMS ISS SECROS | MTO-24 |
| 25 | 25/11/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – APLICATIVO WEB (GLPI) | MTO-025 |
| 26 | 26/11/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | MTO-026 |
| 27 | 28/11/2019 | REUNIÓN AUTORIZACION INFRAESTRUCTURA SEGURITECH | MTO-027 |
| 28 | 29/11/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MESA DE AYUDA | MTO-028 |
| 29 | 02/12/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – CONCILIACIÓN ANS | MTO-029 |
| 30 | 02/12/2019 | REUNION DE SEGUIMIENTO CON LA SDSCJ | MTO-030 |
| 31 | 05/12/2019 | REUNION DE SEGUIMIENTO CONJUNTA CON ETB | MTO-031 |
| 32 | 06/12/2019 | REUNION SALA DE VIDEO KENNEDY | MTO-032 |
| 33 | 09/12/2019 | REUNION SALA DE VIDEO CHAPINERO | MTO-033 |
| 34 | 16/12/2019 | REUNION DE SEGUIMIENTO | MTO-034 |
| 35 | 18/12/2019 | REUNION DE SEGUIMIENTO DE MESA DE AYUDA. | MTO-035 |
| 36 | 18/12/2019 | REUNION SALA DE VIDEO PUENTE ARANDA | MTO-036 |
| 37 | 18/12/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – APLICATIVO WEB (GLPI) | MTO-037 |
| 38 | 19/12/2019 | REUNION SALA DE VIDEO CIUDAD BOLIVAR | MTO-038 |
| 39 | 26/12/2019 | REUNION DE SEGUIMIENTO | MTO-039 |
| 40 | 26/12/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – APLICATIVO WEB (GLPI) | MTO-040 |
| 41 | 26/12/2019 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SSTA | MTO-041 |
| 42 | 27/12/2019 | REUNION SALA DE VIDEO ENGATIVA | MTO-042 |
| 43 | 30/12/2019 | REUNION SALA DE VIDEO BARRIOS UNIDOS | MTO-043 |
| 44 | 31/12/2019 | REUNION SALA DE VIDEO TEUSAQUILLO | MTO-044 |
| 45 | 2/01/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – CONCILIACIÓN ANS | MTO-045 |
| 46 | 16/01/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – ACTA DE FACTURACIÓN | MTO-046 |
| 47 | 16/01/202 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – ACTA DE FACTURACIÓN | MTO-047 |
| 48 | 9/01/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO | MTO-048 |
| 49 | 22/01/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO | MTO-049 |
| 50 | 27/01/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – APLICATIVO WEB GLPI | MTO-050 |
| 51 | 31/01/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO | MTO-051 |
| 52 | 31/01/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO DE MESA DE AYUDA. | MTO-052 |
| 53 | 06/02/2020 | REUNION 732 -2017 / AFINAMIENTO | MTO-052 |
| 54 | 7/02/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – CONCILIACIÓN ANS | MTO-053 |
| 55 | 11/02/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – ACTA DE FACTURACIÓN | MTO-054 |
| 56 | 11/02/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – ACTA DE FACTURACIÓN | MTO-055 |
| 57 | 14/02/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO | MTO-056 |
| 58 | 18/02/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO CONJUNTA CON ETB | MTO-057 |
| 59 | 24/02/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO | MTO-058 |
| 60 | 27/02/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SSTA | MTO-059 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. ACTA |
|-----|------------|---|-----------------|
| 61 | 28/02/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – CONCILIACIÓN ANS | MTO-060 |
| 62 | 28/02/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – APLICATIVO WEB GLPI | MTO-061 |
| 63 | 28/02/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO DE MESA DE AYUDA. | MTO-062 |
| 64 | 02/03/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO | MTO - 063 |
| 65 | 06/03/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – ACTA DE FACTURACIÓN | MTO - 064 |
| 66 | 13/03/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – ACTA DE FACTURACIÓN | MTO - 065 |
| 67 | 09/03/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO | MTO - 066 |
| 68 | 09/03/2020 | REUNIÓN CONJUNTA CON ETB | MTO - 067 |
| 69 | 16/03/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO | MTO - 068 |
| 70 | 19/03/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO C4 | MTO -C4 001 |
| 71 | 24/03/2020 | ACTA DE CAPACITACIÓN | MTO-CAP- 001 |
| 72 | 24/03/2020 | ACTA DE CAPACITACIÓN | MTO-CAP- 002 |
| 73 | 24/03/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO | MTO - 069 |
| 74 | 24/03/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – CONCILIACIÓN ANS | MTO - 070 |
| 75 | 24/03/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – APLICATIVO WEB GLPI | MTO - 071 |
| 76 | 24/03/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO DE MESA DE AYUDA. | MTO - 072 |
| 77 | 15/04/20 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – ACTA DE FACTURACIÓN | MTO - 073 |
| 78 | 06/04/20 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | MTO - 074 |
| 79 | 13/04/20 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | MTO - 075 |
| 80 | 21/04/20 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | MTO - 076 |
| 81 | 28/04/20 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO C4 | MTO - 077 |
| 82 | 29/04/20 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | MTO - 078 |
| 83 | 30/04/20 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – CONCILIACIÓN ANS | MTO - 079 |
| 84 | 30/04/20 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – APLICATIVO WEB GLPI | MTO – 080 |
| 85 | 30/04/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO DE MESA DE AYUDA. | MTO - 081 |
| 86 | 05/05/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO C4 | MTO - 082 |
| 87 | 06/05/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | MTO – 083 |
| 88 | 12/05/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO C4 | MTO – 084 |
| 89 | 13/05/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | MTO – 085 |
| 90 | 14/05/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – ACTA DE FACTURACIÓN | MTO - 086 |
| 91 | 19/05/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO C4 | MTO – 087 |
| 92 | 20/05/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | MTO – 088 |
| 93 | 26/05/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO C4 | MTO – 089 |
| 94 | 27/05/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | MTO – 090 |
| 95 | 30/05/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO - MEBOG | MTO – 091 |
| 96 | 30/05/2020 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE LABORATORIO. | MTO - 092 |
| 97 | 30/05/2020 | ACTA DE VERIFICACION DE CENTRO DE OPERACIONES | MTO – 093 |
| 99 | 30/05/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – CONCILIACIÓN ANS | MTO – 094 |
| 100 | 30/05/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – APLICATIVO WEB GLPI | MTO – 095 |
| 101 | 30/05/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO DE MESA DE AYUDA | MTO – 096 |
| 102 | 02/06/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO C4 | MTO - 097 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | NO. ACTA |
|-----|------------|---|-----------|
| 103 | 03/06/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO ORDINARIO | MTO - 098 |
| 104 | 09/06/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO C4 | MTO – 099 |
| 105 | 10/06/2020 | ACTA ACLARACIÓN ESTACIONES DE TRABAJO | MTO - 100 |
| 106 | 12/06/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – ACTA DE FACTURACIÓN | MTO - 101 |
| 107 | 12/06/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO ORDINARIO | MTO – 102 |
| 108 | 16/06/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO C4 | MTO – 103 |
| 109 | 18/06/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO ORDINARIO | MTO – 104 |
| 110 | 23/06/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO C4 | MTO – 105 |
| 111 | 25/06/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO ORDINARIO | MTO-106 |
| 112 | 30/06/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO C4 | MTO-107 |
| 113 | 30/06/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – APLICATIVO WEB GLPI | MTO-108 |
| 114 | 30/06/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO DE MESA DE AYUDA | MTO-109 |
| 115 | 02/07/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – CONCILIACIÓN ANS | MTO-110 |
| 116 | 07/07/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO C4 | MTO-111 |
| 117 | 08/07/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO ORDINARIO | MTO-112 |
| 118 | 14/07/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO C4 | MTO-113 |
| 119 | 16/07/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – ACTA DE FACTURACIÓN | MTO-114 |
| 120 | 17/07/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO ORDINARIO | MTO-115 |
| 121 | 21/07/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO C4 | MTO-116 |
| 122 | 23/07/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO ORDINARIO | MTO-117 |
| 123 | 28/07/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – C4 | MTO-118 |
| 124 | 30/07/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO ORDINARIO CIERRE | MTO-119 |
| 125 | 30/07/2020 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE LABORATORIO. | MTO-120 |
| 126 | 30/07/2020 | ACTA DE CIERRE COSEC BARRIOS UNIDOS | MTO-121 |
| 127 | 30/07/2020 | ACTA DE CIERRE COSEC ENGATIVA | MTO-122 |
| 128 | 30/07/2020 | ACTA DE CIERRE COSEC TEUSAQUILLO | MTO-123 |
| 129 | 30/07/2020 | ACTA DE CIERRE CAD-C4 | MTO-124 |
| 130 | 30/07/2020 | ACTA DE VERIFICACION DE CENTRO DE OPERACIONES | MTO-125 |
| 131 | 30/07/2020 | REUNION DE SEGUIMIENTO DE MESA DE AYUDA | MTO-126 |
| 132 | 30/07/2020 | REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – APLICATIVO WEB GLPI | MTO-127 |

Tabla 169. Actas de reunión seguimiento mantenimiento

7.2.2 COMUNICACIONES

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | No. REGISTRO | REMITENTE | DESTINATARIO |
|-----|------------|--|-----------------------|---------------|---|
| 1 | 13/09/2019 | SOLICITUD CONTRATOS OBJETO DE INTERVENTORÍA E INFORME FINAL INTERVENTORÍA ANTERIOR | P136 -SSCJ-00008-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|----|------------|---|--------------------------------|---------------|---|
| 2 | 13/09/2019 | TRASLADO PUNTO DE CÁMARA CENTRO COMERCIAL METRÓPOLIS | P136 - UTMTO- 00009-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 3 | 13/09/2019 | SOLICITUD DE HINCADO DE POSTE - PUNTOS MEBOG | P136- UTMTO- 00010-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 4 | 13/09/2019 | HITOS DE FACTURACIÓN | P136- UTMTO- 00013-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 5 | 16/09/2019 | SOPORTES PAC SEPTIEMBRE | CSS-P136- 0002-2019- REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 6 | 16/09/2019 | RESPUESTA A SOLICITUD DE REUBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ESU 204,205 Y 249 CÁMARAS MÓVILES | P136-SSCJ- 00014-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| 7 | 16/09/2019 | RESPUESTA A SOLICITUD DE GESTIÓN PARA EL TRASLADO DEL PUNTO AL 1620 | P136-SSCJ- 00015-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| 8 | 16/09/2019 | SOLICITUD DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS COLEGIO COMPARTIR EL RECUERDO/PROYECTO COLEGIOS | P136- UTMTO- 00018-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 9 | 16/09/2019 | SOLICITUD DE TRÁMITE DE PERMISOS DE INGRESO COLEGIO NUEVO CHILE/PROYECTO COLEGIOS | P136-SED- 00019-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL |
| 10 | 16/09/2019 | SOLICITUD DE TRÁMITE DE PERMISOS DE INGRESO COLEGIO MARÍA MONTESSORI/PROYECTO COLEGIOS | P136-SED- 00020-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL |
| 11 | 16/09/2019 | SOLICITUD DE TRÁMITE DE PERMISOS DE INGRESO COLEGIO REPÚBLICA DE MÉXICO/PROYECTO COLEGIOS | P136-SED- 00021-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL |
| 12 | 16/09/2019 | SOLICITUD DE VISITA CONJUNTA ETB-CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO UTMVC | P136- UTMTO- 00023-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 13 | 17/09/2019 | CORTE DE ACTIVIDADES PARA INFORME MENSUAL | P136- UTMTO- 00028-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 14 | 17/09/2019 | OFICIO DE PRESENTACIÓN INTERVENTORÍA | CSS-P136- 00004-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 15 | 18/09/2019 | DIAGNÓSTICO DE FALLAS PANELES SOLARES | P136- UTMTO- 00030-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 16 | 18/09/2019 | GARANTÍAS DEL DERIVADO 4 (PROYECTO ESU) | P136-SSCJ- 00031-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| 17 | 18/09/2019 | PLANTILLA GLPI | P136- UTMTO- 00034-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|----|------------|---|------------------------|---------------|---|
| 18 | 18/09/2019 | P136-UTMTO-00018-2019-SOLICITUD DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO/PROYECTO COLEGIOS | P136-UTMTO-00036-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 19 | 19/09/2019 | SOPORTES PAC SEPTIEMBRE | CSS-P136-0004-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 20 | 19/09/2019 | PROGRAMACIÓN SEGUNDA RONDA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CAI | CSS-P136-0003-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 21 | 19/09/2019 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN COLEGIOS CONTRATO 780 DE 2019 | P136-UTMTO-00038-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 22 | 19/09/2019 | SOLICITUD DE AVANCES CON RESPECTO A LA INSTALACIÓN DEL PUNTO VIDEO VIGILANCIA 1966 PROYECTO 350 | P136-UTMTO-00039-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 23 | 19/09/2019 | SOLICITUD DE AVANCES CON RESPECTO A LA INSTALACIÓN DE LOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA (4815-FVS, SCJ17FJ0011-732, SCJ18FJ_F5-732). | P136-UTMTO-00040-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 24 | 19/09/2019 | SOLICITUD DE VISITA DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA EL HINCADO DE POSTES | P136-UTMTO-00042-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 25 | 19/09/2019 | SOLICITUD DE INVENTARIOS DETALLADOS PROYECTOS CAI'S, COLEGIOS, CTP Y TRANSMILENIO | P136-UTMTO-00044-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 26 | 19/09/2019 | PROYECCIÓN DE PAC OCTUBRE Y NOVIEMBRE | P136-UTMTO-00045-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 27 | 19/09/2019 | SOLICITUD DE COTIZACIONES DE ELEMENTOS NO INCLUIDO EN LA BOLSA DE REPUESTOS | P136-UTMTO-00046-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 28 | 19/09/2019 | ATENDER DEMANDA DE ACRÍLICOS SUCIOS | P136-UTMTO-00047-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 29 | 19/09/2019 | RESPUESTA DEL REPORTE NOVEDADES MEBOG | P136-SSCJ-00048-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| 30 | 19/09/2019 | SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE EQUIPOS CONTRATO 780 DE 2019 | P136-UTMTO-00050-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 31 | 19/09/2019 | SOLICITUD DE AVANCES CON RESPECTO A LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA, (SCJ18ESP00007_1, SCJ18ES | P136-UTMTO-00051-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 32 | 20/09/2019 | SOPORTES PAC SEPTIEMBRE | CSS-P136-0005-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 33 | 23/09/2019 | PLAN DE TRABAJO MANTENIMIENTO CORRECTIVO COSEC | CSS-P136-0010-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 34 | 23/09/2019 | PLAN DE CHOQUE DE LIMPIEZA DE ACRÍLICOS | CSS-P136-0009-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|----|------------|---|------------------------|---------------|---|
| 35 | 23/09/2019 | PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO A C4 | CSS-P136-0008-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 36 | 23/09/2019 | SEGUNDA RONDA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS FVS | CSS-P136-0007-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 37 | 23/09/2019 | EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL PUNTOS PROYECTO ESU | CSS-P136-0006-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 38 | 23/09/2019 | SOLICITUD DE PERMISOS DE INGRESO PARA LA ESTACIÓN DE HÉROES/PROYECTO TRANSMILENIO | P136-TMSA-00060-2019 | INTERVENTORÍA | TRANSMILENIO S.A. |
| 39 | 24/09/2019 | SOPORTES PAC SEPTIEMBRE - ACTAS HASTA EL 24 | CSS-P136-0011-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 40 | 25/09/2019 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN UPS Y ALARMAS. | P136-UTMTO-00067-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| 41 | 25/09/2019 | SOLICITUD DE INVENTARIOS DETALLADOS PROYECTOS CAI'S, COLEGIOS, CTP Y TRANSMILENIO | P136-UTMTO-00068-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| 42 | 25/09/2019 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN INICIO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN CAÍS | P136-UTMTO-00071-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 43 | 26/09/2019 | COTIZACIÓN - GABINETE SOBRE ASCENSOR - ESTADIO | CSS-P136-0017-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 44 | 26/09/2019 | INFORME DE INSTALACIÓN SOLUCIÓN SOLAR EL REDENTOR | CSS-P136-0016-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 45 | 26/09/2019 | SOPORTES PAC SEPTIEMBRE - ACTAS HASTA EL 26 | CSS-P136-0015-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 46 | 26/09/2019 | INFORMACIÓN DE AUTORIZACIÓN INICIO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEGUNDA RONDA EN CAÍS | P136-SSCJ-00075-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| 47 | 26/09/2019 | SOLICITUD DE RESPUESTA AL REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN | P136-UTMTO-00076-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 48 | 26/09/2019 | SOLICITUD DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS COLEGIO TÉCNICO INTERNACIONAL/PROYECTO COLEGIOS | P136-UTMTO-00077-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 49 | 26/09/2019 | SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA COLEGIO TÉCNICO INTERNACIONAL/PROYECTO COLEGIOS | P136-UTMTO-00078-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 50 | 27/09/2019 | INFORME EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL PUNTOS PROYECTO ESU | CSS-P136-0019-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 51 | 27/09/2019 | PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ESU | CSS-P136-0018-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|----|------------|---|------------------------|---------------|---|
| 52 | 27/09/2019 | RESPUESTA A SOLICITUD DE QUEJA PMT EN EL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA SCJ17FJ0005_1, UBICADO EN LA DIRECCIÓN AUTO NORTE - CALLE 200(| P136-SSCJ-00085-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| 53 | 27/09/2019 | ACTUALIZACIÓN DE PERMISOS DE INGRESO C4 - MENSUAL | P136-SSCJ-00088-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| 54 | 29/09/2019 | FALLA DE MOVILIDAD PTZ | P136-UTMTO-00090-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 55 | 30/09/2019 | COTIZACIÓN NO. 23 PARA INCLUIR AL ANEXO 2 - BOLSA MATERIALES | CSS-P136-0021-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 56 | 30/09/2019 | PLAN TRABAJO INTEGRACIÓN CÁMARAS Y MIGRACIÓN COSEC'S | CSS-P136-0020-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 57 | 30/09/2019 | SOLICITUD DE INFORME DE FALLA RECURRENTE EQUIPOS BLOQUEADOS ETB PROYECTO 732 | P136-UTMTO-00091-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 58 | 30/09/2019 | SOLICITUD DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO/PROYECTO COLEGIOS | P136-UTMTO-00092-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 59 | 30/09/2019 | SOLICITUD DE VISITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO SPT PUNTO MB965/PROYECTO ALCALDÍAS | P136-UTMTO-00093-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 60 | 30/09/2019 | SOLICITUD DE VISITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO SPT PUNTO SCJ17E130073/PROYECTO 732 | P136-UTMTO-00094-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 61 | 30/09/2019 | OBSERVACIONES AL INFORME DE LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA, (SCJ18ESP00007_1, SCJ18ESP00008_1 | P136-UTMTO-00098-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 62 | 1/10/2019 | COTIZACIÓN NO. 24 PARA INCLUIR AL ANEXO NO. 2 - BOLSA DE MAT | CSS-P136-0023-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 63 | 1/10/2019 | SOPORTE PAC OCTUBRE - ACTAS HASTA 01-10-19 | CSS-P136-0022-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 64 | 1/10/2019 | MATRIZ DE RIESGOS PERSONAL C4 | P136-UTMTO-00100-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 65 | 2/10/2019 | DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y VEHÍCULOS | CSS-P136-0024-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 66 | 2/10/2019 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN INICIO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PRIMERA RONDA EN PROYECTO ESU | P136-UTMTO-00105-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 67 | 2/10/2019 | REITERACIÓN DE SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE EQUIPOS CONTRATO 780 DE 2019 | P136-UTMTO-00109-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|----|-----------|--|------------------------|---------------|---|
| 68 | 2/10/2019 | RESULTADO DE REVISION DE ACTAS ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA UTMVC Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA | P136-UTMTO-00111-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 69 | 2/10/2019 | SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA COLEGIO MARIA MONTESSORI/PROYECTO COLEGIOS | P136-UTMTO-00106-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 70 | 2/10/2019 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0010-2019-REC CON ASUNTO PLAN DE TRABAJO MANTENIMIENTO CORRECTIVO COSEC CHAPINERO, CIUDAD BOLIVAR | P136-UTMTO-00112-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 71 | 3/10/2019 | SOPORTES PAC OCTUBRE - ACTAS HASTA EL 03-10-19 | CSS-P136-0025-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 72 | 3/10/2019 | SOLICITUD DE TRÁMITE DE PERMISOS DE INGRESO COLEGIO NUEVO CHILE/PROYECTO COLEGIOS | P136-SED-00115-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL |
| 73 | 3/10/2019 | RESPUESTA AL ESTUDIO DE SOLUCIÓN SOLAR | P136-UTMTO-00119-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 74 | 3/10/2019 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0020-2019-REC CON ASUNTO PLAN DE TRABAJO INTEGRACIÓN CÁMARAS Y MIGRACIÓN COSEC'S, CONTRATO 780 DE | P136-UTMTO-00120-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 75 | 3/10/2019 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0017-2019-REC CON ASUNTO: GABINETE SOBRE ASCENSOR - ESTADIO. | P136-UTMTO-00121-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 76 | 3/10/2019 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0007-2019-REC CON ASUNTO 2° RONDA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS FVS - CONTRATO 780 DE 2019. | P136-UTMTO-00122-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 77 | 3/10/2019 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0008-2019-REC CON ASUNTO PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO A C4. | P136-UTMTO-00123-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 78 | 3/10/2019 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN FALLA COLEGIOS. | P136-UTMTO-00124-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 79 | 4/10/2019 | INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE | CSS-P136-0027-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 80 | 4/10/2019 | ENVÍO A LA SDSCJ PLAN DE TRABAJO MANTENIMIENTO CORRECTIVO COSEC CHAPINERO, CIUDAD BOLIVAR Y PUENTE ARANDA. CONTRATO 780 DE 2019 | P136-SSCJ-00128-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| 81 | 8/10/2019 | EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PUNTOS DE VIDEO | CSS-P136-0032-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 82 | 8/10/2019 | REPORTE REINICIO EQUIPOS DE 732 DE 2017 | CSS-P136-0030-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 83 | 8/10/2019 | SOPORTES PAC OCTUBRE - ACTAS HASTA EL 05-10-19 | CSS-P136-0029-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 84 | 9/10/2019 | SOLICITUD DE TRÁMITE DE PERMISOS DE INGRESO COLEGIO NUEVO CHILE/PROYECTO COLEGIOS | P136-SED-00146-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL |
| 85 | 9/10/2019 | SOLICITUD DE TRÁMITE DE PERMISOS DE INGRESO COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN | P136-SED-00147-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL |
| 86 | 9/10/2019 | SOLICITUD DE PERMISOS PARA ESTACIONAR CARRO CANASTA DE ETB, SOBRE EL CARRIL DE TRANSMILENIO ESTACIÓN PROFAMILIA/PROYECTO | P136-TMSA-00145-2019 | INTERVENTORÍA | TRANSMILENIO S.A. |
| 87 | 10/10/2019 | SOPORTES PAC OCTUBRE - ACTAS HASTA 10 DE OCTUBRE | CSS-P136-0034-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 88 | 10/10/2019 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0030-2019-REC CON ASUNTO REPORTE REINICIO EQUIPOS DE 732 DE 2017 - CONTRATO 780 DE 2019. | P136-UTMTO-00148-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 89 | 11/10/2019 | INFORMACIÓN RELACIONADA A LA VISITA TÉCNICA REALIZADA AL COLEGIO MARIA MONTESSORI/PROYECTO COLEGIOS | P136-SED-00162-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL |
| 90 | 15/10/2019 | RESPUESTA AL CORREO "MANTENIMIENTO ESTACIONES DE POLICÍA" DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019 | P136-UTMTO-00168-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 91 | 15/10/2019 | SOLICITUD DE SUBSANACIÓN DEL CARGO INSPECTOR SST. | P136-UTMTO-00171-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 92 | 16/10/2019 | SEGUNDA ENTREGA INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE | CSS-P136-0038-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 93 | 16/10/2019 | FACTURA NO. 11 SEPTIEMBRE | CSS-P136-0037-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 94 | 17/10/2019 | ACTAS INTERVENTORIA ANTERIOR PARA INCLUIR EN EL PAC DE OCTUBRE | CSS-P136-0043-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 95 | 17/10/2019 | ACTAS INTERVENTORIA ANTERIOR PARA INCLUIR EN EL PAC DE OCTUBRE | CSS-P136-0042-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 96 | 17/10/2019 | PLAN DE TRABAJO MANTENIMIENTO ESTACIONES DE POLICÍA | CSS-P136-0041-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 97 | 17/10/2019 | LIMPIEZA DE ACRÍLICOS | CSS-P136-0040-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 98 | 17/10/2019 | COTIZACIÓN NO. 25 - BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPOS | CSS-P136-0039-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 99 | 17/10/2019 | APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATISTA UTMVC | P136-UTMTO-00194-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 100 | 17/10/2019 | RESPUESTA AL INFORME DE ESTACIÓN RICAURTE CAMBIO DE FIBRA | P136-UTMTO-00198-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 101 | 18/10/2019 | SOPORTES PAC OCTUBRE | CSS-P136-0046-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|---|
| 102 | 18/10/2019 | RESULTADO DE REVISIÓN DE ACTAS ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA UT SMVC Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA | P136-UTMTO-00205-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 103 | 21/10/2019 | RESPUESTA AL OFICIO CSS-P136-0021-2019-REC "COTIZACION N°023 PARA INCLUIR AL ANEXO N° 2 / BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPOS CONTRATO | P136-UTMTO-00217-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 104 | 22/10/2019 | SOPORTES PAC OCTUBRE - ACTAS HASTA EL 22 | CSS-P136-0047-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 105 | 23/10/2019 | SOLICITUD DE TRÁMITE DE PERMISOS DE INGRESO A LOS COLEGIOS MOTIVO ELECCIONES 27/10/2019 /PROYECTO COLEGIOS | P136-SED-00223-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL |
| 106 | 24/10/2019 | SOLICITUD DE GESTIÓN DE RETIRO PARA EL SERVIDOR INDIGO VISIÓN UBICADO EN EL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR- CONTRATO 780 DE 2019 | P136-SSCJ-00231-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| 107 | 24/10/2019 | SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA LOS PUNTOS SCJ17E050084 Y SCJ17E010086, CORRESPONDIENTE PROYECTO 732 | P136-UTMTO-00236-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 108 | 24/10/2019 | SOLICITUD DE REUNIÓN INICIO PROYECTO MANTENIMIENTO CCTV ESTACIONES DE POLICÍA. | P136-MEBOG-00232-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 109 | 24/10/2019 | SOLICITUD DE RESPUESTA AL REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN-COLEGIO RAMÓN DE ZUBIRÍA /PROYECTO COLEGIOS | P136-SED-00226-2019 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL |
| 110 | 24/10/2019 | RESPUESTA AL OFICIO CSS-P136-0023-2019-REC "COTIZACION N°024 PARA INCLUIR AL ANEXO N° 2 / BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPOS CONTRATO | P136-UTMTO-00228-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 111 | 25/10/2019 | SOPORTES PAC OCTUBRE - ACTAS HASTA EL 24 | CSS-P136-0051-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 112 | 25/10/2019 | COTIZACIÓN NO. 26 INCLUIR ANEXO 2 | CSS-P136-0050-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 113 | 28/10/2019 | COTIZACIÓN - MIGRACIÓN HACIA ISS SECUROS CÁMARAS ANTIGUAS | CSS-P136-0054-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 114 | 28/10/2019 | SOLICITUD AUTORIZACIÓN TARJETAS SNMP | CSS-P136-0053-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 115 | 28/10/2019 | RESPUESTA AL OFICIO CSS-P136-0050-2019-REC "COTIZACION N°026 PARA INCLUIR AL ANEXO N° 2 / BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPOS CONTRATO | P136-UTMTO-00251-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 116 | 29/10/2019 | SOPORTES PAC NOVIEMBRE - ACTAS HASTA 29 OCTUBRE | CSS-P136-0056-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| 117 | 29/10/2019 | RESULTADO DE REVISIÓN DE ACTAS ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA UT SMVC Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA | P136-UTMTO-00261-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 118 | 29/10/2019 | RESPUESTA AL OFICIO CSS-P136-0039-2019-REC "COTIZACION N°026 PARA INCLUIR AL ANEXO N° 2 / BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPOS CONTRATO | P136-UTMTO-00254-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 119 | 29/10/2019 | SOLICITUD INFORMACIÓN SSTA PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL | P136-UTMTO-00255-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 120 | 30/10/2019 | VISITAS DE SITE SURVEY PARA 12 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA PROYECTO FVS | P136-MEBOG-00271-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 121 | 30/10/2019 | SOLICITUD ATENCIÓN MIGRACIÓN VRF COSECS Y ENLACE DE BACK UP C4 | P136-UTMTO-00263-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 122 | 30/10/2019 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0054-2019-REC "COTIZACION - MIGRACION HACIA ISS SECUROS DE CAMARAS ANTIGUAS (FVS, 350, ESU) ASOCI | P136-UTMTO-00264-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 123 | 31/10/2019 | DOCUMENTACIÓN SERVICIOS EJECUTADOS EN SEPTI DATA CENTER Y C4 | CSS-P136-0065-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 124 | 31/10/2019 | INFORME SUBSANACIÓN DAÑO FIBRA ÓPTICA ESTACIÓN TM SA RICAURTE | CSS-P136-0064-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 125 | 31/10/2019 | SOPORTES PAC NOVIEMBRE - ACTAS HASTA EL 31 OCTUBRE | CSS-P136-0063-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 126 | 31/10/2019 | DOCUMENTACIÓN SERVICIOS EJECUTADOS EN AGOSTO DATA CENTER Y C4 | CSS-P136-0060-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 127 | 31/10/2019 | COTIZACIÓN - SERVICIOS ANÁLISIS DE CALIDAD DE RED ELÉCTRICA | CSS-P136-0059-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 128 | 31/10/2019 | COTIZACIÓN - PROYECTO MIGRACIÓN Y UNIFICACIÓN DE COSECS | CSS-P136-0058-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 129 | 1/11/2019 | VISITAS DE SITE SURVEY PARA LOS 2 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADOS EN EL REDENTOR PROYECTO 732 | P136-MEBOG-00276-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 130 | 5/11/2019 | DOCUMENTACIÓN PERSONAL - SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE | CSS-P136-0066-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 131 | 6/11/2019 | FACTURA NO. 12 - SEPTIEMBRE | CSS-P136-0069-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 132 | 6/11/2019 | COTIZACIÓN N°027 PARA INCLUIR AL ANEXO N° 2 PARQUE SIMÓN BOLÍVAR/ BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPOS CONTRATO SCJ 780-2019 | P136-UTMTO-00280-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 133 | 6/11/2019 | RECEPCIÓN CÁMARAS PROYECTO ALCALDÍAS | P136-UTMTO-00282-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 134 | 6/11/2019 | SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA PUNTO CÁMARA 3228/ PROYECTO ALCALDÍAS | P136-UTMTO-00283-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 135 | 7/11/2019 | INFORME MENSUAL OCTUBRE | CSS-P136-0070-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|---------------|
| 136 | 7/11/2019 | INFORME ENTREGA HINCADO DE POSTES | CSS-P136-0071-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 137 | 7/11/2019 | INFORME DE INSTALACIÓN SOLUCIÓN SOLAR EL REDENTOR | CSS-P136-0072-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 138 | 7/11/2019 | APROBACIÓN PLAN DE GESTIÓN | CSS-P136-0073-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 139 | 7/11/2019 | SOPORTES PAC NOVIEMBRE - ACTAS HASTA EL 31 DE OCTUBRE | CSS-P136-0074-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 140 | 7/11/2019 | SOLICITUD DE HINCADO DE POSTES PARA LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA A TRANSLADAR ESU-223 Y ESU-211 SOLICITADOS POR LA OAIEE | P136-UTMTO-00290-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 141 | 8/11/2019 | SOLICITUD PROPUESTA ECONOMICA COORDENADAS NUSE | P136-UTMTO-00295-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 142 | 12/11/2019 | SOPORTES PAC NOVIEMBRE - ACTAS HASTA EL 1 NOVIEMBRE | CSS-P136-0075-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 143 | 12/11/2019 | ELEMENTOS ENTREGADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA | CSS-P136-0076-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 144 | 13/11/2019 | INFORME DESMONTE DE PUNTO DE VIGILANCIA REEMPLAZO DE POSTES | CSS-P136-0079-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 145 | 13/11/2019 | INFORME DESMONTE DE PUNTO DE VIGILANCIA REEMPLAZO DE POSTES | CSS-P136-0080-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 146 | 13/11/2019 | INFORME DESMONTE DE PUNTO DE VIGILANCIA REEMPLAZO DE POSTES | CSS-P136-0081-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 147 | 13/11/2019 | INFORME DESMONTE DE PUNTO DE VIGILANCIA REEMPLAZO DE POSTES | CSS-P136-0082-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 148 | 13/11/2019 | VINCULACIÓN DE RED VIDEO VIGILANCIA A INTERNET | CSS-P136-0083-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 149 | 13/11/2019 | SOPORTES PAC NOVIEMBRE - ACTAS HASTA EL 4 NOVIEMBRE | CSS-P136-0084-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 150 | 13/11/2019 | ATENCIÓN PUNTO DE CÁMARA NUEVAMENTE VANDALIZADO 3228 AL857 CL 111 A SUR KR 8 C ESTE | P136-MEBOG-00306-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 151 | 13/11/2019 | RESPUESTA AL OFICIO CSS-P136-0053-2019-REC. - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN - TARJETAS SNMP | P136-UTMTO-00308-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 152 | 13/11/2019 | ENVIÓ CÁMARAS CON TOUR SOBRE TECHOS Y POSTES COSEC 4 | P136-UTMTO-00309-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 153 | 13/11/2019 | RESPUESTA AL OFICIO CSS-P136-0073-2019-REC. - APROBACIÓN PLAN DE GESTIÓN (CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL). | P136-UTMTO-00310-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 154 | 13/11/2019 | RESPUESTA AL OFICIO CSS-P136-0071-2019-REC. - ENTREGA DE INFORME ENTREGA HINCADO DE POSTES. | P136-UTMTO-00311-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 155 | 14/11/2019 | SEGUNDA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL - OCTUBRE | CSS-P136-0085-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| 156 | 14/11/2019 | SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BRAZO DE 5 METROS | P136-UTMTO-00317-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 157 | 15/11/2019 | DOCUMENTACIÓN POR SERVICIOS EJECUTIVOS EN OCTUBRE DATA CENTE | CSS-P136-0086-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 158 | 15/11/2019 | INFORME TRASLADO DE POSTE USME | CSS-P136-0087-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 159 | 15/11/2019 | INFORME INSTALACIÓN SOLUCIÓN SOLAR EL REDENTOR ACTUALIZACIÓN | CSS-P136-0088-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 160 | 15/11/2019 | FACTURAS 13 Y 14 MES DE OCTUBRE | CSS-P136-0091-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 161 | 15/11/2019 | FALLA MASIVA EN C4 ISS SECUROS | P136-UTMTO-00324-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 162 | 17/11/2019 | RECEPCIÓN CÁMARAS PROYECTO ALCALDÍAS | P136-UTMTO-00325-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 163 | 18/11/2019 | BIENES DE ALTO VALOR | P136-UTMTO-00334-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 164 | 18/11/2019 | COORDENADAS ACTUALIZADAS DE CÁMARAS - 131119 | P136-UTMTO-00341-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 165 | 18/11/2019 | RECEPCIÓN CÁMARAS PROYECTO ALCALDÍAS LOCALIDAD ENGATIVÁ | P136-UTMTO-00342-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 166 | 19/11/2019 | VENTANA DE MANTENIMIENTO PEM ENLACE BACKUP (FALLIDA) | P136-UTMTO-00345-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 167 | 20/11/2019 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-00040-2019-REC CON ASUNTO: LIMPIEZA DE ACRÍLICOS – CONTRATO 780 DE 2019 - | CSS-P136-00050-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 168 | 20/11/2019 | RESULTADO DE REVISIÓN DE ACTAS ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA UTMVC Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA | P136-UTMTO-00347-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 169 | 20/11/2019 | OBSERVACIONES AL INFORME DEL CONTRATISTA UTMVC MES DE OCTUBRE 2019 | P136-UTMTO-00354-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 170 | 20/11/2019 | INFORMACIÓN SWITCH CORE DATACENTER BOMBEROS | P136-UTMTO-00356-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 171 | 22/11/2019 | SOPORTES PAC NOVIEMBRE ACTAS HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE | CSS-P136-0099-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 172 | 22/11/2019 | SOPORTES PAC NOVIEMBRE ACTAS HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE | CSS-P136-0100-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 173 | 22/11/2019 | PLAN DE CHOQUE DEL PROYECTO ALCALDÍAS | CSS-P136-0101-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 174 | 25/11/2019 | OBSERVACIONES AL INFORME SOLUCIÓN SOLAR EL REDENTOR CONSECUTIVO UTMVC-7802019-182 Y UTMVC-7802019-198 | P136-UTMTO-00365-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 175 | 25/11/2019 | APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2019 CONTRATISTA UT SMVC | P136-UTMTO-00367-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| 176 | 25/11/2019 | RESPUESTA A LOS RADICADOS: CSS-P136-0065-2019-REC; CSS-P136-0060-2019-REC Y CSS-P136-0086-2019. - SERVICIOS DATACENTER Y C4 MESE | P136-UTMTO-00368-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 177 | 25/11/2019 | RESPUESTA AL OFICIO CSS-P136-0059-2019-REC "COTIZACIÓN-SERVICIOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE RED ELÉCTRICA" | P136-UTMTO-00369-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 178 | 25/11/2019 | RESPUESTA AL OFICIO CSS-P136-0083-2019-REC "VINCULACIÓN DE RED DE VIDEO VIGILANCIA A INTERNET" | P136-UTMTO-00371-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 179 | 25/11/2019 | OBSERVACIONES AL INFORME DESMONTE DE PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA, REEMPLAZO DE POSTES, SUMINISTRO DE GABINETE Y MONTAJE DE EQUIPO | P136-UTMTO-00372-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 180 | 25/11/2019 | OBSERVACIONES AL INFORME DESMONTE DE PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA, REEMPLAZO DE POSTES, SUMINISTRO DE GABINETE Y MONTAJE DE EQUIPO | P136-UTMTO-00373-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 181 | 25/11/2019 | OBSERVACIONES AL INFORME DESMONTE DE PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA, REEMPLAZO DE POSTES, SUMINISTRO DE GABINETE Y MONTAJE DE EQUIPO | P136-UTMTO-00374-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 182 | 25/11/2019 | OBSERVACIONES AL INFORME DESMONTE DE PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA, REEMPLAZO DE POSTES, SUMINISTRO DE GABINETE Y MONTAJE DE EQUIPO | P136-UTMTO-00375-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 183 | 25/11/2019 | OBSERVACIONES AL INFORME DE TRASLADO DE POSTE USME | P136-UTMTO-00376-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 184 | 25/11/2019 | RECEPCIÓN CÁMARAS PROYECTO ALCALDÍAS LOCALIDAD ENGATIVÁ | P136-UTMTO-00378-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 185 | 26/11/2019 | RECEPCIÓN CÁMARAS PROYECTO ALCALDÍAS (SAN CRISTOBAL) | P136-UTMTO-00382-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 186 | 26/11/2019 | RESPUESTA AL OFICIO CSS-P136-0066-2019-REC "DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL, SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE" | P136-UTMTO-00385-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 187 | 26/11/2019 | RESPUESTA AL OFICIO CSS-P136-0076-2019-REC "ELEMENTOS ENTREGADOS A LA POLICIA METROPOLITANA / OFICINA TELEMATICA CONTRATO SCJ 78 | P136-UTMTO-00386-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 188 | 26/11/2019 | PUNTOS DESAPLOMADOS DEL PROYECTO DE VIDEOVIGILANCIA BOGOTA D.C | P136-UTMTO-00388-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 189 | 27/11/2019 | INFORME CONSOLIDADO ELEMENTOS SIN FACTURAR | CSS-P136-0102-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 190 | 27/11/2019 | COTIZACIÓN NO. 27 PARA INCLUIR AL ANEXO NO. 2 - BOLSA DE MAT | CSS-P136-0103-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| 191 | 27/11/2019 | RESPUESTA AL OFICIO CSS-P136-0101-2019-REC "PLAN DE CHOQUE DEL PROYECTO ALCALDIAS. CONTRATO 780 - 2019" | P136-UTMTO-00389-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 192 | 27/11/2019 | CAMARAS FUERA DE SERVICIO SUBA Y BARRIOS UNIDOS | P136-MEBOG-00391-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 193 | 27/11/2019 | NOVEDADES CÁMARAS FUERA DE SERVICIO CIUDAD BOLIVAR | P136-MEBOG-00393-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 194 | 28/11/2019 | RESPUESTA AL OFICIO CSS-P136-0103-2019-REC "COTIZACIÓN N° 027 - PARA INCLUIR AL ANEXO N° 2 / BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPOS" | P136-UTMTO-00394-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 195 | 28/11/2019 | CÁMARAS SIN GRABACIÓN CHAPINERO | P136-UTMTO-00395-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 196 | 28/11/2019 | CAMARAS AVERIADAS ESTACION DE POLICIA ENGATIVA Y FONTIBON | P136-MEBOG-00402-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 197 | 29/11/2019 | INFORME TRASLADO PUNTO FN_5 | CSS-P136-0107-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 198 | 29/11/2019 | INFORME TRASLADO PUNTO 1966 | CSS-P136-0108-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 199 | 2/12/2019 | RECEPCIÓN CÁMARAS PROYECTO ALCALDÍAS (TEUSAQUILLO) | P136-UTMTO-00408-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 200 | 2/12/2019 | SOLICITUD APOYO VERIFICACIÓN DE PUERTOS | P136-UTMTO-00410-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 201 | 3/12/2019 | SOPORTES PAC DICIEMBRE - ACTAS HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE | CSS-P136-0110-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 202 | 4/12/2019 | DOCUMENTACIÓN POR SERVICIOS EJECUTADOS OCTUBRE DATA CENTER | CSS-P136-0111-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 203 | 4/12/2019 | SOLICITUD DE INFORME VISITA TÉCNICA CENTRO DE TRASLADO DE PROTECCIÓN(CTP) | P136-UTMTO-00415-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 204 | 4/12/2019 | SOLICITUD DE INFORME PRUEBA 1(CAMBIO SD CÁMARA) Y PRUEBA 2(INSTALACIÓN FIRMWARE DE SAMSUNG), PARA SOLUCIÓN INTERMITENCIA PROYECT | P136-UTMTO-00420-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 205 | 5/12/2019 | OBSERVACIONES AL INFORME DEL CONTRATISTA UTSMVC MES DE NOVIEMBRE 2019 | P136-UTMTO-00422-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 206 | 5/12/2019 | INFORME CONSOLIDADO ELEMENTOS SIN FACTURAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO 780 DE 2019 | P136-UTMTO-00424-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 207 | 5/12/2019 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 5 DE DICIEMBRE DE 2019. | P136-UTMTO-00426-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 208 | 5/12/2019 | FALLA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA - INFORMES Y POSIBLE DENUNCIA. | P136-UTMTO-00427-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 209 | 5/12/2019 | RESPUESTA A COMUNICADO CSS-P136-0107-2019-REC, INFORME TRASLADO PUNTO 213 PROYECTO ESU | P136-UTMTO-00428-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|-------------------|
| 210 | 5/12/2019 | RESPUESTA A COMUNICADO CSS-P136-0108-2019-REC, INFORME TRANSLADO PUNTO 1966 PROYECTO 350 | P136-UTMTO-00429-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 211 | 6/12/2019 | LISTADO UNIFICADO CÁMARAS SALA DE VÍDEO KENNEDY | P136-MEBOG-00436-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 212 | 6/12/2019 | APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 CONTRATISTA UT SMVC | P136-UTMTO-00432-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 213 | 6/12/2019 | SOLICITUD ORGANIZACIÓN ÁRBOL SECUROS | P136-UTMTO-00433-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 214 | 8/12/2019 | RECEPCIÓN CÁMARAS PROYECTO ALCALDÍAS (TEUSAQUILLO) | P136-UTMTO-00437-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 215 | 9/12/2019 | LISTADO UNIFICADO CÁMARAS SALA DE VIDEO CHAPINERO | P136-MEBOG-00438-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 216 | 9/12/2019 | SOLICITUD DE PERMISOS INGRESO AL PERSONAL DE ETB PARA LA ESTACIÓN JIMENEZ | P136-TMSA-00447-2019 | INTERVENTORÍA | TRANSMILENIO S.A. |
| 217 | 9/12/2019 | SOLICITUD CONTRASEÑA SEGURA SISTEMA VIDEOVIGILANCIA | P136-UTMTO-00442-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 218 | 9/12/2019 | OBSERVACIONES AL REPORTE PRESENTADO DE AVANCES DEL CTP | P136-UTMTO-00448-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 219 | 10/12/2019 | SOPORTES PAC DICIEMBRE - ACTAS HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE | CSS-P136-0114-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 220 | 10/12/2019 | CREACIÓN DE USUARIOS OPERADORES DE VIDEO SALAS DE MONITOREO | P136-MEBOG-00451-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 221 | 10/12/2019 | RECEPCIÓN CÁMARAS PROYECTO ALCALDÍAS LOCALIDAD KENNEDY | P136-UTMTO-00449-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 222 | 10/12/2019 | SOLICITUD RESTAURACIÓN DE SERVICIO EN C4. | P136-UTMTO-00450-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 223 | 11/12/2019 | INSPECCIONES DE CAMPO | CSS-P136-00069-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 224 | 11/12/2019 | SOLICITUD RESPUESTA COMUNICACIONES P136-UTMTO - 00427-2019 Y P136-UTMTO -00450-2019 | CSS-P136-00070-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 225 | 12/12/2019 | SOPORTES PAC DICIEMBRE - ACTAS HASTA EL 06 DE DICIEMBRE | CSS-P136-0118-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 226 | 12/12/2019 | VISITAS DE SITE SURVEY PARA LOS 2 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADOS CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL | P136-MEBOG-00468-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 227 | 12/12/2019 | NOVEDADES CON LAS CAMARAS DEL DIA 21/11/2019 | P136-MEBOG-00470-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 228 | 12/12/2019 | LISTADO GENERAL DE CÁMARAS | P136-MEBOG-00471-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|---------------|
| 229 | 12/12/2019 | RESULTADO DE REVISION DE ACTAS ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA UTSMVC Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA | P136-UTMTO-00466-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 230 | 16/12/2019 | RECEPCIÓN CÁMARAS PROYECTO ALCALDÍAS LOCALIDAD KENNEDY | P136-UTMTO-00473-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 231 | 16/12/2019 | RECEPCIÓN CÁMARAS PROYECTO ALCALDÍAS LOCALIDADES E1-USAQUEN Y E3-SANTA FE | P136-UTMTO-00474-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 232 | 17/12/2019 | SOPORTES PAC DICIEMBRE - ACTAS HASTA EL 14 DE DICIEMBRE | CSS-P136-0120-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 233 | 17/12/2019 | SOLICITUD ELIMINAR LOS USUARIOS DE LOS OPERADORES DE VIDEO QUE SE RELACIONAN | P136-UTMTO-00476-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 234 | 18/12/2019 | MATRIZ NOVEDADES DIARIAS COSEC 2 | P136-MEBOG-00480-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 235 | 18/12/2019 | LISTADO UNIFICADO CÁMARAS SALA DE VIDEO PUENTE ARANDA | P136-MEBOG-00485-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 236 | 18/12/2019 | SOLICITUD DE VIABILIDAD DE UTILIZACIÓN DE BIENES DISPONIBLES EN EL ALMACÉN DE LA SDSCJ EN EL CONTRATO 780 DE 2019 | P136-UTMTO-00481-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 237 | 18/12/2019 | SOLICITUD DE DILIGENCIAMIENTO DEL DOCUMENTO SOLICITADO POR LA COMISIÓN DE EMPALME DE LA SDSCJ | P136-UTMTO-00487-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 238 | 19/12/2019 | LISTADO UNIFICADO CÁMARAS SALA DE VIDEO CIUDAD BOLÍVAR | P136-MEBOG-00492-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 239 | 20/12/2019 | SOPORTES PAC DICIEMBRE - ACTAS HASTA EL 19 DE DICIEMBRE | CSS-P136-0123-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 240 | 20/12/2019 | USUARIOS EN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA AL PERSONAL DE CALIDAD | P136-UTMTO-00496-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 241 | 22/12/2019 | SOLICITUD DE VISITAS DE SITE SURVEY PARA LOS 2 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA DESMONTADOS DEL REDENTOR SCJ18ESP00007_1 Y SCJ17FJ0002 EN EL PARQUE CARACOLI | P136-MEBOG-00499-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 242 | 22/12/2019 | OBSERVACIONES AL INFORME DEL CTP | P136-UTMTO-00500-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 243 | 23/12/2019 | REVISIÓN ESTADO DEL SISTEMA SALAS DE MONITOREO | P136-MEBOG-00502-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 244 | 23/12/2019 | RECEPCIÓN CÁMARAS PROYECTO ALCALDÍAS LOCALIDAD LA CANDELARIA | P136-UTMTO-00501-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 245 | 23/12/2019 | CANCELACIÓN TERCERA RONDA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS | P136-UTMTO-00503-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 246 | 23/12/2019 | SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE GARANTIA DEL PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA SCJ17E130054 | P136-UTMTO-00505-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|-------------------|
| 247 | 23/12/2019 | SOLICITUD DE ENTREGA DE COTIZACIÓN CÁMARAS Y ADECUACIONES DE CABLEADO DEL CTP | P136-UTMTO-00506-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 248 | 23/12/2019 | SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME SINIESTROS DE LAS 4 CÁMARAS DEL CTP A LA SDSCJ | P136-UTMTO-00508-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 249 | 23/12/2019 | SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME SINIESTROS DE LAS 7 CÁMARAS DE TRANSMILENIO ESTACIÓN RICAURTE Y JIMÉNEZ A LA SDSCJ | P136-UTMTO-00509-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 250 | 23/12/2019 | ALERTA POR TERMINACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LA SEGUNDA RONDA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN LOS PROYECTOS ESU Y FVS | P136-UTMTO-00511-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 251 | 23/12/2019 | SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO COMPROMISOS ACTA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019. | P136-UTMTO-00512-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 252 | 24/12/2019 | MIGRACIÓN VRF COSEC | P136-UTMTO-00515-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 253 | 26/12/2019 | DOCUMENTOS CONTRATISTA SERCALING -INSTALACIÓN PANELES SOLARES | CSS-P136-0127-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 254 | 26/12/2019 | RTA 069 - INSPECCIONES DE CAMPO | CSS-P136-0126-2019-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 255 | 27/12/2019 | AUTORIZACIÓN PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) TÍPICOS | CSS-P136-0128-2019-REC | SDM | INTERVENTORÍA |
| 256 | 27/12/2019 | LISTADO UNIFICADO CÁMARAS SALA DE VIDEO ENGATIVÁ | P136-MEBOG-00523-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 257 | 27/12/2019 | SOLICITUD DE PERMISOS INGRESO AL PERSONAL DE ETB Y UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 PARA EL PORTAL AMÉRICAS | P136-TMSA-00519-2019 | INTERVENTORÍA | TRANSMILENIO S.A. |
| 258 | 27/12/2019 | SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA A PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA DE SUBSISTEMA ESTADIO Y TRANSMILENIO | P136-UTMTO-00520-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 259 | 27/12/2019 | SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE GLPI Y VISITA TÉCNICA A LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA DEL SUBSISTEMA COLEGIOS | P136-UTMTO-00521-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 260 | 30/12/2019 | LISTADO UNIFICADO CÁMARAS SALA DE VIDEO BARRIOS UNIDOS | P136-MEBOG-00528-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 261 | 30/12/2019 | RECEPCIÓN CÁMARAS PROYECTO ALCALDÍAS LOCALIDAD LOS MÁRTIRES | P136-UTMTO-00524-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 262 | 30/12/2019 | RECEPCIÓN CÁMARAS PROYECTO ALCALDÍAS LOCALIDAD SUBA | P136-UTMTO-00525-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 263 | 31/12/2019 | LISTADO UNIFICADO CÁMARAS SALA DE VIDEO TEUSAQUILLO | P136-MEBOG-00529-2019 | INTERVENTORÍA | MEBOG |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|---------------|
| 264 | 31/12/2019 | SOLICITUD DE INSTALACIÓN PARA LOS 2 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA DESMONTADOS DEL REDENTOR SCJ18ESP00007_1 Y SCJ17FJ0002 EN | P136-UTMTO-00533-2019 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 265 | 1/01/2020 | MIGRACIÓN VRF COSEC. | P136-UTMTO-00534-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 266 | 2/01/2020 | SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE GARANTÍA DEL POSTE DE VIDEO VIGILANCIA SCJ17E130054 PROYECTO 732 | P136-UTMTO-00535-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 267 | 2/01/2020 | INFORMES VISITAS COSECS CHAPINERO, PUENTE ARANDA Y CIUDAD BOLÍVAR. | P136-UTMTO-00536-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 268 | 2/01/2020 | CAPACITACIÓN A MEBOG PARA CREACIÓN DE TOURS | P136-MEBOG-00539-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 269 | 3/01/2020 | RESULTADO DE REVISIÓN DE ACTAS ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA UTSMVC Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA | P136-UTMTO-00542-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 270 | 4/01/2020 | REVISIÓN ESTADO DEL SISTEMA SALAS DE MONITOREO | P136-MEBOG-00545-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 271 | 7/01/2020 | INFORME INSTALACIÓN RENOVACIÓN PANELES SOLARES ESU PUNTO 225 | CSS-P136-0129-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 272 | 7/01/2020 | INFORME INSTALACIÓN RENOVACIÓN PANELES SOLARES ESU PUNTO 223 | CSS-P136-0130-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 273 | 7/01/2020 | INFORME INSTALACIÓN RENOVACIÓN PANELES SOLARES ESU PUNTO 210 | CSS-P136-0131-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 274 | 7/01/2020 | INFORME INSTALACIÓN RENOVACIÓN PANELES SOLARES ESU PUNTO 212 | CSS-P136-0132-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 275 | 7/01/2020 | INFORME INSTALACIÓN RENOVACIÓN PANELES SOLARES ESU PUNTO 224 | CSS-P136-0133-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 276 | 7/01/2020 | INFORME INSTALACIÓN RENOVACIÓN PANELES SOLARES ESU PUNTO 218 | CSS-P136-0134-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 277 | 7/01/2020 | INFORME INSTALACIÓN RENOVACIÓN PANELES SOLARES ESU PUNTO 221 | CSS-P136-0135-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 278 | 7/01/2020 | INFORME INSTALACIÓN RENOVACIÓN PANELES SOLARES ESU PUNTO 211 | CSS-P136-0136-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 279 | 7/01/2020 | INFORME INSTALACIÓN RENOVACIÓN PANELES SOLARES ESU PUNTO 219 | CSS-P136-0137-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 280 | 7/01/2020 | INFORME INSTALACIÓN RENOVACIÓN PANELES SOLARES ESU PUNTO 249 | CSS-P136-0138-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 281 | 7/01/2020 | INFORME INSTALACIÓN RENOVACIÓN PANELES SOLARES ESU PUNTO 230 | CSS-P136-0139-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 282 | 7/01/2020 | INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO FVS-0201 | CSS-P136-0140-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|---------------|
| 283 | 7/01/2020 | INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESU-216 | CSS-P136-0141-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 284 | 7/01/2020 | INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESU-220 | CSS-P136-0142-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 285 | 7/01/2020 | INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESU-228 | CSS-P136-0143-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 286 | 7/01/2020 | INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESU-226 | CSS-P136-0144-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 287 | 7/01/2020 | INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESU-214 | CSS-P136-0145-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 288 | 7/01/2020 | INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESU-213 | CSS-P136-0146-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 289 | 7/01/2020 | INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESU-227 | CSS-P136-0147-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 290 | 7/01/2020 | INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESU-222 | CSS-P136-0148-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 291 | 7/01/2020 | INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESU-215 | CSS-P136-0149-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 292 | 7/01/2020 | INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESU-229 | CSS-P136-0150-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 293 | 7/01/2020 | SOPORTES PAC ENERO 2020 - ACTAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE | CSS-P136-0151-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 294 | 7/01/2020 | RECEPCIÓN CÁMARAS PROYECTO ALCALDÍAS LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR | P136-UTMTO-00546-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 295 | 7/01/2020 | RECEPCIÓN CÁMARAS PROYECTO ALCALDÍAS LOCALIDAD BOSA | P136-UTMTO-00547-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 296 | 8/01/2020 | SOPORTES PAC ENERO - ACTAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE | CSS-P136-0152-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 297 | 8/01/2020 | REVISIÓN ESTADO DEL SISTEMA SALAS DE MONITOREO | P136-MEBOG-00554-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 298 | 10/01/2020 | INFORME MENSUAL DICIEMBRE | CSS-P136-0153-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 299 | 13/01/2020 | OBSERVACIONES A INFORMES DE MODERNIZACIÓN E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES | P136-UTMTO-00565-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 300 | 13/01/2020 | OBSERVACIONES A INFORME DE SERVICIO CORRECTIVO PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA FVS-201 PARQUE SIMÓN BOLÍVAR | P136-UTMTO-00567-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 301 | 13/01/2020 | PROCESO DE FACTURACIÓN | P136-UTMTO-00569-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 302 | 14/01/2020 | FACTURAS Y SOPORTES ACTA CONCILIACIÓN NO. 7 | CSS-P136-0154-2020-REC | CODENSA | INTERVENTORÍA |
| 303 | 14/01/2020 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE COSEC BARRIOS UNIDOS | P136-MEBOG-00577-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 304 | 15/01/2020 | CARTA RESPONSABILIDAD - PANELES SOLARES | CSS-P136- 0155-2020- REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 305 | 15/01/2020 | REITERACIÓN USUARIOS EN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA AL PERSONAL DE CALIDAD | P136- UTMTO- 00578-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 306 | 15/01/2020 | INFORMACIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO PRESENTADO EN LA ESTACIÓN RICAURTE VAGÓN 3 | P136-TMSA- 00580-2020 | INTERVENTORÍA | TRANSMILENIO S.A. |
| 307 | 15/01/2020 | ALERTA POR CARGA INCOMPLETA DE LA INFORMACIÓN EN EL GLPI, CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 780 DE 2019. | P136- UTMTO- 00581-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 308 | 16/01/2020 | PAC MENSUAL ENERO - ACTAS HASTA EL 16 DE ENERO | CSS-P136- 0156-2020- REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 309 | 16/01/2020 | ENTREGA 11 - PUNTOS PARA CONEXIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA | CSS-P136- 0157-2020- REC | CODENSA | INTERVENTORÍA |
| 310 | 16/01/2020 | OBSERVACIONES AL INFORME DEL CONTRATISTA UTSMVC MES DE DICIEMBRE 2019 | P136- UTMTO- 00585-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 311 | 16/01/2020 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE TICKETS - ANS DEL CONTRATO 780 DE 2019 | P136- UTMTO- 00587-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 312 | 16/01/2020 | SOLICITUD ELIMINAR LOS USUARIOS DE LOS OPERADORES DE VIDEO QUE SE RELACIONAN | P136- UTMTO- 00588-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 313 | 16/01/2020 | PRUEBAS DE CONECTIVIDAD LAN MIGRACIÓN VRF COSECS | P136- UTMTO- 00589-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 314 | 17/01/2020 | FACTURAS Y SOPORTES DICIEMBRE | CSS-P136- 0158-2020- REC | ETB | INTERVENTORÍA |
| 315 | 17/01/2020 | INFORME DE GESTIÓN DEL SERVICIO | CSS-P136- 0159-2020- REC | ETB | INTERVENTORÍA |
| 316 | 20/01/2020 | FACTURAS NOS. 31-32-33-34-35- 36-37 Y 38 MES DE DICIEMBRE | CSS-P136- 0160-2020- REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 317 | 20/01/2020 | PAC MENSUAL ENERO - ACTAS HASTA EL 18 DE ENERO | CSS-P136- 0161-2020- REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 318 | 20/01/2020 | PAC MENSUAL DICIEMBRE - INFORMES RENOVACIÓN PANELES SOLARES | CSS-P136- 0162-2020- REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 319 | 20/01/2020 | PAC MENSUAL DICIEMBRE - INFORMES PARQUE SIMÓN BOLÍVAR | CSS-P136- 0163-2020- REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 320 | 20/01/2020 | PAC MENSUAL DICIEMBRE - INFORME MENSUAL DICIEMBRE | CSS-P136- 0164-2020- REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 321 | 20/01/2020 | SOLICITUD VERSIÓN DE FIRMWARE INSTALADO EN LAS CÁMARAS SAMSUNG PROYECTO 732 | P136- UTMTO- 00599-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 322 | 20/01/2020 | ESTADO CONFIGURACIÓN TERCER STREAM CÁMARAS PROYECTO 732 | P136- UTMTO- 00600-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 323 | 20/01/2020 | ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROVEEDORES DE | P136- UTMTO- 00603-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | ALCALDÍAS (SEGURITECH - UTBASC) | | | |
| 324 | 21/01/2020 | PAC MENSUAL DICIEMBRE - RENOVACIÓN PANELES SOLARES | CSS-P136-0165-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 325 | 21/01/2020 | PAC MENSUAL DICIEMBRE - RENOVACIÓN PANELES SOLARES | CSS-P136-0166-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 326 | 21/01/2020 | PANEL SOLAR PUNTO 217 | CSS-P136-0167-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 327 | 21/01/2020 | APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2019 CONTRATISTA UT SMVC | P136-UTMTO-00604-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 328 | 21/01/2020 | INFORMES VISITAS COSECS CHAPINERO, PUENTE ARANDA Y CIUDAD BOLÍVAR. | CSS-P136-00089-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 329 | 21/01/2020 | INFORMES VISITAS COSECS CHAPINERO, PUENTE ARANDA Y CIUDAD BOLÍVAR. | P136-UTMTO-00605-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 330 | 21/01/2020 | SOLICITUD DE TRÁMITE DE PERMISOS DE INGRESO AL COLEGIO SAN BERNARDINO AL PERSONAL DE ETB /PROYECTO COLEGIOS | P136-SED-00606-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL |
| 331 | 21/01/2020 | VISITAS DE SITE SURVEY PARA LOS 10 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADOS CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA GUAYACANES OBRAS | P136-MEBOG-00607-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 332 | 22/01/2020 | CRONOGRAMA ATENCIÓN PENDIENTES DOMOS | CSS-P136-0168-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 333 | 22/01/2020 | MATERIALES PENDIENTES POR PAGO COLEGIOS | CSS-P136-0169-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 334 | 22/01/2020 | OFICIO ATENCIÓN COLEGIOS | CSS-P136-0170-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 335 | 22/01/2020 | PAC MENSUAL ENERO - ACTAS HASTA EL 20 DE ENERO | CSS-P136-0171-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 336 | 22/01/2020 | COTIZACIÓN CENTRO TRASLADO DE PROTECCIÓN - CTP | CSS-P136-0172-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 337 | 23/01/2020 | RESULTADO DE REVISIÓN DE ACTAS ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA UTMVC Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA | P136-UTMTO-00615-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 338 | 24/01/2020 | PAC MENSUAL ENERO - ACTAS HASTA 23 ENERO | CSS-P136-0173-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 339 | 24/01/2020 | SOLICITUD MANTENIMIENTO EQUIPOS DE DESCARGAS | P136-MEBOG-00616-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 340 | 27/01/2020 | SOLICITUD HABILITACIÓN EQUIPO EN SALAS DE MONITOREO PARA VISUALIZACIÓN DEL SISTEMA | P136-UTMTO-00618-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| 341 | 28/01/2020 | PAC MENSUAL FEBRERO - ACTAS HASTA EL 25 DE ENERO | CSS-P136-0174-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 342 | 28/01/2020 | INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO CTP | CSS-P136-0175-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 343 | 28/01/2020 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE COSEC BARRIOS UNIDOS | P136-MEBOG-00620-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 344 | 28/01/2020 | OBSERVACIONES AL OFICIO MATERIALES PENDIENTES POR PAGOS DE COLEGIOS | P136-UTMTO-00621-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 345 | 28/01/2020 | SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME INCIDENTES Y SINIESTROS DE DOMOS CIUDADANOS A LA SDSCJ | P136-UTMTO-00624-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 346 | 28/01/2020 | APROBACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR | P136-UTMTO-00625-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 347 | 29/01/2020 | SOLICITUD TRASLADO VISUALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS DE USAQUÉN Y CHAPINERO A LA SALA DE VIDEO TEUSAQUILLO | P136-MEBOG-00629-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 348 | 30/01/2020 | SOLICITUD DE TRÁMITE DE PERMISOS DE INGRESO A LA PLAZA DE BOLÍVAR PARA ATENCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUNTOS 5243 Y 5250 PROY | P136-MEBOG-00634-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 349 | 30/01/2020 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0172-2020-REC - COTIZACION CENTRO TRASLADO POR PROTECCIÓN CTP - CONTRATO 780 DE 2019. | P136-UTMTO-00635-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 350 | 30/01/2020 | VISITA PRUEBAS CÁMARAS SAMSUNG | P136-MEBOG-00636-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 351 | 31/01/2020 | MIGRACIÓN VRF COSEC. | P136-UTMTO-00637-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 352 | 3/02/2020 | FACTURA NOS. 31-32-33-34-35-36-37 Y 38 - MES DE DICIEMBRE | CSS-P136-0178-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 353 | 3/02/2020 | ESTADO DE ACTAS PARA CONCILIACIÓN | P136-UTMTO-00645-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 354 | 4/02/2020 | COTIZACIÓN SISTEMAS ACCESO E INCENDIO COSEC PUENTE ARANDA | CSS-P136-0184-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 355 | 4/02/2020 | COTIZACIÓN SISTEMAS ACCESO E INCENDIO COSEC CIUDAD BOLIVAR | CSS-P136-0183-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 356 | 4/02/2020 | INFORME MES DE ENERO | CSS-P136-0182-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 357 | 4/02/2020 | PAC MENSUAL FEBRERO - ACTAS HASTA EL 2 DE FEBRERO | CSS-P136-0181-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 358 | 4/02/2020 | SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LOS ELEMENTOS INSTALADOS EN EL CTP | P136-UTMTO-00648-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 359 | 5/02/2020 | COTIZACIÓN NO. 30 - BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPO | CSS-P136-0185-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| 360 | 6/02/2020 | SOLICITUD LISTADO USUARIOS VMS ISS SECUROS | P136-UTMTO-00654-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 361 | 6/02/2020 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CÁMARA DE LA CARRERA 60 CON CALLE 42. | P136-MEBOG-00656-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 362 | 7/02/2020 | INFORME NO. 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO COSEC PUENTE ARANDA | CSS-P136-0191-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 363 | 7/02/2020 | INFORME NO. 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO COSEC CIUDAD BOLIVAR | CSS-P136-0190-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 364 | 7/02/2020 | INFORME NO. 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO COSEC CHAPINERO | CSS-P136-0189-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 365 | 7/02/2020 | PAC MENSUAL FEBRERO - ACTAS HASTA EL 04 DE FEBRERO | CSS-P136-0188-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 366 | 7/02/2020 | INFORME DE ESTACIONES | CSS-P136-0187-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 367 | 9/02/2020 | MESA DE TRABAJO AFINAMIENTO DEL SISTEMA CONTRATO 732-2017 | P136-MEBOG-00659-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 368 | 10/02/2020 | OBSERVACIONES AL INFORME DEL CONTRATISTA UTSMVC MES DE ENERO 2020 | P136-UTMTO-00662-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 369 | 10/02/2020 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0185-2020-REC - COTIZACION N° 030 PARA INCLUIR AL ANEXO N° 2 / BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPOS. | P136-UTMTO-00665-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 370 | 11/02/2020 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CTP | CSS-P136-0193-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 371 | 11/02/2020 | INFORME ESTACIONES II | CSS-P136-0192-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 372 | 11/02/2020 | RESULTADO DE REVISIÓN DE ACTAS ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA UTSMVC Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA | P136-UTMTO-00666-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 373 | 11/02/2020 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0177-2020-REC - SOLICITUD DE APLAZAMIENTO PROYECTO ESTACIONES DE POLICÍA. | P136-UTMTO-00667-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 374 | 11/02/2020 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CÁMARA DE LA CARRERA 60 CON CALLE 42. | P136-MEBOG-00668-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 375 | 12/02/2020 | INFORME MES DE ENERO | CSS-P136-0196-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 376 | 12/02/2020 | PAC MENSUAL FEBRERO - ACTAS HASTA 06 DE FEBRERO | CSS-P136-0195-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 377 | 12/02/2020 | SOLICITUD DE INFORME DE LA VENTANA FALLIDA PRUEBA DE ENLACE BACKUP C4 | P136-UTMTO-00670-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|-------------------|
| 378 | 12/02/2020 | SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA PARA LOS PUNTOS MB546, PCE19096, CVID22033 Y PCE202493, PERTENECIENTES AL | P136-UTMTO-00671-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 379 | 12/02/2020 | ATENCIÓN PRIORITARIA VRF COSEC | P136-UTMTO-00673-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 380 | 13/02/2020 | USUARIOS EN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA AL PERSONAL DE CALIDAD | P136-UTMTO-00676-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 381 | 13/02/2020 | APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE ENERO 2020 CONTRATISTA UT SMVC | P136-UTMTO-00677-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 382 | 14/02/2020 | FACTURAS MES DE ENERO - 25-26-27-28-29 Y 30 | CSS-P136-0203-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 383 | 14/02/2020 | PAC MENSUAL FEBRERO - ACTAS HASTA EL 11 DE FEBRERO | CSS-P136-0202-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 384 | 14/02/2020 | ATENCIÓN PRIORITARIA VRF COSEC | CSS-P136-0201-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 385 | 14/02/2020 | 2DA RONDA PREVENTIVOS ACTUALIZADA FVS FEBRERO-MARZO | CSS-P136-0200-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 386 | 14/02/2020 | INFORME VENTANA FALLIDA PRUEBA ENLACE BACKUP C4 | CSS-P136-0199-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 387 | 14/02/2020 | SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS - MODIFICATORIO 1 - CONTRATO 780 DE 2019. | P136-UTMTO-00680-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 388 | 14/02/2020 | HITOS DE FACTURACIÓN | P136-UTMTO-00681-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 389 | 14/02/2020 | SOLICITUDES PARA SEGUIMIENTO DE CALIDAD DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA | P136-UTMTO-00682-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 390 | 16/02/2020 | MESA DE TRABAJO AFINAMIENTO DEL SISTEMA CONTRATO 732-2017 | P136-MEBOG-00684-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 391 | 17/02/2020 | NOTIFICACIÓN CAMBIO DE NÚMERO DE OFICINA CONSORCIO | P136-UTMTO-00690-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 392 | 18/02/2020 | PAC MENSUAL FEBRERO - ACTAS HASTA EL 14 FEBRERO | CSS-P136-0205-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 393 | 18/02/2020 | INFORMACIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO PRESENTADO EN LA ESTACIÓN RICAURTE VAGÓN 3 | P136-TMSA-00691-2020 | INTERVENTORÍA | TRANSMILENIO S.A. |
| 394 | 18/02/2020 | SOLICITUD DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS COLEGIO SAN FRANCISCO/PROYECTO COLEGIOS | P136-UTMTO-00692-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 395 | 18/02/2020 | SOLICITUD INFORME FALLA MASIVA 21-01-2020 | P136-UTMTO-00693-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 396 | 19/02/2020 | OBSERVACIONES A LA RELACIÓN DE EQUIPOS INSTALADOS Y DESINSTALADOS PERTENECIENTES A LOS PROYECTOS ALCALDÍAS Y 732. | P136-UTMTO-00694-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|---------------|
| 397 | 19/02/2020 | ENTREGA DE PLACAS SSCJ | P136-UTMTO-00695-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 398 | 20/02/2020 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0183-2020-REC Y CSS-P136-0184-2020-REC: COTIZACIONES COSEC CIUDAD BOLIVAR Y PUENTE ARANDA - SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INCENDIO. | P136-UTMTO-00696-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 399 | 20/02/2020 | SOLICITUD USUARIOS SECUROS PARA INTERVENTORÍA | P136-UTMTO-00698-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 400 | 20/02/2020 | INFORME REVISIÓN DE LA GRABACIÓN QUE NO SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LO MANIFESTADO POR MEBOG | P136-UTMTO-00700-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 401 | 20/02/2020 | REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INSTALACIÓN PARA LOS 2 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA DESMONTADOS DEL REDENTO | P136-UTMTO-00701-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 402 | 20/02/2020 | SOLICITUD DE EVIDENCIA DE ÓRDENES DE COMPRA DE COSECS. | P136-UTMTO-00702-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 403 | 21/02/2020 | SOLICITUD DE CAPACITACIÓN PARA LA REVISIÓN Y EXTRACCIÓN DE GRABACIONES PARA EL COLEGIO BENJAMÍN HERRERA/PROYECTO COLEGIOS | P136-UTMTO-00703-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 404 | 21/02/2020 | PUNTOS DE ATENCIÓN - AFINAMIENTO 732-2017. | P136-UTMTO-00704-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 405 | 24/02/2020 | PAC MENSUAL FEBRERO - ACTAS HASTA EL 20 DE FEBRERO | CSS-P136-0206-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 406 | 25/02/2020 | INFORME REVISIÓN DE LA GRABACIÓN QUE NO SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LO MANIFESTADO POR MEBOG | P136-UTMTO-00710-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 407 | 25/02/2020 | SOLICITUD DE CONCEPTO TÉCNICO DE LOS BIENES DE LA SDSCJ ENTREGADOS AL CONTRATISTA UT SERVICIOS MNTD VIGILANCIA CIUDADANA 2019 | P136-UTMTO-00711-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 408 | 25/02/2020 | SOLICITUD DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PUNTOS CON LA FALLA GIRO DE PTZ. | P136-UTMTO-00712-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 409 | 25/02/2020 | TICKETS Y SUGERENCIA DE CONFIGURACIÓN STREAMS EN VIVO Y GRABACIÓN. | P136-UTMTO-00713-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 410 | 25/02/2020 | PROGRAMACIÓN REVISIÓN ESTADO DEL SISTEMA NOCTURNO EN SALAS DE MONITOREO | P136-UTMTO-00716-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 411 | 25/02/2020 | ENLACE BACKUP Y VRF COSEC. | P136-UTMTO-00717-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 412 | 25/02/2020 | REITERACIÓN SOLICITUD LISTADO USUARIOS VMS ISS SECUROS | P136-UTMTO-00718-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 413 | 25/02/2020 | PARAMETRIZACIÓN DE CÁMARAS SAMSUNG | P136-MEBOG-00719-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| 414 | 26/02/2020 | VALIDACIÓN EQUIPOS POR PROYECTO | P136-UTMTO-00720-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 415 | 26/02/2020 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0199-2020-REC CON ASUNTO ATENCIÓN PRIORITARIA VRF COSEC Y CSS-P136-0201-2020-REC CON ASUNTO INFORME VENTANA FALLIDA PRUEBA ENLACE BACKUP C4 . | P136-UTMTO-00721-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 416 | 27/02/2020 | PAC MENSUAL MARZO - ACTAS HASTA EL 25 DE FEBRERO | CSS-P136-0208-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 417 | 27/02/2020 | CANCELACIÓN DE CONCILIACIÓN DE FACTURA | P136-UTMTO-00726-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 418 | 27/02/2020 | RESULTADO DE REVISIÓN DE ACTAS ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA UTMVC Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA | P136-UTMTO-00728-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 419 | 28/02/2020 | REPORTE INCIDENTE PÉRDIDA GRABACIONES CÁMARAS | CSS-P136-0214-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 420 | 28/02/2020 | FACTURAS NOS: 25-26-27-28-29-30 MES DE ENERO | CSS-P136-0213-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 421 | 28/02/2020 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN PERSONAL DE MESA DE AYUDA. | P136-UTMTO-00734-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 422 | 28/02/2020 | SOLICITUD DE CAPACITACIÓN PARA LA REVISIÓN Y EXTRACCIÓN DE GRABACIONES PARA EL COLEGIO SAN FRANCISCO/PROYECTO COLEGIOS | P136-UTMTO-00735-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 423 | 28/02/2020 | SOLICITUD DE CAPACITACIÓN PARA LA REVISIÓN Y EXTRACCIÓN DE GRABACIONES PARA EL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO/PROYECTO COLEGIOS | P136-UTMTO-00736-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 424 | 3/03/2020 | PAC MENSUAL MARZO - ACTAS HASTA EL 29 DE FEBRERO | CSS-P136-0225-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 425 | 4/03/2020 | INFORME MES DE FEBRERO | CSS-P136-0226-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 426 | 4/03/2020 | AVANCE CON RESPECTO A LA NOVEDAD REPORTADA EN LA ESTACIÓN RICARTE | P136-UTMTO-00742-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 427 | 4/03/2020 | SOLICITUD DE CAPACITACIÓN PARA LA REVISIÓN Y EXTRACCIÓN DE GRABACIONES PARA EL COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB/PROYECTO COLEGIOS | P136-UTMTO-00744-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 428 | 4/03/2020 | SOLICITUD DE MODERNIZACIÓN Y TRASLADO DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA 1323 Y 1312 PROYECTO FVS | P136-UTMTO-00745-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 429 | 6/03/2020 | INFORMES PARCIALES DE 4 ESTACIONES DE POLICIA | CSS-P136-0227-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 430 | 9/03/2020 | PAC MENSUAL MARZO - ACTAS HASTA EL 5 DE MARZO | CSS-P136-0229-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 431 | 9/03/2020 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CÁMARA DE LA CARRERA 60 CON CALLE 26. | P136-MEBOG-00755-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 432 | 9/03/2020 | SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL DE TRANSMILENIO, PARA EL ACCESO AL RACK PRINCIPAL EN LA ESTACIÓN JIMÉNEZ/PROYECTO TRANSMILENIO | P136-TMSA-00756-2020 | INTERVENTORÍA | TRANSMILENIO S.A. |
| 433 | 9/03/2020 | OBSERVACIONES AL INFORME DEL CONTRATISTA UTSMVC MES DE FEBRERO 2020 | P136-UTMTO-00759-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 434 | 10/03/2020 | SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA COLEGIO MORALBA/PROYECTO COLEGIOS | P136-UTMTO-00761-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 435 | 10/03/2020 | SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO/PROYECTO COLEGIOS | P136-UTMTO-00762-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 436 | 10/03/2020 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE SALA DE MONITOREO ENGATIVÁ | P136-MEBOG-00765-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 437 | 11/03/2020 | INFORME MES DE FEBRERO | CSS-P136-0236-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 438 | 11/03/2020 | FACTURAS 31-32-33-34-35 Y 36 FEBRERO | CSS-P136-0235-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 439 | 11/03/2020 | MONITORES DE VISUALIZACIÓN 46 | CSS-P136-0234-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 440 | 11/03/2020 | PAC MENSUAL MARZO - ACTAS HASTA EL 11 DE MARZO | CSS-P136-0233-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 441 | 11/03/2020 | INFORMES PARCIALES 4 ESTACIONES DE POLICIA | CSS-P136-0231-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 442 | 11/03/2020 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPUTADOR OPERADOR | CSS-P136-0230-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 443 | 12/03/2020 | SOLICITUD DE PERMISOS DE INGRESO PARA EL PERSONAL DE ETB AL COLEGIO ISMAEL PERDOMO/PROYECTO COLEGIOS. | P136-SED-00769-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL |
| 444 | 12/03/2020 | APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE FEBRERO 2020 CONTRATISTA UT SMVC | P136-UTMTO-00770-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 445 | 13/03/2020 | RESPUESTA UTSMVC-7802019-325 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPUTADOR DE OPERADOR SALAS DE MONITOREO | CSS-P136-00116-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 446 | 13/03/2020 | EJERCICIO RECUPERACIÓN DE VIDEO DESDE SD SALA DE MONITOREO BARRIOS UNIDOS | P136-MEBOG-00773-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 447 | 13/03/2020 | SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA COLEGIO SAN BERNARDINO/PROYECTO COLEGIOS | P136-UTMTO-00774-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| 448 | 16/03/2020 | RESPUESTA UTSMVC-7802019-328 CAMBIO DE REFERENCIA MONITORES 46" SALAS DE MONITOREO. | P136-UTMTO-00778-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 449 | 17/03/2020 | PAC MENSUAL MARZO - ACTAS HASTA EL 11 DE MARZO | CSS-P136-0239-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 450 | 18/03/2020 | OBSERVACIONES A INFORME DE SERVICIO CORRECTIVO INSTALACIÓN SPT PUNTO MB546 CORRESPONDIENTE PROYECTO ALCALDÍAS | P136-UTMTO-00782-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 451 | 18/03/2020 | OBSERVACIONES A INFORME DE SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA SCJ18ESP00008_1 Y SCJ17FJ0002 PROYECTO 732 | P136-UTMTO-00783-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 452 | 18/03/2020 | OBSERVACIONES A INFORME DE SERVICIO CORRECTIVO INSTALACIÓN SPT PUNTO PCE19096 CORRESPONDIENTE PROYECTO ALCALDÍAS | P136-UTMTO-00784-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 453 | 18/03/2020 | OBSERVACIONES A INFORME DE SERVICIO CORRECTIVO INSTALACIÓN SPT PUNTO CVID22033 CORRESPONDIENTE PROYECTO ALCALDÍAS | P136-UTMTO-00785-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 454 | 18/03/2020 | VISITAS DE SITE SURVEY PARA LOS 2 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA POR SOLICITUD DEL IDU. | P136-UTMTO-00787-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 455 | 18/03/2020 | VISITAS DE SITE SURVEY PARA LOS 2 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA POR SOLICITUD DEL IDU. | P136-MEBOG-00788-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 456 | 18/03/2020 | OBSERVACIONES A INFORME DE SERVICIO CORRECTIVO INSTALACIÓN SPT PUNTO PCE20243 CORRESPONDIENTE PROYECTO ALCALDÍAS | P136-UTMTO-00789-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 457 | 18/03/2020 | OBSERVACIONES A INFORME DE SERVICIO MONTAJE, DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE SPT DEL PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA SCJ17E130054 PROYECTO 732 | P136-UTMTO-00790-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 458 | 18/03/2020 | OBSERVACIONES A INFORME DE SERVICIO CORRECTIVO INSTALACIÓN SPT PUNTO SCJ18FJ_F5 CORRESPONDIENTE PROYECTO 732 | P136-UTMTO-00791-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 459 | 19/03/2020 | COMPROMISOS REUNION EN C4 DEL 19 DE MARZO DE 2020 | P136-UTMTO-00798-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 460 | 19/03/2020 | SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AL PUNTO 5243 PROYECTO 350 UBICADO EN PLAZA DE BOLIVAR | P136-MEBOG-00800-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 461 | 23/03/2020 | SOLICITUD COPIA DE ACTAS DE REUNIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | P136-UTMTO-00803-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|-------------------|
| 462 | 24/03/2020 | PAC MENSUAL MARZO - ACTAS HASTA EL 20 DE MARZO | CSS-P136-0240-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 463 | 24/03/2020 | RESULTADO DE REVISIÓN DE ACTAS ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA UTSMVC Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA | P136-UTMTO-00805-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 464 | 24/03/2020 | APROBACIÓN ESTUDIO DE MERCADO DE BATERÍAS. | P136-UTMTO-00806-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 465 | 24/03/2020 | SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA FALLA PRESENTADA EN LA ESTACIÓN RICAURTE VAGÓN 3 | P136-UTMTO-00807-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 466 | 25/03/2020 | SOLICITUD DE AJUSTE DE RESOLUCIÓN DE CÁMARAS DE FONDOS DE DESARROLLO LOCAL (ALCALDÍAS) | P136-UTMTO-00812-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 467 | 25/03/2020 | SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) | P136-UTMTO-00813-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 468 | 25/03/2020 | RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA. | P136-UTMTO-00814-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 469 | 25/03/2020 | RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA | P136-UTMTO-00815-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 470 | 25/03/2020 | SOLICITUD INFORMACIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN COVID-19 | P136-UTMTO-00816-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 471 | 26/03/2020 | INTENSIÓN DE ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO 780-2019 | CSS-P136-0244-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 472 | 26/03/2020 | MONITORES DE VISUALIZACIÓN 46" | CSS-P136-0243-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 473 | 26/03/2020 | COTIZACIÓN NO. 35 - BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPO | CSS-P136-0242-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 474 | 26/03/2020 | COTIZACIÓN NO. 32 - BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPO | CSS-P136-0241-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 475 | 26/03/2020 | CAPACITACIÓN CONFIGURACIÓN TOURS EN SALAS DE MONITOREO | P136-MEBOG-00817-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 476 | 26/03/2020 | SOLICITUD DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA 1815 PROYECTO FVS | P136-UTMTO-00820-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 477 | 27/03/2020 | P136-TMSA-00145-2020 SOLICITUD DE PERMISOS PARA ESTACIONAR CARRO CANASTA DE ETB, SOBRE EL CARRIL DE TRANSMILENIO ESTACIÓN SAN VICTORINO/PROYECTO TRANSMILENIO | P136-TMSA-00821-2020 | INTERVENTORÍA | TRANSMILENIO S.A. |
| 478 | 30/03/2020 | COTIZACIÓN NO. 36 - ACTUALIZACIÓN POR VOLATILIDAD DE LA TRM | CSS-P136-0245-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 479 | 31/03/2020 | REVISIÓN ESTADO DEL SISTEMA SALAS DE MONITOREO | P136-MEBOG-00826-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|-----------|--|------------------------|---------------|---|
| 480 | 1/04/2020 | ALCANCE AL RADICADO 2020-541-0022211-1: RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN - 2020-541-020760-1. (INSUMO PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN FUNCIONAMIENTO CÁMARAS DE SEGURIDAD - USME). | P136-SSCJ-00827-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 481 | 1/04/2020 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0243-2020-REC UTMVC-7802019-328 MONITORES DE VISUALIZACIÓN 46". | P136-UTMTO-00828-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 482 | 2/04/2020 | SOLICITUD DE PERMISOS PARA ESTACIONAR CARRO CANASTA DE ETB, SOBRE EL CARRIL DE TRANSMILENIO ESTACIÓN SAN VICTORINO/PROYECTO TRANSMILENIO | P136-TMSA-00829-2020 | INTERVENTORÍA | TRANSMILENIO |
| 483 | 2/04/2020 | OFICIO S-2020-115091-MEBOG - SOLICITUD ASIGNACIÓN DE USUARIOS OPERADORES DE VIDEO A TRAVÉS DE MESA DE AYUDA | P136-UTMTO-00830-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 484 | 2/04/2020 | PAC MENSUAL ABRIL - ACTAS HASTA EL 30 DE MARZO | CSS-P136-0247-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 485 | 3/04/2020 | INFORMACIÓN HOJA DE VIDA CÁMARAS VIDEO VIGILANCIA BOGOTÁ | P136-SSCJ-00831-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 486 | 3/04/2020 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0241-2020-REC (CONCERTINA) Y RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0242-2020-REC (FUENTE DE 12V) | P136-UTMTO-00832-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 487 | 3/04/2020 | SOLICITUD ACCESO A VPN PARA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA BOGOTÁ | P136-UTMTO-00834-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 488 | 3/04/2020 | NOVEDAD COVID-19 | P136-SSCJ-00835-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 489 | 3/04/2020 | RECOMENDACIÓN PRÓRROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 914 DE 2019, CONTRATISTA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | CSS-P136-00127-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 490 | 3/04/2020 | SOLICITUD ASIGNACION DE USUARIOS OPERADORES DE VIDEO | P136-UTMTO-00837-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 491 | 3/04/2020 | INFORME MENSUAL MES DE MARZO 2020 | CSS-P136-0248-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 492 | 6/04/2020 | RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN NÚMERO 03 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 756 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y CODENSA S.A E.S.P. | CSS-P136-00128-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|---|
| 493 | 6/04/2020 | INFORME DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO REDENTOR - CARACOLÍ | CSS-P136-0252-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 494 | 6/04/2020 | INFORME DESMONTAJE - MONTAJE E INSTALACIÓN SPT PUNTO SCJ17E130054 | CSS-P136-0251-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 495 | 6/04/2020 | INSTALACIÓN SPT PUNTO SCJ18FJ_F5 | CSS-P136-0250-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 496 | 6/04/2020 | INSTALACIÓN SPT PUNTO SCJ17FJ0011 | CSS-P136-0249-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 497 | 7/04/2020 | INFORME TÉCNICO DE CÁMARAS SAMSUNG SNP-6321H CON TARJETAS SD - PROYECTO 732 DE 2017 | CSS-P136-0253-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 498 | 8/04/2020 | PAC MENSUAL ABRIL - ACTAS HASTA EL 04 DE ABRIL | CSS-P136-0254-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 499 | 9/04/2020 | ACTUALIZACIÓN PERMISOS DE INGRESO C4 - MENSUAL | P136-SSCJ-00840-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 500 | 10/04/2020 | OBSERVACIONES AL INFORME DEL CONTRATISTA UTMVC MES DE MARZO 2020 | P136-UTMTO-00841-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNT0 VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 501 | 12/04/2020 | APROBACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO REDENTOR CARACOLÍ | P136-UTMTO-00842-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNT0 VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 502 | 12/04/2020 | APROBACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MONTAJE E INSTALACIÓN DE SPT PUNTO SCJ17E130054 | P136-UTMTO-00843-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNT0 VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 503 | 12/04/2020 | APROBACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE LA INSTALACIÓN SPT PUNTO SCJ18FJ_F5 | P136-UTMTO-00844-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNT0 VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 504 | 12/04/2020 | APROBACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE LA INSTALACIÓN SPT PUNTO SCJ17FJ0011 | P136-UTMTO-00845-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNT0 VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 505 | 12/04/2020 | RESULTADO DE REVISIÓN DE ACTAS ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA UTMVC Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA | P136-UTMTO-00846-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNT0 VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 506 | 12/04/2020 | SOLICITUD ASIGNACION DE USUARIOS OPERADORES DE VIDEO | P136-MEBOG-00847-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 507 | 14/04/2020 | REPORTE NOVEDADES PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA UT BOGOTÁ MAS SEGURA | CSS-P136-00129-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 508 | 14/04/2020 | PAC MENSUAL ABRIL - ACTAS HASTA EL 04 DE ABRIL | CSS-P136-0255-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 509 | 15/04/2020 | APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE MARZO 2020 CONTRATISTA UTMVC | P136-UTMTO-00854-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNT0 VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|-----------------------|---------------|---|
| 510 | 15/04/2020 | SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AL PUNTO 5243 PROYECTO 350 UBICADO EN PLAZA DE BOLIVAR | P136-MEBOG-00855-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 511 | 15/04/2020 | RADICACIÓN FACTURA NO 7 PARA TRAMITE DEL SÉPTIMO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019. | CSS-P136-00130-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 512 | 15/04/2020 | RADICACIÓN FACTURA PARA DECIMO PAGO CONTRATISTA ETB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 CONTRATO 914 DE 2019 | CSS-P136-00131-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 513 | 15/04/2020 | RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A MARZO 2020 CONTRATISTA ETB CONTRATO 914 DE 2019 | CSS-P136-00132-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 514 | 15/04/2020 | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA CODENSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020 PAGO NO 10 CONTRATO 756 DE 2019 | CSS-P136-00133-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 515 | 15/04/2020 | RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020 CONTRATO 756 DE 2019 CODENSA. | CSS-P136-00134-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 516 | 15/04/2020 | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 PAGO NO 12 CONTRATO 780 DE 2019. | CSS-P136-00135-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 517 | 15/04/2020 | RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2020, UT SERVICIOS MNT VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CONTRATO 780 DE 2019 | CSS-P136-00136-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 518 | 15/04/2020 | RADICACIÓN INFORME NO.7 PERIODO MARZO DE 2020 PARA TRAMITE DEL SÉPTIMO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019. | CSS-P136-00137-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 519 | 16/04/2020 | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 756 DE 2019. | CSS-P136-00138-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|---|
| 520 | 16/04/2020 | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 914 DE 2019. | CSS-P136-00139-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 521 | 16/04/2020 | RETIRO PROVISIONAL DE LOSEQUIPOS DEL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA 148 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ESUBICADO EN LA CALLE 11 CON CARRERA 8 PLAZA DE BOLIVAR | P136-SSCJ-00857-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 522 | 16/04/2020 | SOLICITUD DE REINICIO DE ACTIVIDADES PARA EL CANAL BACKUP, MIGRACION VRF COSEC Y CAMBIO DEL ROUTER PRINCIPAL. | P136-SSCJ-00858-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 523 | 16/04/2020 | INFORME MENSUAL MES DE MARZO 2020 | CSS-P136-0260-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 524 | 17/04/2020 | AUTORIZACIÓN CONEXIÓN EN CENTROS DE MONITOREO | P136-SSCJ-00859-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 525 | 17/04/2020 | AUTORIZACIÓN CONTINUACION CONFIGURACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE TOURS EN COSECS. | P136-UTMTO-00860-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 526 | 17/04/2020 | FALLA MASIVA EN VMS ISS SECUROS | P136-UTMTO-00861-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 527 | 17/04/2020 | PAC MENSUAL ABRIL - ACTAS HASTA EL 14 DE ABRIL | CSS-P136-0262-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 528 | 18/04/2020 | RESPUESTA SOBRE EL CONCEPTO TÉCNICO DE LOS BIENES SOLICITADOS POR EL ALMACÉN DE LA SDSCJ | P136-SSCJ-00863-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 529 | 18/04/2020 | RESPUESTA SOBRE EL CONCEPTO TÉCNICO DE LOS BIENES SOLICITADOS POR EL ALMACÉN DE LA SDSCJ | P136-SSCJ-00865-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 530 | 20/04/2020 | RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN S-2020-109124/MEBOG-SUBCO-CAD 1.10 | P136-SSCJ-00867-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 531 | 20/04/2020 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN EQUIPOS COSECS | P136-UTMTO-00868-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|---|
| 532 | 20/04/2020 | SOLICITUD DE DURACIÓN DE GRABACIONES DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. | P136-UTMTO-00869-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 533 | 20/04/2020 | RESPUESTA A SOLICITUD DE VIABILIDAD DE UTILIZACIÓN DE BIENES DISPONIBLES EN EL ALMACÉN DE LA SDSCJ EN EL CONTRATO 780 DE 2019 | P136-SSCJ-00870-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 534 | 20/04/2020 | SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AL PUNTO P459 PROYECTO ALCALDÍAS UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 18 D CL 59 B BIS | P136-MEBOG-00871-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 535 | 21/04/2020 | VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTROS DE MONITOREO, C4 Y DATACENTER BOMBEROS. | P136-UTMTO-00872-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 536 | 22/04/2020 | SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) | P136-UTMTO-00874-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 537 | 22/04/2020 | P136-SED-00769-2020 SOLICITUD DE PERMISOS DE INGRESO PARA EL PERSONAL DE ETB, MANTENIMIENTO E INTERVENTORÍA A LAS 28 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA/PROYECTO COLEGIOS | P136-SED-00875-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL |
| 538 | 22/04/2020 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN AJUSTE DE LOGS DEL SISTEMA SECUROS DE VIDEOVIGILANCIA | P136-UTMTO-00876-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 539 | 22/04/2020 | PAC MENSUAL ABRIL - ACTAS HASTA EL 20 DE ABRIL | CSS-P136-0263-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 540 | 23/04/2020 | NOVEDADES CAMARAS 17-04-2020XLS | P136-MEBOG-00877-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 541 | 23/04/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DEL ROUTER PRINCIPAL | P136-SSCJ-00879-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 542 | 23/04/2020 | PERMISOS DE INGRESO C4 | P136-SSCJ-00880-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 543 | 23/04/2020 | SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE SERVICIO DE APLOMADO DE POSTE NO INCLUIDO EN EL ANEXO A DEL CONTRATO 780 DE 2019 | P136-UTMTO-00881-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 544 | 23/04/2020 | PAC MENSUAL ABRIL - ACTAS HASTA EL 22 DE ABRIL | CSS-P136-0264-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|-----------------------|---------------|---|
| 545 | 24/04/2020 | MATRICES EXCEL VALIDACIÓN DE CAMPOS DE GLPI | P136-SSCJ-00882-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 546 | 24/04/2020 | SOLICITUD DE CRONOGRAMA PARA LOS 9 PUNTOS DE MODERNIZACIÓN PROYECTO FVS APROBADOS POR LA OAIIE | P136-UTMTO-00885-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 547 | 25/04/2020 | RESPUESTA A LOS 3 PUNTOS DEVIDEOVIGILANCIA DEL PROYECTO FVS, QUE CUENTAN CON OBSERVACIONES POR PARTE DE LAOAIIE | P136-SSCJ-00886-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 548 | 26/04/2020 | PUNTOS DEVIDEOVIGILANCIA PENDIENTE DE APROBACIÓN DE LA OAIIE PARA TRASLADO POR OBRAS DELIDU | P136-SSCJ-00887-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 549 | 27/04/2020 | NOVEDAD PERDIDA TOURS VIDEO VIGILANCIA | P136-UTMTO-00888-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 550 | 27/04/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DEL ROUTER PRINCIPAL | P136-SSCJ-00890-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 551 | 27/04/2020 | ENTREGA DE COTIZACIONES DE LA CÁMARA MOBOTIX VANDALIZADA EN EL CTP. | P136-SSCJ-00891-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 552 | 28/04/2020 | LISTADO UNIFICADO 4850 CÁMARAS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | P136-UTMTO-00892-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 553 | 28/04/2020 | RESPUESTA A CRONOGRAMA DE PREVENTIVOS PARA DOMOS CIUDADANOS Y SUBSISTEMAS DEL CONTRATO 780 DE 2019 | P136-UTMTO-00893-2020 | INTERVENTORÍA | UT SERVICIOS MNTTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 554 | 28/04/2020 | ACTUALIZACIÓN PERMISOS DE INGRESO C4 - MENSUAL | P136-SSCJ-00894-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 555 | 29/04/2020 | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN – REMITIDO POR LA CONCEJAL DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETA. | CSS-P136-00140-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|---|
| 556 | 29/04/2020 | RESPUESTA AL RADICADO - 20203100029971. SOLICITUD COPIA DE LOS PERMISOS DE INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO, PARA LA INSTALACIÓN DE POSTE DE VIGILANCIA UBICADO EN LA INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE 33 A, DIAGONAL 33 BIS A Y CARRERA 16 AL COSTADO ORIENTAL | CSS-P136-00141-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 557 | 29/04/2020 | ANÁLISIS PROPUESTA EMITIDA POR CODENSA S.A E.S.P, FRENTE A LOS CASOS DE VANDALISMO QUE SE PRESENTAN EN LA CÁMARA AL1716., PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | CSS-P136-00142-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 558 | 29/04/2020 | CONCEPTO TÉCNICO PROPUESTA TAPA ANTI VANDALISMO EMITIDO POR CODENSA S.A E.S.P., PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | CSS-P136-00143-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 559 | 29/04/2020 | ROBOTIZACIONES Y CALIDAD DE IMÁGENES EN RESOLUCIONES FULLHD (1920*1080P) | CSS-P136-00144-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 560 | 4/05/2020 | INFORME MENSUAL MES DE ABRIL 2020 | CSS-P136-0269-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 561 | 4/05/2020 | PAC MENSUAL MAYO - ACTAS HASTA EL 28 DE ABRIL | CSS-P136-0268-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 562 | 4/05/2020 | ENVIO NOVEDADES CAMARAS 26-04-2020XLS | P136-MEBOG-00903-2020 | INTERVENTORIA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 563 | 6/05/2020 | COTIZACIÓN NO. 41 - BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPO | CSS-P136-0273-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 564 | 6/05/2020 | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN ADICIÓN | CSS-P136-0272-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 565 | 6/05/2020 | COTIZACIÓN NO. 40 - BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPO | CSS-P136-0271-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 566 | 6/05/2020 | COTIZACIÓN NO. 39 - BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPO | CSS-P136-0270-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 567 | 7/05/2020 | ACTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VERSIÓN 2 PARA APROBACIÓN | CSS-P136-0276-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 568 | 7/05/2020 | PAC MENSUAL MAYO - ACTAS HASTA EL 5 DE MAYO | CSS-P136-0275-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 569 | 7/05/2020 | SOLICITUD DE INGRESO AL ALMACEN ABRIL 2020 | CSS-P136-0274-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------------------|---------------|---|
| 570 | 7/05/2020 | SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA 148 PROYECTO ESU UBICADO EN PLAZA DE BOLIVAR | P136-MEBOG-00907-2020 | INTERVENTORIA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 571 | 7/05/2020 | PERMISOS DE INGRESO DATACENTER BOMBEROS | P136-SSCJ-00908-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 572 | 7/05/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: RE-CONFIGURACIÓN DEL DISEÑO LAN | P136-SSCJ-00909-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 573 | 11/05/2020 | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN NUMERO: 875132020 PETICIONARIO: PEDRO ADELMO MELO CETINA, GESTOR SOCIAL Y COMUNITARIO. | CSS-P136-00147-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 574 | 12/05/2020 | SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA 148 PROYECTO ESU UBICADO EN PLAZA DE BOLIVAR | P136-MEBOG-00924-2020 | INTERVENTORIA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 575 | 12/05/2020 | INTERVENTORÍA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SALAS DE VIDEO | P136-MEBOG-00925-2020 | INTERVENTORIA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 576 | 13/05/2020 | CANALES DE COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA | P136-MEBOG-00927-2020 | INTERVENTORIA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 577 | 13/05/2020 | APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2020 CONTRATISTA UTMVC | P136-UTMTO-00928-2020 | INTERVENTORIA | UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 |
| 578 | 13/05/2020 | RADICACIÓN FACTURA NO 8 PARA TRAMITE DEL OCTAVO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019. | CSS-P136-00150-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 579 | 13/05/2020 | RADICACIÓN INFORME NO 8 MES DE ABRIL DE 2020 PARA TRAMITE DEL OCTAVO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1020-2019. | CSS-P136-00153-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 580 | 14/05/2020 | SOLICITUD VENTANA DE MANTENIMIENTO: PRUEBA DE ENLACE BACKUP C4 | P136-SSCJ-00931-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|---|
| 581 | 14/05/2020 | SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR LA FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE FIBRA DEL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA AL1716 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ALCALDÍAS | P136-MEBOG-00934-2020 | INTERVENTORIA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 582 | 14/05/2020 | RADICACIÓN FACTURA CONTRATISTA UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 PAGO NO 13 CONTRATO 780 DE 2019 | CSS-P136-00154-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 583 | 14/05/2020 | RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL 2020. UT SERVICIOS MNT VIGILANCIA CIUDADANA 2019 CONTRATO 780 DE 2019 | CSS-P136-00155-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 584 | 15/05/2020 | PAC MENSUAL MAYO - ACTAS HASTA EL 11 DE MAYO | CSS-P136-0283-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 585 | 15/05/2020 | FACTURAS 39 Y 40 MES DE ABRIL - CON SOPORTES | CSS-P136-0282-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 586 | 15/05/2020 | INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL ABRIL 2020 | CSS-P136-0281-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 587 | 16/05/2020 | ENTREGA DE COTIZACIONES DE LA CÁMARA DE INDIGOVISION VANDALIZADA EN LAS ESTACIONES DE RICAURTE Y JIMÉNEZ CORRESPONDIENTES AL PROYECTO TRANSMILENIO | P136-SSCJ-00936-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 588 | 18/05/2020 | REINTREGO EQUIPOS DE ALMACEN SCJ | CSS-P136-0286-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 589 | 18/05/2020 | VERIFICACIÓN BIENES COSEC PUENTE ARANDA | CSS-P136-0285-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 590 | 18/05/2020 | PAC MENSUAL MAYO - ACTAS HASTA EL 15 DE MAYO | CSS-P136-0284-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 591 | 18/05/2020 | PAC JUNIO Y JULIO DE 2020 | P136-SSCJ-00946-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 592 | 19/05/2020 | INTENCIÓN DE PRORROGA CONTRATO 780-2019 | CSS-P136-0287-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 593 | 20/05/2020 | COTIZACIÓN NO. 42 - BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPO | CSS-P136-0288-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 594 | 20/05/2020 | RESPUESTA AL CORREO CON ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN DP. 20205410247671 | CSS-P136-00156-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|---|
| 595 | 20/05/2020 | NOVEDADES CAMARAS 15-05-2020XLS | P136-MEBOG-00952-2020 | INTERVENTORIA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 596 | 21/05/2020 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTANA DE MANTENIMIENTO ENLACE PRINCIPAL C4 | P136-SSCJ-00959-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 597 | 21/05/2020 | P136-SSCJ-00517-2020 SOLICITUD DE INSTALACIÓN DEL PANEL SOLAR PENDIENTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE 22 PANELES SOLARES EN EL PUNTO 191 DEL PROYECTO ESU | P136-SSCJ-00960-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 598 | 22/05/2020 | SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO DE MEBOG PARA ACTIVIDADES CÁMARA AL1716 | P136-SSCJ-00963-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 599 | 22/05/2020 | RESPUESTA AL RADICADO - 20205410258211. DAÑO DE TAPA DE CAJA DE INSPECCIÓN UBICADA EN LA CARRERA 13 NO. 58-83 (LOCALIDAD DE CHAPINERO). | CSS-P136-00159-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 600 | 22/05/2020 | SOLICITUD DE PERMISOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL ETB EN LA ESTACIÓN AGUAS. | P136-TMSA-00966-2020 | INTERVENTORIA | TRANSMILENIO |
| 601 | 22/05/2020 | INFORMACIÓN DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA DOMOS CIUDADANOS (FVS, ESU Y 350) Y LOS SUBSISTEMAS (CTP, CAI, TRANSMILENIO, COSEC ESTADIO, C4 Y DATA CENTER BOMBEROS) | P136-SSCJ-00967-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 602 | 26/05/2020 | PAC MENSUAL MAYO - ACTAS HASTA EL 20 DE MAYO | CSS-P136-0291-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 603 | 26/05/2020 | REPORTE DIARIO DE NOVEDADES CÁMARAS CORRESPONDIENTE AL 20 MAYO 2020 | P136-MEBOG-00976-2020 | INTERVENTORIA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 604 | 27/05/2020 | PAC MENSUAL MAYO - ACTAS HASTA EL 25 DE MAYO | CSS-P136-0293-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 605 | 27/05/2020 | INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE C4 | CSS-P136-0292-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 606 | 27/05/2020 | SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE FIBRA DEL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA 148 PROYECTO ESU UBICADO EN PLAZA DE BOLIVAR | P136-MEBOG-00979-2020 | INTERVENTORIA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 607 | 28/05/2020 | RTA 974 - OBSERVACIONES DE ACTAS DE SERVICIO | CSS-P136-0294-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|---|
| 608 | 28/05/2020 | SOLICITUD INFORMACIÓN SOPORTES DE LCD DE COSECS DE PUENTE ARANDA Y CIUDAD BOLIVAR. | P136-SSCJ-00981-2020 | INTERVENTORIA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 609 | 28/05/2020 | SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE FIBRA Y ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA AL1716 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ALCALDÍAS. | P136-MEBOG-00983-2020 | INTERVENTORIA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 610 | 29/05/2020 | PAC MENSUAL MAYO - ACTAS HASTA EL 27 DE MAYO | CSS-P136-0295-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 611 | 29/05/2020 | MONITOREO PERMANENTE PUNTO DE CÁMARA 7665 AL1716 KR 20 CL 12A | P136-MEBOG-00985-2020 | INTERVENTORIA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 612 | 1/06/2020 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0288-2020 - COTIZACIÓN N°042 PARA INCLUIR AL ANEXO N° 2 / BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPOS - VIDEOWALL. | P136-UTMTO-00995-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 613 | 1/06/2020 | SOLICITUD DE TRAZABILIDAD DE LAS 2 CÁMARAS INSTALADAS EN EL PUNTO AL1716 Y NO FUNCIONARON EL DÍA 30 DE MAYO DE 2020 | P136-UTMTO-00996-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 614 | 1/06/2020 | REPORTE DE NOVEDAD PRESENTADA EN EL PUNTO 5243 UBICADO EN LA PLAZA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 350. | P136-SSCJ-00997-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 615 | 1/06/2020 | VISUALIZACIÓN CÁMARAS EN CENTROS DE MONITOREO | P136-SSCJ-00998-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 616 | 2/06/2020 | PAC MENSUAL JUNIO - ACTAS HASTA EL 31 DE MAYO | CSS-P136-0296-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 617 | 2/06/2020 | RESPUESTA AL RADICADO CSS-P136-0287-2020-REC - INTENCIÓN DE PRORROGA CONTRATO 780-2019. | P136-UTMTO-01000-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 618 | 2/06/2020 | RESPUESTA A SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE LOS 5 BIENES DE LA SDSCJ, SI CORRESPONDE AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. | P136-SSCJ-01001-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 619 | 2/06/2020 | RESPUESTA A SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE LOS 5 BIENES DE LA SDSCJ, SI CORRESPONDE AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. | CSS-P136-00161-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|-----------|--|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 620 | 2/06/2020 | TEST DE HARDWARE | P136-UTMTO-01002-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 621 | 3/06/2020 | INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL MAYO 2020 | CSS-P136-0297-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 622 | 4/06/2020 | ACTUALIZACIÓN INFORME DESMONTE DE PUNTO DE VIGILANCIA - FVS - 4815 | CSS-P136-0308-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 623 | 4/06/2020 | ACTUALIZACIÓN INFORME DESMONTE DE PUNTO DE VIGILANCIA - SCJ18FJ_F5 FONTIBON | CSS-P136-0307-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 624 | 4/06/2020 | ACTUALIZACIÓN INFORME DE INSTALACIÓN SPT PUNTO ALCALDIAS CVID22033 | CSS-P136-0306-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 625 | 4/06/2020 | INSTALACIÓN SPT PUNTO ALCALDIAS PCE20243 | CSS-P136-0305-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 626 | 4/06/2020 | INFORME INSTALACIÓN DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA CENTROS DE MONITOREO | CSS-P136-0304-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 627 | 4/06/2020 | DESMONTE DE PUNTO DE VIGILANCIA - FVS - 4815 | CSS-P136-0303-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 628 | 4/06/2020 | INSTALACIÓN SPT PUNTO ALCALDIAS MB546 | CSS-P136-0302-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 629 | 4/06/2020 | INSTALACIÓN SPT PUNTO ALCALDIAS PCE19096 | CSS-P136-0301-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 630 | 4/06/2020 | INSTALACIÓN SPT PUNTO ALCALDIAS CVID22033 | CSS-P136-0300-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 631 | 4/06/2020 | INSTALACIÓN SPT PUNTO ALCALDIA PCE20243 | CSS-P136-0299-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 632 | 4/06/2020 | DESMONTE DE PUNTO DE VIGILANCIA - SCJ18FJ_F5 FONTIBON | CSS-P136-0298-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 633 | 4/06/2020 | PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PARA LOS COLEGIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 | P136-SED-01005-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL |
| 634 | 4/06/2020 | MIGRACIÓN DE VRF COSEC | P136-MEBOG-01007-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 635 | 4/06/2020 | INTERVENTORÍA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SALAS DE VIDEO | P136-MEBOG-01008-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 636 | 5/06/2020 | PAC MENSUAL JUNIO - ACTAS HASTA EL 04 DE JUNIO | CSS-P136-0311-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 637 | 5/06/2020 | ACTUALIZACIÓN INFORME INSTALACIÓN SPT PUNTO ALCALDIAS PCE19096 | CSS-P136-0310-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 638 | 5/06/2020 | ACTUALIZACIÓN INFORME INSTALACIÓN SPT PUNTO ALCALDIAS MB546 | CSS-P136-0309-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|-----------|---|------------------------|---------------|---|
| 639 | 5/06/2020 | SOLICITUD DE INSTALACIÓN DEL PANELSOLAR PARA EL PUNTO SCJ17E100019 PROYECTO 732 | P136-SSCJ-01009-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 640 | 5/06/2020 | SOLICITUD DE INSTALACIÓN DEL PANELSOLAR PENDIENTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE 22 PANELES SOLARES EN EL PUNTO191 DEL PROYECTO | P136-UTMTO-01010-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 641 | 5/06/2020 | SOLICITUD SERVICIO ESTACIÓN DE POLICIA DE SUBA | P136-UTMTO-01011-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 642 | 5/06/2020 | SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA A LA ESTACIÓN HÉROES VAGÓN 3 NOVEDAD FILTRACIÓN AGUA | P136-UTMTO-01013-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 643 | 5/06/2020 | RESPUESTA A PROPUESTA ECONÓMICA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA E INSTALACIÓN DE LA TAPA DE SEGURIDAD | P136-UTMTO-01016-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 644 | 6/06/2020 | INFORMACIÓN DE 2 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA, LOS CUALES PRESENTAN LA NOVEDAD DE POSTE DESAPLOMADO. | CSS-P136-00164-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 645 | 6/06/2020 | INFORMACIÓN DE FECHA DE ATENCIÓN PARA EL CAI SANTA MATILDE Y CAÍ PUENTE ARANDA POR FALLA EN EL CCTV | P136-UTMTO-01017-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 646 | 6/06/2020 | INFORMACIÓN DE FECHA DE ATENCIÓN PARA EL CAI SANTA MATILDE Y CAÍ PUENTE ARANDA POR FALLA EN EL CCTV | P136-MEBOG-01018-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 647 | 7/06/2020 | RESPUESTA AL CORREO CON ASUNTO: CONCEJAL PEDRO JULIÁN LÓPEZ. | CSS-P136-00165-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 648 | 8/06/2020 | SOLICITUD DE INGRESO AL ALMACEN MAYO 2020 | CSS-P136-0313-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 649 | 8/06/2020 | REPORTE EQUIPOS VANDALIZADOS CTP | CSS-P136-0312-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 650 | 8/06/2020 | RELACIÓN DE ACTAS QUE NO SUPERARON LA FASE DE CONCILIACIÓN | P136-UTMTO-01020-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 651 | 8/06/2020 | INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE C4 | P136-UTMTO-01021-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 652 | 8/06/2020 | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS | P136-SSCJ-01022-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 653 | 9/06/2020 | INFORME 3ER MANTENIMIENTO PREVENTIVO COSEC CIUDAD BOLIVAR | CSS-P136-0316-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |

CONSORCIO SMARTY SCAIN 2019
 Contrato 1020 de 2019
 Interventoría Integral a proyectos de videovigilancia

INFORME INTERVENTORÍA
 01/07/2020– 30/07/2020
 Revisión 1, 10 de agosto de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|---|
| 654 | 9/06/2020 | INFORME 3ER MANTENIMIENTO PREVENTIVO COSEC PUENTE ARANDA | CSS-P136-0315-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 655 | 9/06/2020 | REPORTE FALLA MASIVA PLATAFORMA DE VIDEO DE VIGILANCIA 02-06-2020 | CSS-P136-0314-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 656 | 9/06/2020 | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN SALAS DE VIDEO | P136-MEBOG-01026-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 657 | 9/06/2020 | PERMISOS DE INGRESO C4 | P136-SSCJ-01027-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 658 | 9/06/2020 | SOLICITUD VERIFICACIÓN ENLACE. | P136-UTMTO-01028-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 659 | 9/06/2020 | CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES FRENTE AL COVID-19 | P136-UTMTO-01029-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 660 | 10/06/2020 | WORKSTATION PRECISIÓN TOWER 3630 (ESTACIONES DE POLICÍA & PUESTOS DE TRABAJO | CSS-P136-0318-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 661 | 10/06/2020 | OBSERVACIONES AL INFORME DEL CONTRATISTA UTMVC MES DE MAYO 2020 | P136-UTMTO-01030-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 662 | 11/06/2020 | CONCEPTO TÉCNICO ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE TAPA ANTIVANDÁLICA, PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | CSS-P136-00167-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 663 | 11/06/2020 | CONFIRMACIÓN CAPACITACIÓN CONFIGURACIÓN ANALITICA EN C4. | P136-MEBOG-01032-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 664 | 11/06/2020 | APROBACIÓN DE INFORMES VISITAS TERCERA RONDA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COSECS , PUENTE ARANDA Y CIUDAD BOLÍVAR. | P136-UTMTO-01033-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 665 | 11/06/2020 | APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE MAYO DE 2020 CONTRATISTA UTMVC | P136-UTMTO-01034-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 666 | 11/06/2020 | AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE SWITCH 8 PUERTOS EN LA ESTACIÓN HÉROES | P136-UTMTO-01036-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 667 | 11/06/2020 | SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS PUNTOS APROBADOS POR LA OAIEE CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FVS | P136-UTMTO-01037-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 668 | 12/06/2020 | SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE LOS BIENES DE LA SDSCJ REFERENCIADOS EN EL CORREO, SI CORRESPONDEN A LOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL COSEC PUENTE ARANDA O EN EL CTP | P136-UTMTO-01038-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|---|
| 669 | 12/06/2020 | ESTUDIO DE MERCADO VIDEO WALL C4 | P136-SSCJ-01039-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 670 | 12/06/2020 | FALLA MASIVA EN VMS ISS SECUROS | P136-UTMTO-01040-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 671 | 12/06/2020 | OBSERVACIONES AL INFORME DE CAI | P136-UTMTO-01042-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 672 | 12/06/2020 | SOLICITUD DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DESINSTALADOS QUE NO FUERON AUTORIZADOS SU RETIRO POR LOS FUNCIONARIO DEL CAI | P136-MEBOG-01043-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 673 | 15/06/2020 | RESPUESTA DEL HELP DESK A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA. | P136-UTMTO-01045-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 674 | 16/06/2020 | PAC MENSUAL JUNIO - ACTAS HASTA EL 07 DE JUNIO | CSS-P136-0322-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 675 | 16/06/2020 | INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL MAYO 2020 | CSS-P136-0321-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 676 | 16/06/2020 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO DE FABRICANTE BOSCH EN LA NOVEDAD PRESENTADA EN EL COSEC DE KENNEDY (TOURS) | P136-SSCJ-01047-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 677 | 16/06/2020 | URGENTE RETIRO DE MÓDULOS E INSTALACIÓN DE (2) BANCOS DE BATERÍAS | P136-UTMTO-01049-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 678 | 16/06/2020 | RESPUESTA AL DOCUMENTO RADICADO EN LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ CON NUMERO: 2020EE292227 – SINPROC: 2758659. – DENUNCIA PRESENTADA POR EL H. CONCEJAL JORGE LUIS COLMENARES, ACTUACIONES DE LA SDSCJ FRENTE AL FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA DE B | CSS-P136-00176-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 679 | 16/06/2020 | SOLICITUD DE GARANTÍA EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADOS DESDE EL DÍA 5 AL 15 DE JUNIO DE 2020 | P136-UTMTO-01050-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 680 | 17/06/2020 | FACTURAS 41 Y 42 MES DE MAYO - CON SOPORTES | CSS-P136-0323-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 681 | 17/06/2020 | INFORMES DE SISTEMAS PUESTA A TIERRA APROBADOS Y FACTURADOS POR LA INTERVENTORÍA EN EL MES DE JUNIO DE 2020. | P136-UTMTO-01051-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 682 | 17/06/2020 | NOVEDADES CAMARAS 11-06-2020XLS | P136-MEBOG-01052-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|---|
| 683 | 17/06/2020 | INFORMESDESMONTAJE DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA APROBADOS Y FACTURADOS POR LA INTERVENTORÍA EN EL MES DE JUNIO DE 2020. | P136-UTMTO-01053-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 684 | 17/06/2020 | OBSERVACIONES AL INFORME DEL CTP DE CÁMARAS VANDALIZADAS | P136-UTMTO-01054-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 685 | 17/06/2020 | REPORTE FALLA MASIVA PLATAFORMA DE VIDEO VIGILANCIA 02-06-2020 - CONTRATO 780 DE 2019. | P136-UTMTO-01055-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 686 | 17/06/2020 | PAC MENSUAL JUNIO - ACTAS HASTA EL 04 DE JUNIO | P136-UTMTO-01056-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 687 | 18/06/2020 | PAC MENSUAL JUNIO - ACTAS HASTA EL 14 DE JUNIO | CSS-P136-0324-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 688 | 18/06/2020 | RESULTADO DE LA REVISIÓN PARA LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR EL IDU, CON RESPECTO A LA OBRA DE LA AVENIDA GUAYACANES | P136-SSCJ-01058-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 689 | 18/06/2020 | P136-SSCJ-00967-2020- INFORMACIÓN DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA LOS SUBSISTEMAS (C4 Y DATA CENTER BOMBEROS) | P136-UTMTO-01059-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 690 | 18/06/2020 | MATERIALES Y EQUIPOS IDENTIFICADOS PARA REEMPLAZO DE LA TERCERA RONDA DE COSECS. | P136-SSCJ-01060-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 691 | 18/06/2020 | ENTREGA DE INFORME DE EQUIPOS A INSTALAR Y SERVICIOS A REALIZAR EN EL SUBSISTEMA CTP | P136-SSCJ-01061-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 692 | 18/06/2020 | ENTREGA DE INFORME DE EQUIPOS A INSTALAR Y SERVICIOS A REALIZAR EN EL SUBSISTEMA TRANSMILENIO | P136-SSCJ-01065-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 693 | 18/06/2020 | VISITAS DE SITE SURVEY PARA EL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA 101 PROYECTO ESU UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY. | P136-MEBOG-01066-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 694 | 18/06/2020 | AVANCE DE FACTURACIÓN. | P136-UTMTO-01067-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 695 | 19/06/2020 | FALLA MASIVA EN VMS ISS SECUROS 11/06/2020 | P136-UTMTO-01069-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 696 | 19/06/2020 | FALLA MASIVA EN VMS ISS SECUROS 15/06/2020 | P136-UTMTO-01070-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|---|
| 697 | 19/06/2020 | FALLA MASIVA EN VMS ISS SECUROS 18/06/2020 | P136-UTMTO-01071-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 698 | 19/06/2020 | CAIDA DE SERVIDORES DATACENTER | P136-SSCJ-01072-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 699 | 19/06/2020 | INGRESO DATACENTER BOMBEROS | P136-SSCJ-01073-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 700 | 20/06/2020 | AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE SWITCH 8 PUERTOS EN LA ESTACIÓN AGUAS | P136-UTMTO-01074-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 701 | 21/06/2020 | OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN EL APLICATIVO WEB GLPI | P136-UTMTO-01075-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 702 | 23/06/2020 | PAC MENSUAL JUNIO - ACTAS HASTA EL 17 DE JUNIO | CSS-P136-0325-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 703 | 23/06/2020 | RECOMENDACIÓN DE PRÓRROGA NO. 3 AL CONTRATO 780 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LA UT - SMVC. | CSS-P136-00177-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 704 | 23/06/2020 | RESPUESTA A ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GENERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRA. | CSS-P136-00178-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 705 | 23/06/2020 | RESPUESTA AL COMUNICADO S-2020-185892 – INFORME NOVEDAD SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MEBOG. | CSS-P136-00179-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 706 | 24/06/2020 | COTIZACIÓN NO. 44 Y 49 - BOLSA DE MATERIALES Y EQUIPO | CSS-P136-0327-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 707 | 24/06/2020 | VERIFICACIÓN BIENES COSEC PUENTE ARANDA Y CTP. | CSS-P136-0326-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 708 | 24/06/2020 | INCUMPLIMIENTO PMT PARA PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA PROGRAMADOS PARA EL 23 JUNIO 2020. | P136-UTMTO-01076-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 709 | 24/06/2020 | RECONFIGURACIÓN PREMIERONE. | P136-UTMTO-01077-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 710 | 24/06/2020 | SOLICITUD DE PERMISOS DE INGRESO PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA A LAS INSTITUCIONES | P136-SED-01078-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|---------------|---|
| | | EDUCATIVAS/PROYECTO COLEGIOS | | | |
| 711 | 24/06/2020 | BIENES SECRETARÍA | P136-UTMTO-01079-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 712 | 24/06/2020 | REPORTE DE NOVEDAD DETECTADA POR EL CONTRATISTA DE ETB EN EL PUNTO SCJ17E190015 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 732 | P136-UTMTO-01081-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 713 | 24/06/2020 | SOLICITUD DE CUADRO ECONÓMICO SERVICIOS Y REPUESTOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CAI MODELO Y BACHUÉ. | P136-UTMTO-01082-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 714 | 24/06/2020 | SEGUIMIENTO A SOLICITUDES REALIZADAS POR LA MEBOG EN EL PROYECTO CAI | P136-SSCJ-01083-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 715 | 25/06/2020 | REPORTE DE DVR QUE SE ENCUENTRA EN FALLA EN EL PROYECTO CAI | P136-MEBOG-01084-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 716 | 25/06/2020 | PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA APROBADOS POR LA OAIIE PARA TRASLADO POR OBRAS DEL IDU | P136-SSCJ-01085-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 717 | 25/06/2020 | SOLICITUD DE TRASLADO DEL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA 145 UBICADO EN LA CALLE 12 CON AVENIDA CIUDAD DE CALI CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ESU | P136-UTMTO-01086-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 718 | 25/06/2020 | REITERACIÓN FALLA MASIVA EN VMS ISS SECUROS 11/06/2020 | P136-UTMTO-01087-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 719 | 25/06/2020 | REITERACIÓN FALLA MASIVA EN VMS ISS SECUROS 15/06/2020 | P136-UTMTO-01088-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 720 | 25/06/2020 | REITERACIÓN FALLA MASIVA EN VMS ISS SECUROS 18/06/2020 | P136-UTMTO-01089-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 721 | 25/06/2020 | RESPUESTA AL OFICIO NÚMERO: 20205410249881 REMITIDO POR LA UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ MÁS SEGURA 2017 - NOVEDAD PUNTOS VIDEO VIGILANCIA SCJ17FJ0002 Y SCJ18ESP00007_1 | CSS-P136-00181-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 722 | 26/06/2020 | PAC MENSUAL JUNIO - ACTAS HASTA EL 25 DE JUNIO | CSS-P136-0328-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 723 | 26/06/2020 | SOLICITUD INGRESO VERIFICACIÓN FALLA ENLACE DATACENTER BOMBEROS | P136-SSCJ-01092-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|-----------------------|---------------|---|
| 724 | 27/06/2020 | VISITA DE VERIFICACIÓN INVENTARIO DEL MES DE JUNIO EN LA BODEGA DEL CONTRATISTA UTSMVC | P136-UTMTO-01097-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 725 | 27/06/2020 | SOLICITUD INGRESO VERIFICACIÓN FALLA ENLACE DATACENTER BOMBEROS | P136-SSCJ-01100-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 726 | 29/06/2020 | ACTUALIZACIÓN PERMISOS DE INGRESO C4 - MENSUAL | P136-SSCJ-01102-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 727 | 29/06/2020 | PERMISOS DE INGRESO DATACENTER BOMBEROS | P136-SSCJ-01103-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 728 | 30/06/2020 | RECOMENDACIONES ORIENTADAS HACIA UNA MEJORA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y ESTADO DEL CONTRATO 780 DE 2019 | CSS-P136-00182-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 729 | 30/06/2020 | VISITA TÉCNICA DATACENTER C4 | P136-UTMTO-01105-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 730 | 30/06/2020 | RECOMENDACIÓN DE PRÓRROGA 3 AL CONTRATO 780 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LA UT - SMVC. | CSS-P136-00184-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 731 | 30/06/2020 | RESPUESTA AL DP CONCEJAL ROLANDO GONZÁLEZ GARCÍA. | CSS-P136-00185-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 732 | 30/06/2020 | VISITA TÉCNICA DATACENTER C4 | P136-SSCJ-01110-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 733 | 29/06/2020 | PERMISOS DE INGRESO DATACENTER BOMBEROS | P136-SSCJ-01103-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|---|
| 734 | 30/06/2020 | RECOMENDACIONES ORIENTADAS HACIA UNA MEJORA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y ESTADO DEL CONTRATO 780 DE 2019 | CSS-P136-00182-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 735 | 30/06/2020 | VISITA TÉCNICA DATACENTER C4 | P136-UTMTO-01105-2020 | INTERVENTORÍA | UT - SMVC |
| 736 | 30/06/2020 | RECOMENDACIÓN DE PRÓRROGA 3 AL CONTRATO 780 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LA UT - SMVC. | CSS-P136-00184-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 737 | 30/06/2020 | RESPUESTA AL DP CONCEJAL ROLANDO GONZÁLEZ GARCÍA. | CSS-P136-00185-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 738 | 30/06/2020 | VISITA TÉCNICA DATACENTER C4 | P136-SSCJ-01110-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 739 | 1/07/2020 | PRUEBAS DE CONMUTACIÓN ENLACES PRINCIPAL Y BACKUP | P136-UTMTO-01111-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 740 | 1/07/2020 | RESULTADO DE REVISIÓN DE ACTAS ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA UTMVC Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA AL 26 DE JUNIO DE 2020. | P136-UTMTO-01112-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 741 | 1/07/2020 | PAC MENSUAL JUNIO - ACTAS HASTA EL 30 DE JUNIO | CSS-P136-0329-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 742 | 2/07/2020 | REPORTE DIARIO DE NOVEDADES CÁMARAS CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DEL 2020. | P136-MEBOG-01113-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 743 | 2/07/2020 | NOVEDAD PUESTOS DE DESCARGAS FILMICAS, PMU C-4 Y PMU BOMBEROS | P136-UTMTO-01115-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 744 | 2/07/2020 | PAC MENSUAL JUNIO - ACTAS HASTA EL 30 DE JUNIO | CSS-P136-0330-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 745 | 3/07/2020 | RESPUESTA AL OFICIO CON RADICADO NÚMERO: 20205410296011-1- SOLICITUD TRASLADO CÁMARAS UBICADAS EN: 1.) CALLE 10 CON CARRERA 89 Y 2.) AVENIDA CIUDAD DE CALI CON CALLE 12, COSTADO OCCIDENTAL. | CSS-P136-00188-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 746 | 3/07/2020 | PUNTOS SIN RESPUESTA A LA UPS - 732 | P136-UTMTO-01116-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 747 | 3/07/2020 | PUNTOS SIN RESPUESTA A LA UPS - ALCALDIAS | P136-UTMTO-01117-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|-----------|--|------------------------|---------------|---|
| 748 | 3/07/2020 | REPORTE ESTADO PAGOS DEL FDL ANTONIO NARIÑO Y RAFAEL URIBE URIBE | CSS-P136-00189-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 749 | 3/07/2020 | SOLICITUD PROCEDIMIENTO DE CIERRE CONTRATO NO. 780-2019 | CSS-P136-0331-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 750 | 6/07/2020 | APROBACIÓN DE ACTAS DE HORA INGENIERO - CONFIGURACIÓN TOURS DE COSECS | P136-UTMTO-01119-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 751 | 6/07/2020 | NOVEDAD REPORTADA CON EL PUNTO P444 DEL PROYECTO ALCALDÍAS | P136-UTMTO-01120-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 752 | 6/07/2020 | VISITAS DE SITE SURVEY PARA LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA PAQ62 PROYECTO ALCALDÍAS Y SCJ17E070048 PROYECTO 732 UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA. | P136-MEBOG-01121-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 753 | 6/07/2020 | RESPUESTA OFICIO CON CONSECUTIVO UTSMVC-7802019-440 | CSS-P136-00190-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 754 | 6/07/2020 | INFORME DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL SUBSISTEMA DE COLEGIOS JUNIO | CSS-P136-0338-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 755 | 6/07/2020 | INFORME DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL SUBSISTEMA CAI | CSS-P136-0337-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 756 | 6/07/2020 | REPORTE CAMBIO DE REPUESTOS PANTALLA MITSUBISHI C4 | CSS-P136-0336-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 757 | 6/07/2020 | DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS DE PVC CON INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR PUNTO ESU - 191 | CSS-P136-0335-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 758 | 6/07/2020 | SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIÓN DE POLICIA PUENTE ARANDA Y CTP | CSS-P136-0334-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 759 | 6/07/2020 | INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO DATACENTER - BOMBEROS | CSS-P136-0333-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 760 | 6/07/2020 | INFORME TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO C4 | CSS-P136-0332-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 761 | 7/07/2020 | SOLICITUD PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL DE JUNIO DE 2020 - CONTRATO 780 DE 2019. | P136-UTMTO-01123-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 762 | 7/07/2020 | SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LIMPIEZA DE ACRÍLICOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y MANTENIMIENTO REVENTIVOS P | P136-UTMTO-01125-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 763 | 7/07/2020 | RESPUESTA A LA SOLICITUD RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN CIUDADANO - 20205410316011 | CSS-P136-00191-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|---|
| 764 | 7/07/2020 | SOLICITUD DE TRASLADO DEL PUNTO CCEL04_011 LOCALIDAD DE SANTA FE | CSS-P136-00192-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 765 | 7/07/2020 | RESPUESTA OFICIO CON CONSECUTIVO UTSMVC-7802019-440 | CSS-P136-00193-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 766 | 7/07/2020 | INFORME MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SUBSISTEMA CAI'S MAYO 2020 | CSS-P136-0339-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 767 | 8/07/2020 | SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS - MODIFICATORIO 3 - CONTRATO 780 DE 2019. | P136-UTMTO-01128-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 768 | 8/07/2020 | REITERACIÓN PRUEBAS DE CONMUTACIÓN ENLACES PRINCIPAL Y BACKUP | P136-UTMTO-01129-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 769 | 8/07/2020 | INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO DATACENTER - BOMBEROS | CSS-P136-0343-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 770 | 8/07/2020 | SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSMILENIO | CSS-P136-0342-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 771 | 8/07/2020 | SOLICITUD DE INGRESO AL ALMACEN JUNIO 2020 | CSS-P136-0341-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 772 | 8/07/2020 | INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL JUNIO 2020 | CSS-P136-0340-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 773 | 9/07/2020 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LOS PUNTOS APROBADOS POR LA OAIIE CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN FVS | P136-UTMTO-01132-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 774 | 9/07/2020 | SUBSANACIÓN DE LAS NOVEDADES DE ENTREGABLES DEL SUBSISTEMA CAI | P136-UTMTO-01134-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 775 | 9/07/2020 | SUBSANACIÓN DE LAS NOVEDADES DE ENTREGABLES DEL SUBSISTEMA CAI | P136-UTMTO-01135-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 776 | 9/07/2020 | PAC MENSUAL JULIO - ACTAS HASTA EL 08 DE JULIO | CSS-P136-0345-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 777 | 10/07/2020 | SOLICITUD DE INSTALACIÓN DEL PANEL SOLAR PARA EL PUNTO SCJ17E100019 PROYECTO 732 | P136-UTMTO-01136-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 778 | 10/07/2020 | SUBSANACIÓN DE LAS NOVEDADES DE ENTREGABLES DEL SUBSISTEMA COLEGIOS | P136-UTMTO-01137-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 779 | 10/07/2020 | SUBSANACIÓN DE LAS NOVEDADES DE ENTREGABLES DEL SUBSISTEMA COLEGIOS | P136-UTMTO-01138-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 780 | 10/07/2020 | INFORMACIÓN DEL TRASLADO PROVISIONAL DE LOS PUNTOS PAQ62 DEL PROYECTO ALCALDÍAS Y SCJ17E070048 DEL PROYECTO 732 | P136-SSCJ-01139-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------------------|---------------|---|
| 781 | 10/07/2020 | ACLARACIONES INSTALACIÓN DEL REPUESTO DE VIDEO WALL | CSS-P136-00195-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 782 | 10/07/2020 | NOVEDADES PRESENTADAS EN LAS ACTIVIDADES DE CORRECTIVOS DE LOS PUNTOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | P136-UTMTO-01140-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 783 | 10/07/2020 | RESPUESTA A SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE LOS 6 BIENES DE LA SDSCJ, SI CORRESPONDE AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. | CSS-P136-00196-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 784 | 11/07/2020 | REPORTE DEL ESTADO DEL SISTEMA CADA CUATRO HORAS | P136-UTMTO-01141-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 785 | 11/07/2020 | SEGUIMIENTO A SOLICITUDES REALIZADAS POR LA MEBOG ESTACIONES DE POLICÍA | P136-SSCJ-01142-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 786 | 11/07/2020 | SOLICITUD DE TRASLADO DEL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA CCEL04_011 UB ICADO EN LA CALLE 1 BIS CON CARRERA 2A ESTE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ESU | P136-UTMTO-01143-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 787 | 12/07/2020 | VERIFICACIÓN CONFIGURACIÓN TOURS CÁMARAS | P136-MEBOG-01144-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 788 | 13/07/2020 | TRASLADO PUNTO ESU-145 POR OBRAS DEL IDU | P136-MEBOG-01145-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 789 | 13/07/2020 | ESTUDIO DE MERCADO SOPORTE DE 46", CONVERTIDORES DE CONEXIÓN DE VISUALIZACIÓN Y UNIDAD DE DVD. | P136-SSCJ-01146-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 790 | 13/07/2020 | PUNTOS DE CÁMARA QUE SE VAN A TRASLADAR POR OBRAS DEL IDU | P136-MEBOG-01149-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 791 | 14/07/2020 | REPORTE DIARIO DE NOVEDADES CÁMARAS CORRESPONDIENTE AL 02 DE JULIO DEL 2020. | P136-MEBOG-01152-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 792 | 14/07/2020 | SOLICITUD DE GARANTÍA EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVOS Y ACRÍLICOS, REALIZADOS DESDE EL DÍA 1 AL 13 DE JUNIO DE 2020 | P136-UTMTO-01153-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 793 | 14/07/2020 | OBSERVACIONES AL INFORME DEL CONTRATISTA UTSMVC MES DE JUNIO 2020 | P136-UTMTO-01156-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 794 | 14/07/2020 | SUBSANACIÓN DE LAS NOVEDADES DE ENTREGABLES DEL SUBSISTEMA TRANSMILENIO | P136-UTMTO-01157-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|---|
| 795 | 14/07/2020 | SUBSANACIÓN DE LAS NOVEDADES DE ENTREGABLES DEL SUBSISTEMA CTP | P136-UTMTO-01158-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 796 | 14/07/2020 | SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR EL TRASLADO DEL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA CCEL04_011 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ALCALDÍAS. | P136-MEBOG-01159-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 797 | 14/07/2020 | OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN DATACENTER Y C4 | P136-UTMTO-01161-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 798 | 14/07/2020 | INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO C4 | CSS-P136-0349-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 799 | 15/07/2020 | SOLICITUD DE DESMONTE DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA PAQ62 Y CVID21953 PROYECTO ALCALDÍAS Y PARA EL PUNTO SCJ17E070048 DEL PROYECTO 732 | P136-UTMTO-01163-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 800 | 15/07/2020 | APROBACION CRONOGRAMA MODERNIZACIÓN | P136-UTMTO-01165-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 801 | 15/07/2020 | APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE JULIO DE 2020 - CONTRATO 780 DE 2019. | P136-UTMTO-01166-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 802 | 15/07/2020 | PAC MENSUAL JULIO - ACTAS HASTA EL 15 DE JULIO | CSS-P136-0350-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 803 | 16/07/2020 | AUTORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CAI MODELO Y BACHUÉ PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | P136-SSCJ-01167-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 804 | 16/07/2020 | OBSERVACIONES AL INFORME DE INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR PUNTO 191 DEL PROYECTO ESU | P136-UTMTO-01168-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 805 | 16/07/2020 | P136-UTMTO-01030-2020 OBSERVACIONES AL INFORME DE INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR PUNTO 191 DEL PROYECTO ESU | P136-UTMTO-01169-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 806 | 16/07/2020 | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS ROBOTIZACIÓN SERVIDOR SUBA | P136-SSCJ-01170-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 807 | 16/07/2020 | SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA AL FUERTE DE CARABINEROS PARQUE NACIONAL | P136-UTMTO-01173-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 808 | 16/07/2020 | SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA AL FUERTE DE CARABINEROS PARQUE NACIONAL | P136-UTMTO-01174-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 809 | 16/07/2020 | NOVEDAD DE ATENCIÓN DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA POR FALTA DE CÁMARAS DE STOCK POR PARTE DEL CONTRATISTA | P136-UTMTO-01175-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|---|
| | | DE MANTENIMIENTO UTMVC. | | | |
| 810 | 16/07/2020 | SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA ESTACIÓN DE POLICIA CIUDAD BOLÍVAR | P136-UTMTO-01176-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 811 | 16/07/2020 | FACTURAS 43 Y 44 MES DE JUNIO - CON SOPORTES | CSS-P136-0351-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 812 | 17/07/2020 | VISITA DE VERIFICACIÓN INVENTARIO DEL MES DE JULIO EN LA BODEGA DEL CONTRATISTA UTMVC | P136-UTMTO-01179-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 813 | 17/07/2020 | INFORME DE GESTIÓN MES DE JUNIO | CSS-P136-0352-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 814 | 18/07/2020 | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS VERIFICACIÓN CONFIGURACIÓN TOURS | P136-SSCJ-01182-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 815 | 18/07/2020 | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS CONFIGURACIÓN EQUIPO PROCERA | P136-SSCJ-01183-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 816 | 20/07/2020 | REVISIÓN CENTROS COMERCIALES | P136-SSCJ-01184-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 817 | 20/07/2020 | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN SERGIO VALDES BELTRÁN. DERECHO DE PETICIÓN NUMERO: 20205410331061 | CSS-P136-00205-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 818 | 21/07/2020 | OBSERVACIONES AL INFORME DEL PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA ESU-145 | P136-UTMTO-01186-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 819 | 22/07/2020 | SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DEL ESTADO LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE SE ENVÍA EN LA RUTA DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS POR PARTE DEL HELP DESK DEL CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO UTMVC | P136-UTMTO-01188-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 820 | 22/07/2020 | SOLICITUD DE UNIFICACIÓN DEL ENLACE DE ETB DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA (SCJ18ESP00008_1 Y SCJ17FJ 0021) (SCJ18ES P00007_1 Y SCJ17FJ 0002) CORRESPONDIENTE ALPROYECTO 732 | P136-SSCJ-01189-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------------------|---------------|---|
| 821 | 23/07/2020 | INFORME PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA CON FALLAS | P136-SSCJ-01190-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 822 | 23/07/2020 | RESPUESTA AL CORREO PROPOSICIÓN 575 – SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. | CSS-P136-00207-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 823 | 23/07/2020 | SOLICITUD DE GARANTÍA EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACRÍLICOS, REALIZADOS DESDE EL DÍA 13 AL 20 DE JULIO DE 2020 | P136-UTMTO-01193-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 824 | 24/07/2020 | VIGENCIA PÓLIZAS CONTRATO 780 DE 2019 – MODIFICACIÓN 3. | CSS-P136-00208-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 825 | 24/07/2020 | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN: DIAGNOSTICO SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA - CONCEJAL JUAN JAVIER BAENA MERLANO. | CSS-P136-00210-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 826 | 25/07/2020 | SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE SAN CRISTÓBAL | P136-UTMTO-01197-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 827 | 25/07/2020 | OBSERVACIONESAL INFORME DE LOS PUNTOS DESINSTALADOS DE VIDEOVIGILANCIA PAQ62 Y CVID21953PROYECTO ALCALDÍAS Y PARA EL PUNTO SCJ17E070048 DEL PROYECTO 732 | P136-UTMTO-01198-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 828 | 25/07/2020 | RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL DOCUMENTO ADJUNTO PARA EL SUBSISTEMA CTP | P136-UTMTO-01199-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 829 | 27/07/2020 | ACLARACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA 5069-350 Y AL591- ALCALDÍAS | P136-UTMTO-01200-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 830 | 27/07/2020 | SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA A LAS ESTACIONES DE POLICÍA BARRIOS UNIDOS, FONTIBÓN Y AEROPUERTO | P136-UTMTO-01201-2020 | INTERVENTORÍA | UT SMVC |
| 831 | 27/07/2020 | 17-07-2020- NOVEDADES CAMARAS | P136-MEBOG-01202-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |
| 832 | 27/07/2020 | SOLICITUD DEACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PUNTO DEVIGILANCIA AL1278 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ALCALDÍAS. | P136-MEBOG-01203-2020 | INTERVENTORÍA | METROPOLITANA DE BOGOTÁ |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------|---------------|---|
| 833 | 27/07/2020 | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS CONFIGURACIÓN EQUIPO PROCERA | P136-SSCJ-01206-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 834 | 27/07/2020 | 17-07-2020- NOVEDADES CAMARAS | P136-MEBOG-01202-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 835 | 27/07/2020 | SOLICITUD DEACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PUNTO DEVIDEOVIGILANCIA AL1278 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ALCALDÍAS. | P136-MEBOG-01203-2020 | INTERVENTORÍA | MEBOG |
| 836 | 27/07/2020 | PERMISOS DE INGRESO C4 Y DATACENTER BOMBEROS CONFIGURACIÓN EQUIPO PROCERA | P136-SSCJ-01206-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 837 | 27/07/2020 | PAC MENSUAL JULIO- ACTAS HASTA EL 24 DE JULIO | CSS-P136-0354-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 838 | 28/07/2020 | ENVIÓ DE INFORMACIÓN DE LAS ACTAS REALIZADAS EN CAMPO DE LOS POSTES DE CÁMARA ENTREGADOS EN CUSTODIA A LOS CONTRATISTAS DEL IDU | P136-SSCJ-01209-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 839 | 28/07/2020 | ENVIÓ DE INFORMACIÓN DE LAS ACTAS REALIZADAS EN CAMPO DE LOS POSTES DE CÁMARA ENTREGADOS EN CUSTODIA A LOS CONTRATISTAS DEL IDU | P136-SSCJ-01209-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 840 | 29/07/2020 | PAC MENSUAL JULIO - ACTAS HASTA EL 28 DE JULIO | CSS-P136-0355-2020-REC | UT SMVC | INTERVENTORÍA |
| 841 | 30/07/2020 | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN NUMERAL 6 – YEFFER YESID VEGA BOBADILLA CONCEJAL DE BOGOTÁ. | CSS-P136-00212-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 842 | 30/07/2020 | RESPUESTA A LOS COMUNICADOS: - S-2020-233302/SUBCO-CAD 1.10 – SOLICITUD BLOQUEAR E IMPEDIR EL ACCESO A SITIOS Y PAGINAS WEB DE INTERNET. - S-2020-235433/SUBCO-CAD 1.10 – SOLICITUD SERVICIO WEB DE ARCGIS MAPAS CÁMARAS EN CADA PUESTO DE TRABAJO. | CSS-P136-00213-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 843 | 30/07/2020 | RESPUESTA AL COMUNICADO: S-2020-235439/SUBCO-CAD 1.10 – SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. | CSS-P136-00214-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | |
|-----|------------|---|---------------------|---------------|---|
| 844 | 30/07/2020 | RESPUESTA AL COMUNICADO: S-2020-235455/SUBCO-CAD 1.10 – SOLICITUD AVANCE DE ACTUALIZACIÓN SALA DE VIDEO DE CHAPINERO | CSS-P136-00215-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 845 | 30/07/2020 | RESPUESTA A LOS COMUNICADOS:- S-2020-235422/SUBCO-CAD1.10 – SOLICITUD ARREGLO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DATA CENTER. - S-2020-235470/SUBCO-CAD1.10 – SOLICITUD TRASLADO TRANSFORMADOR SALA DE VIDEO PUENTE ARANDA. | CSS-P136-00216-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 846 | 30/07/2020 | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN NUMERAL 6 – YEFFER YESID VEGA BOBADILLA CONCEJAL DE BOGOTÁ. | CSS-P136-00212-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 847 | 30/07/2020 | RESPUESTA A LOS COMUNICADOS: - S-2020-233302/SUBCO-CAD 1.10 – SOLICITUD BLOQUEAR E IMPEDIR EL ACCESO A SITIOS Y PAGINAS WEB DE INTERNET. - S-2020-235433/SUBCO-CAD 1.10 – SOLICITUD SERVICIO WEB DE ARCGIS MAPAS CÁMARAS EN CADA PUESTO DE TRABAJO. | CSS-P136-00213-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 848 | 30/07/2020 | RESPUESTA AL COMUNICADO: S-2020-235439/SUBCO-CAD 1.10 – SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. | CSS-P136-00214-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 849 | 30/07/2020 | RESPUESTA AL COMUNICADO: S-2020-235455/SUBCO-CAD 1.10 – SOLICITUD AVANCE DE ACTUALIZACIÓN SALA DE VIDEO DE CHAPINERO | CSS-P136-00215-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |
| 850 | 30/07/2020 | RESPUESTA A LOS COMUNICADOS: - S-2020-235422/SUBCO-CAD1.10 – SOLICITUD ARREGLO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DATA CENTER. - S-2020-235470/SUBCO-CAD1.10 – SOLICITUD TRASLADO TRANSFORMADOR SALA DE VIDEO PUENTE ARANDA. | CSS-P136-00216-2020 | INTERVENTORÍA | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C |

Tabla 170. Comunicaciones

7.3 ESTADO GENERAL FINANCIERO

| MODIFICACION No 02 CONTRATO 780 DE 2019 MANTENIMIENTO | | | |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|
| PRORROGA | 3 MESES | FECHA FINAL | 6/07/2020 |
| ADICION | \$ 3.981.419.108 | VALOR TOTAL | \$13.981.419.108 |

Tabla 171. Adicion No 2 Contrato No 780 de 2019

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| MODIFICACION No 03 CONTRATO 780 DE 2019 MANTENIMIENTO | | | |
|---|---------|-------------|------------------|
| PRORROGA | 24 DIAS | FECHA FINAL | 30/07/2020 |
| ADICION | \$ 0 | VALOR TOTAL | \$13.981.419.108 |

Tabla 172. Adicion No3 Contrato No 780 de 2019

| DESCRIPCIÓN | (\$) | (%) |
|---|-------------------------|------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO | \$10.000.000.000 | 72% |
| VALOR ADICION 1 | \$ 3.981.419.108 | 28% |
| VALOR TOTAL CONTRATO | \$13.981.419.108 | 100% |
| VALOR FACTURADO | \$12.957.551.633 | 93% |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$1.023.867.475 | 7% |

Tabla 173. Información financiera del Contrato No. 780 de 2019

Se informa que desde el 1 de abril de 2019 (facturación aprobada 1), hasta el 6 de septiembre de 2019 (facturación aprobada 5), los ANS fueron revisados y aprobados por Consorcio Seguridad Capital y a partir del 7 de septiembre de 2019 a la fecha se realiza esta actividad desde el Consorcio Smarty Scain-2019.

A la fecha del presente informe se han aplicado ANS por un valor acumulado de **\$73.476.390**, los cuales se detallan en la tabla 172 ANS aplicados.

| DESCRIPCIÓN | VALOR INCLUIDO IVA 19% | SERVICIOS | EQUIPOS Y/O MATERIALES | DESCUENTOS ANS |
|--|------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| FACTURACION APROBADA 1 - INTERVENTORÍA ACTA No. 025 | \$ 2,860,200 | \$ 2,177,200 | \$ 683,000 | \$ - |
| FACTURACION APROBADA. 2 INTERVENTORÍA ACTA No. 026 | \$ 122,495,485 | \$122,230,285 | \$ 265,200 | \$ - |
| FACTURACION APROBADA 3 - INTERVENTORÍA ACTA No. 29 | \$ 341,840,219 | \$216,430,519 | \$ 131,115,200 | \$ 5,705,500 |
| FACTURACION APROBADA. 4 - INTERVENTORÍA ACTA No. 35 | \$ 519,301,515 | \$433,653,935 | \$ 87,061,500 | \$ 1,413,920 |
| FACTURACION APROBADA 5 - INTERVENTORÍA ACTA No. 39 | \$ 610,126,487 | \$519,155,287 | \$ 90,971,200 | \$ - |
| FACTURACION APROBADA. 6 - INTERVENTORÍA ACTA No. 10 | \$ 299,463,642 | \$234,616,662 | * \$ 66,216,300 | \$ 1,369,320 |
| FACTURACION APROBADA. 7 - INTERVENTORÍA ACTA No. 18 | \$1,027,038,785 | \$718,740,375 | \$ 378,280,340 | \$ 3,765,630 |
| FACTURACION APROBADA 8 - INTERVENTORÍA ACTA No. 31 | \$ 797,283,324 | \$630,941,422 | \$ 176,840,022 | \$ 10,498,120 |
| FACTURACION APROBADA - INTERVENTORÍA ACTA No. 46 | \$1,032,398,169 | \$605,060,495 | \$ 432,700,844 | \$ 5,363,170 |
| FACTURACION APROBADA 8 ESTACIONES DE POLICÍA ACTA No. 47 | \$1,000,297,550 | \$187,422,900 | \$ 812,874,650 | \$ - |
| FACTURACION APROBADA 10 - INTERVENTORÍA ACTA No. 54 | \$ 481,074,404 | \$320,641,434 | \$ 166,768,080 | \$ 6,335,110 |
| FACTURACION APROBADA 8 ESTACIONES DE POLICÍA ACTA No. 55 | \$ 999,937,573 | \$190,851,500 | \$ 809,086,076 | \$ - |
| FACTURACION APROBADA 11 - INTERVENTORÍA ACTA No. 64 | \$ 573,099,956 | \$ 519,434,486 | \$ 68,043,330 | \$14,377,860 |
| FACTURACION APROBADA 8 ESTACIONES DE POLICÍA ACTA No. | \$ 999,533,854 | - | - | - |
| FACTURACION APROBADA 12 - INTERVENTORÍA ACTA No. 73 | \$ 647,067,542 | \$551,842,432 | \$ 104,924,460 | \$ 9,699,350 |
| FACTURACION APROBADA 13 - INTERVENTORÍA ACTA No. 86 | \$ 484,111,285 | \$ 478,287,820 | \$ 12,441,845 | \$ 6,618,380 |
| FACTURACION APROBADA 14 - INTERVENTORÍA ACTA No. 101 | \$ 1,510,236,964 | \$1,027,843,444 | \$ 485,246,270 | \$ 2,852,750 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| DESCRIPCIÓN | VALOR INCLUIDO IVA 19% | SERVICIOS | EQUIPOS Y/O MATERIALES | DESCUENTOS ANS |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| FACTURACION APROBADA 15 - INTERVENTORÍA ACTA No. 114 | \$ 1,509,384,679 | \$1,238,449,565 | \$ 276,412,394 | \$ 5,477,280 |
| TOTAL, FACTURADO A LA FECHA | \$12,957,551,633 | \$7,997,779,761 | \$4,033,714,408 | \$73,476,390 |

Tabla 174. ANS Aplicados.

* Los materiales aprobados para pago en la factura del mes de septiembre de 2019, por un valor de sesenta y seis millones doscientos dieciséis mil trescientos pesos moneda corriente (\$ 66.216.300), aprobados mediante el acta No. 10 de Interventoría, no fueron agregados a dicha factura, a consecuencia de esto el valor de los materiales fue facturado en la factura de noviembre de 2019.

Los ANS correspondientes al mes de julio de 2020 serán relacionados en el informe final del contrato 780 de 2019, esto a consecuencia que el proceso de facturación correspondiente a este mes se encuentra en etapa de conciliación.

7.4 SEGUIMIENTO JURÍDICO

La presente relación da cuenta del estado legal del contrato al 30 de julio de 2020.

| INFORMACIÓN CONTRACTUAL | |
|-------------------------|--|
| No. CONTRATO | 780 |
| TIPO DE CONTRATO | MANTENIMIENTO |
| NOMBRE CONTRATISTA | UNIÓN SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA2019 |
| FECHA DE CONTRATO | 15-MAR-19 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 02-ABR-19 |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 13.981.419.108 |
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C. CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE RECURSOS. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 15 MESES Y 5 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| PRÓRROGAS | Prroroga 1: DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS Prroroga 2: TRES (3) MESES Prroroga 3: VEINTE Y CUATRO 24 DIAS |
| ADICIONES | Adición 1: \$865.599.859 Adición 2: 1.047.624.354 Valor total: 3.721.092.166 |
| ESTADO JURÍDICO | EN LIQUIDACIÓN |

Tabla 175. Información contractual mantenimiento.

A la fecha de elaboración del presente informe, se encuentra en trámite todo el proceso para realizar la liquidación del contrato.

7.4.1 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS

En atención a la verificación del cumplimiento de la obligación contractual señalada en la cláusula séptima, literal c en su numeral 5 del contrato de interventoría No. 1020 de 2019, que prescribe:

“(...) 5). Verificar durante la vigencia de los proyectos, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en los contratos. (...)”

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

La interventoría procedió con la validación jurídica de cada una de las garantías exigidas a los contratistas en el marco de cada uno de los contratos tal como se describe en el capítulo del respectivo contrato, identificando que los amparos constituidos en cada una de las pólizas se ajustan a los términos y condiciones establecidos contractualmente, como en lo contemplado en el libro 2 parte 2 título 1 capítulo 2 de la sección 3 del Decreto 1082 de 2015, así:

| Tipo de póliza | Requerimiento | Numero de póliza | Desde | hasta | valor | Verificación |
|--|---|------------------|------------|---|---------------------|--------------|
| Cumplimiento | El valor asegurado debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el término de ejecución del mismo y seis (6) meses más. Este amparo debe constituirse a partir de la fecha de suscripción del contrato y debe garantizar el cumplimiento del contrato, el pago de la cláusula penal y de las multas. | 15-44-101210289 | 26/03/2019 | 30/01/2021 | \$2.796.283.821,60 | CUMPLE |
| Calidad del servicio | de equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente a partir del momento que se produzca la terminación del contrato y seis (6) meses más | 15-44-101210289 | 27/01/2020 | NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA PARA LOS AMPAROS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES ES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE PRODUZCA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO. | \$ 2.796.283.821,60 | CUMPLE |
| Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | El valor asegurado debe ser equivalente al 5% total del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y tres (3) años más | 15-44-101210289 | 26/03/2019 | 30/07/2023 | \$ 699.070.955,40 | CUMPLE |
| Calidad y funcionamiento de los bienes | El cual deberá establecerse por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, vigente a partir del momento que se produzca la terminación del contrato y seis (6) meses más. | 15-44-101210289 | 27/01/2020 | NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA PARA LOS AMPAROS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES ES DE SEIS (6) MESES CONTADOS | \$ 699.070.955,40 | CUMPLE |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| Tipo de póliza | Requerimiento | Numero de póliza | Desde | hasta | valor | Verificación |
|---|---|------------------|------------|---|-------------------|--------------|
| | | | | A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE PRODUZCA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual: | equivalente al cinco (5%) del valor del contrato derivado del presente proceso de selección, vigente por el término de ejecución del contrato | 15-40-101057314 | 26/03/2019 | 30/07/2020 | \$ 699.070.955,40 | CUMPLE |

Tabla 176. Pólizas – UT Servicios Mnto Vigilancia Ciudadana 2019.

7.5 SEGUIMIENTO TÉCNICO

A continuación, se presenta el estado de las cámaras del sistema de videovigilancia con corte al 30 de julio de 2020, así:

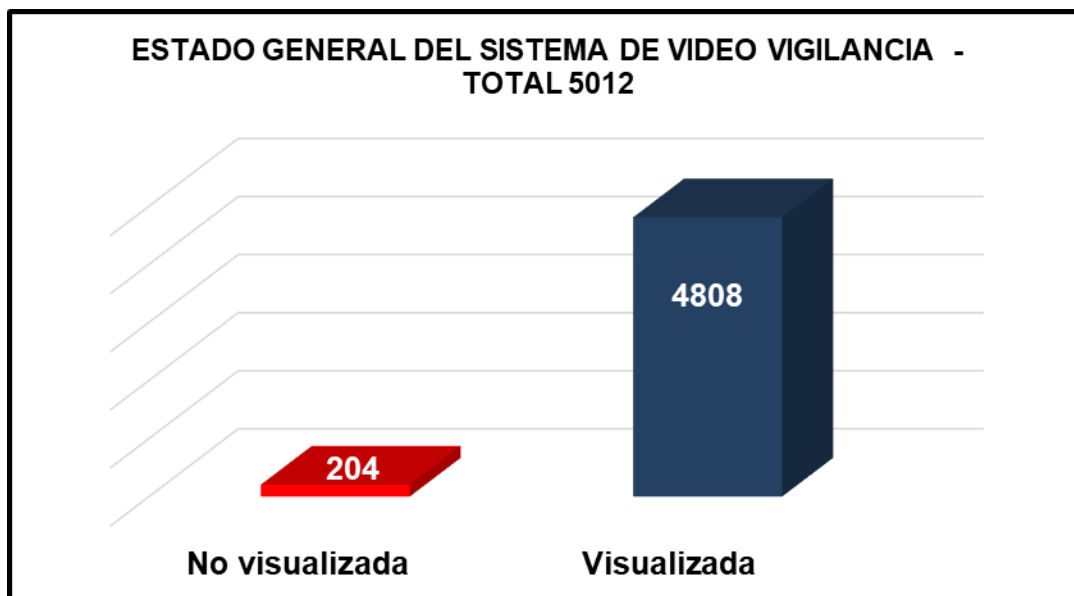


Ilustración 15. Estado General Del Sistema De Video Vigilancia

Conforme a lo anterior y en relación con la fecha de corte del presente informe, se evidencia que, de un total **5012** puntos de videovigilancia, **4808** de ellos se configuran como operativos, representando con ello una disponibilidad del **95.93%** del sistema de videovigilancia de Bogotá DC.

Es importante aclarar, que las fallas presentadas en los **204** puntos de videovigilancia no visualizados, son atribuibles a terceros, como a contratistas y entidades que intervienen para su correcto funcionamiento (ETB, CODENSA, UT SMVC, IDU, SED, TRANSMILENIO y SDSCJ) con lo cual, en la tabla 175, se presentan por cada proyecto las fallas presentadas:

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| ESTADO | ETB | SED | CODENSA | UT SMVC | IDU | SDSCJ | SEGURITECH | TRANSMILENIO | CTP | TOTAL |
|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|----------|------------|
| COLEGIOS | - | 64 | - | - | 1 | - | - | - | - | 65 |
| FONDO VIGILANCIA | 2 | - | 6 | 8 | 2 | - | - | - | - | 18 |
| PROYECTO 350 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| TRANSMILENIO | - | - | - | 11 | -- | 7 | - | 12 | - | 30 |
| PROYECTO ESU | 9 | - | - | 5 | 4 | 6 | - | - | 6 | 30 |
| PROYECTO 732 | 2 | - | 1 | 31 | 4 | - | - | - | - | 38 |
| ALCALDÍAS | 1 | - | - | 18 | 2 | - | 1 | - | - | 22 |
| TOTAL | 14 | 64 | 7 | 73 | 14 | 13 | 1 | 12 | 6 | 204 |

Tabla 177. Fallas presentadas por proyecto.

Teniendo en cuenta que existen puntos de video vigilancia con fallas atribuidas a terceros, se presenta el estado del sistema excluyendo **110** puntos de videovigilancia con fallas o novedades atribuibles a terceros.

De acuerdo con lo anterior se tiene un total de **110** puntos atribuidos a terceros, quedando un total de **4902** puntos de video vigilancia reportados en el presente estado del sistema.

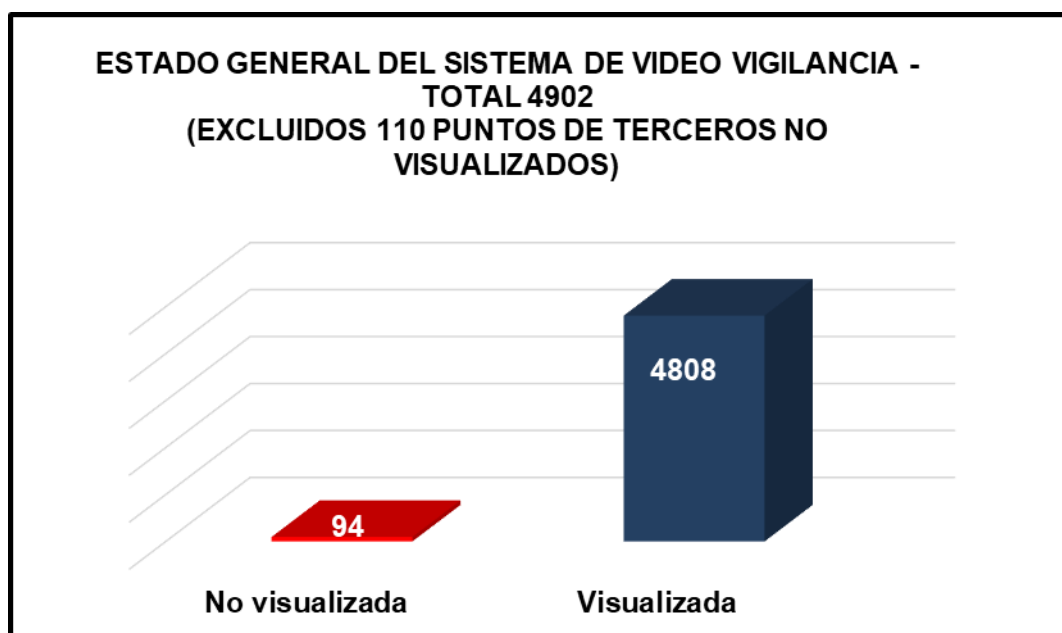


Ilustración 16. Estado general del sistema de videovigilancia excluyendo terceros.

A continuación, se cuantifican los puntos que presentan fallas atribuidas a IDU, SEGURITECH, CTP, SDSCJ, TRANSMILENIO y SED.

| ESTADO | SED | IDU | SDSCJ | SEGURITECH | TRANSMILENIO | CTP | TOTAL |
|----------------|-----|-----|-------|------------|--------------|-----|-------|
| NO VISUALIZADA | 64 | 14 | 13 | 1 | 12 | 6 | 110 |

Tabla 178. Cuantificación de puntos que presentan fallas atribuidas a terceros.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

En la tabla 179. *Estado por Localidad* se presenta el estado del del sistema de videovigilancia por cada una de las diecinueve (19) localidades de Bogotá D.C., a corte del 30 de julio de 2020. (Visualización con novedad, No Visualizada y Visualizada).

| Localidad | Visualizada | Visualizada con Novedad | No Visualizada | % Visualizadas | %Con Novedad | % No Visualizada | Total, general |
|--------------------|-------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|
| Santa Fe | 223 | 2 | 24 | 89.56% | 0.80% | 9.64% | 249 |
| Los Mártires | 175 | 3 | 17 | 89.74% | 1.54% | 8.72% | 195 |
| Puente Aranda | 281 | 1 | 25 | 91.53% | 0.33% | 8.14% | 307 |
| Bosa | 396 | 6 | 22 | 93.40% | 1.42% | 5.19% | 424 |
| Suba | 421 | 2 | 20 | 95.03% | 0.45% | 4.51% | 443 |
| Tunjuelito | 129 | 4 | 5 | 93.48% | 2.90% | 3.62% | 138 |
| Chapinero | 215 | 1 | 8 | 95.98% | 0.45% | 3.57% | 224 |
| Ciudad Bolívar | 400 | 16 | 15 | 92.81% | 3.71% | 3.48% | 431 |
| Fontibón | 167 | 4 | 6 | 94.35% | 2.26% | 3.39% | 177 |
| Kennedy | 380 | 37 | 14 | 88.17% | 8.58% | 3.25% | 431 |
| Antonio Nariño | 124 | 4 | 4 | 93.94% | 3.03% | 3.03% | 132 |
| Usme | 227 | - | 7 | 97.01% | 0.00% | 2.99% | 234 |
| Barrios Unidos | 123 | 7 | 4 | 91.79% | 5.22% | 2.99% | 134 |
| Engativá | 376 | 3 | 11 | 96.41% | 0.77% | 2.82% | 390 |
| Usaquén | 170 | 11 | 5 | 91.40% | 5.91% | 2.69% | 186 |
| Rafael Uribe Uribe | 267 | 7 | 6 | 95.36% | 2.50% | 2.14% | 280 |
| Teusaquillo | 240 | 5 | 5 | 96.00% | 2.00% | 2.00% | 250 |
| San Cristóbal | 292 | 11 | 6 | 94.50% | 3.56% | 1.94% | 309 |
| La Candelaria | 76 | 2 | - | 97.44% | 2.56% | 0.00% | 78 |

Tabla 179. Estado por Localidad

A continuación, se presenta las tres (3) localidades que presentan el porcentaje más alto de fallas registradas en el mes de julio de 2020.



Ilustración 17. Estado del sistema Santa Fé.



Ilustración 18. Estado del sistema Los Mártires.

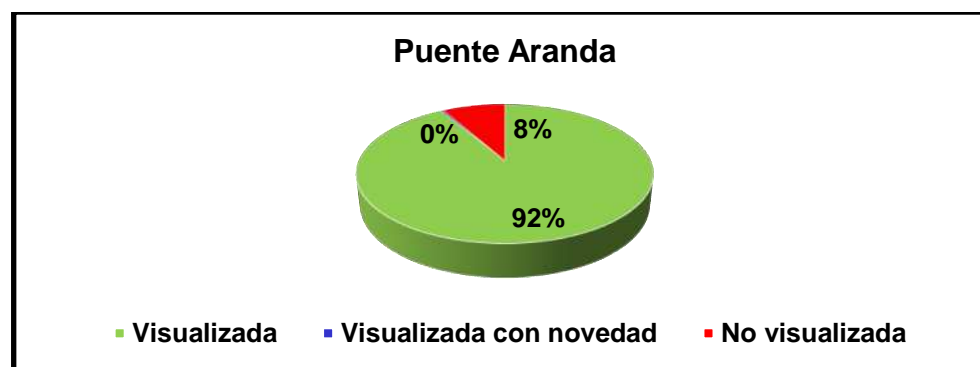


Ilustración 19. Estado del sistema Puente Aranda

Así mismo, se presenta el estado del sistema de videovigilancia por cada semana del mes de julio de 2020.

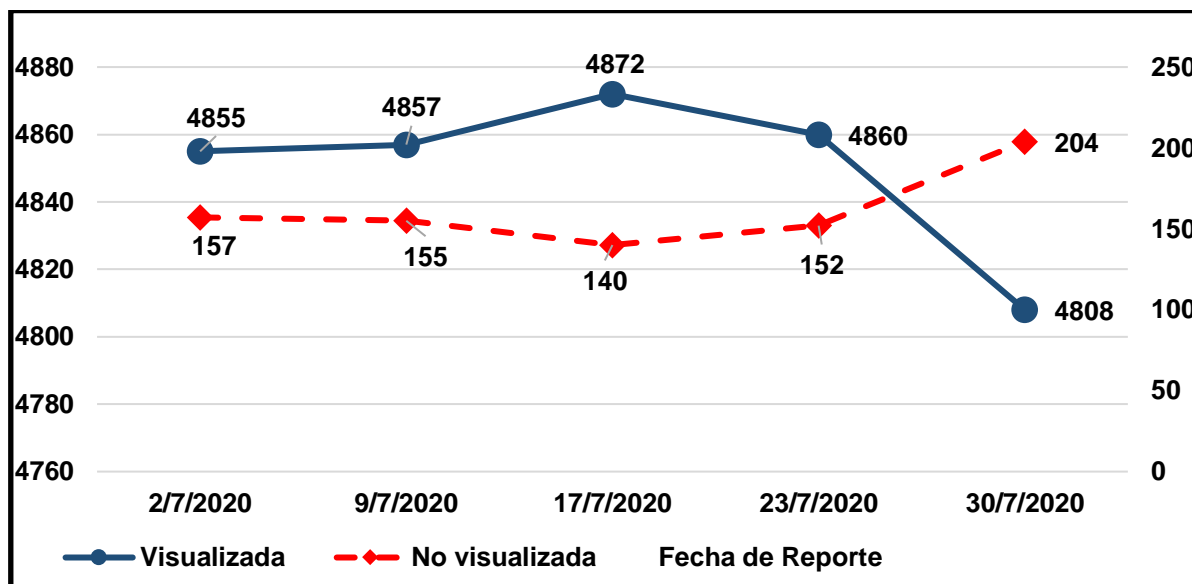


Ilustración 20. Estado del sistema por semanas

7.5.1 ESTADO DEL SISTEMA EN CENTROS DE MONITOREO

Se realiza actualización de la información referente a las localidades a las cuales pertenecen cada punto de cámara. A raíz de esto se presentan diferencias en las cantidades por localidad presentadas en el informe correspondiente al mes de junio de 2020. Dicha modificación obedece a los cambios solicitados por funcionario de la SDSCJ Pedro Sierra en el C4.

| No | CODIGO NUEVO | COD_OAIE E | COD_SSCJ | CAMARA | PROYECTO | LOCALIDAD INICIAL | LOCALIDAD FINAL | SALA DE MONITOREO |
|----|--------------|------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 3630 | 06042-2522 | SCJ17FJ0023 | CL 58A SUR KR 24 | PROYECTO 732 | Ciudad Bolívar | Tunjuelito | Ciudad Bolívar |
| 2 | 5909 | 08045-2126 | SCJ17E160036 | AK 68 DG 35A SUR | PROYECTO 732 | Puente Aranda | Kennedy | Kennedy |
| 3 | 5910 | 08044-2109 | SCJ17E160038 | AK 68 CL 1 | PROYECTO 732 | Puente Aranda | Kennedy | Kennedy |
| 4 | 0721 | 02099-2608 | SCJ18ESP00027 | KR 8A CL 41A | PROYECTO 732 | Teusaquillo | Chapinero | Chapinero |
| 5 | 1633 | 12021-2606 | SCJ18ESP00002 | AV NQS CL 90 | PROYECTO 732 | Suba | Barrios Unidos | Barrios Unidos |
| 6 | 7598 | 14102-2612 | SCJ18ESP00039 | KR 25 CL 22A | PROYECTO 732 | Santa Fe | Los Mártires | Puente Aranda |
| 7 | 8130 | 15038-1653 | SCJ17E150079 | KR 34F CL 38 BIS SUR | PROYECTO 732 | Puente Aranda | Antonio Nariño | Puente Aranda |
| 8 | 2550 | 04033-2022 | SCJ17E150002 | CL 4 SUR KR 10 | PROYECTO 732 | Antonio Nariño | San Cristóbal | Ciudad Bolívar |
| 9 | 2808 | 04033-2834 | SCJ18E150002 | KR 10 CL 1 | PROYECTO 732 | Antonio Nariño | San Cristóbal | Ciudad Bolívar |
| 10 | 3642 | 16041-2605 | SCJ18E150001 | AUTO SUR KR 50 | PROYECTO 732 | Antonio Nariño | Tunjuelito | Ciudad Bolívar |

Tabla 180. Actualización de puntos de videovigilancia por localidades

A continuación, se cuantifican el estado de los puntos de videovigilancia que se monitorean en cada uno de los centros de monitoreo.

Centro de monitoreo – Chapinero

En el centro de monitoreo de Chapinero se visualizan las localidades de E-1 Usaquéen (**186** cámaras) y E-2 Chapinero (**224** cámaras), para un total de **410** puntos de videovigilancia; del total de estas se encuentra que hay **397** cámaras visualizadas y **13** cámaras sin visualización, en la tabla 181 se cuantifica el estado de responsabilidad de los puntos no visualizados. En el mes de julio se actualizaron códigos de cámara

| PROYECTO | SED | CODENSA | UT SMVC | IDU | TOTAL |
|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| COLEGIOS | 4 | - | - | - | 4 |
| FONDO VIGILANCIA | - | 4 | 1 | 1 | 6 |
| TRANSMILENIO | - | - | 1 | - | 1 |
| PROYECTO 732 | - | - | 2 | - | 2 |
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 |

Tabla 181. Puntos No visualizados - Centro de Monitoreo Chapinero

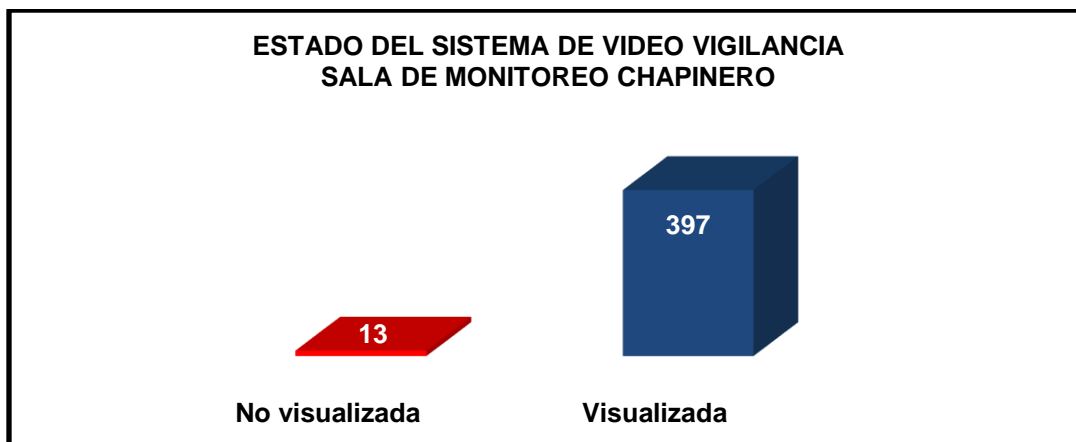


Ilustración 21. Estado del sistema de videovigilancia – Centro de Monitoreo Chapinero

Centro de monitoreo – Ciudad Bolívar

En el centro de monitoreo de Ciudad Bolívar se visualizan las localidades de E-4 San Cristóbal (309 cámaras), E-5 Usme (234 cámaras), E-6 Tunjuelito (138 cámaras), E-18 Rafael Uribe Uribe(280 cámaras) y E-19 Ciudad Bolívar (431 cámaras), para un total de 1392 puntos de videovigilancia; del total de estas se encuentra que hay 1353 cámaras visualizadas y 39 cámaras sin visualización, en la tabla 182 se cuantifica el estado de responsabilidad de los puntos no visualizados.

| PROYECTO | ETB | SED | UT SMVC | IDU | TOTAL |
|--------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| COLEGIOS | - | 20 | - | - | 20 |
| PROYECTO 350 | - | - | - | 1 | 1 |
| PROYECTO ESU | 3 | - | 1 | 1 | 5 |
| PROYECTO 732 | - | - | 8 | - | 8 |
| ALCALDÍAS | - | - | 5 | - | 5 |
| TOTAL | 3 | 20 | 14 | 2 | 39 |

Tabla 182. Puntos No visualizados – Centro de Monitoreo Ciudad Bolívar

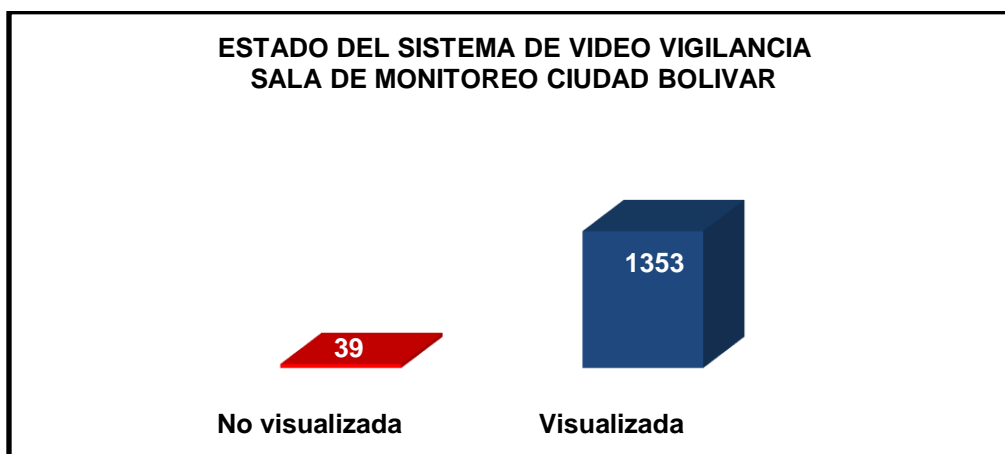


Ilustración 22. Estado del sistema de videovigilancia – Centro de Monitoreo Ciudad Bolívar

Centro de monitoreo – Kennedy

En el centro de monitoreo de Kennedy se visualizan las localidades de E-7 Bosa (**424** cámaras y E-8 Kennedy (**431** cámaras), para un total de **855** puntos de videovigilancia; se encuentra que hay **819** cámaras visualizadas y **36** cámaras sin visualización, en la tabla 183 se cuantifica el estado de responsabilidad de los puntos no visualizados.

| PROYECTO | SED | UT SMVC | IDU | SEGURITECH | TOTAL |
|------------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|
| COLEGIOS | 18 | - | 1 | - | 19 |
| FONDO VIGILANCIA | - | 1 | 1 | - | 2 |
| PROYECTO ESU | - | 2 | 1 | - | 3 |
| PROYECTO 732 | - | 4 | 1 | - | 5 |
| ALCALDÍAS | - | 4 | 2 | 1 | 7 |
| TOTAL | 18 | 11 | 6 | 1 | 36 |

Tabla 183. Puntos No visualizados - Centro de Monitoreo Kennedy

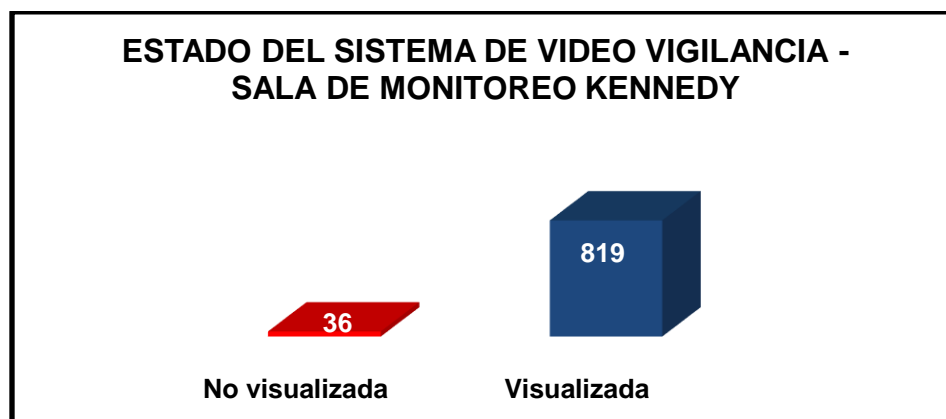


Ilustración 23. Estado del sistema de videovigilancia – Centro de monitoreo Kennedy

CENTRO DE MONITOREO – Puente Aranda

En el centro de monitoreo de Puente Aranda se visualizan las localidades de E-3 Santa Fé (**249** cámaras), E-14 Los Mártires (**195** cámaras), E-15 Antonio Nariño (**132** cámaras), E-16 Puente Aranda (**203** cámaras) y E-17 La Candelaria (**78** cámaras), para un total de **857** puntos de videovigilancia; se encuentra que hay **799** cámaras visualizadas y **58** cámaras sin visualización, en la tabla 184 se cuantifica el estado de responsabilidad de los puntos no visualizados. Se aclara que en la localidad de Puente Aranda se encuentra el subsistema Centro de Traslado por Protección (CTP), el cual cuenta con **104** cámaras distribuidas en sus instalaciones, las cuales se visualizan y graban de forma local, a consecuencia de esto estas cámaras, no se visualizan desde ningún centro de monitoreo, por lo tanto, estas cámaras no se relacionan en la tabla 184 Puntos No visualizados – Centro de Monitoreo Puente Aranda.

| PROYECTO | ETB | SED | CODENSA | UT SMVC | SDSCJ | TRANSMILENIO | TOTAL |
|------------------|-----|-----|---------|---------|-------|--------------|-----------|
| COLEGIOS | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| FONDO VIGILANCIA | - | - | 2 | 5 | - | - | 7 |
| TRANSMILENIO | - | - | - | 10 | 7 | 12 | 29 |
| PROYECTO ESU | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| PROYECTO 732 | 2 | - | - | 9 | - | - | 11 |
| ALCALDÍAS | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 |
| TOTAL | 5 | 3 | 2 | 29 | 7 | 12 | 58 |

Tabla 184. Puntos No visualizados – Centro de Monitoreo Puente Aranda

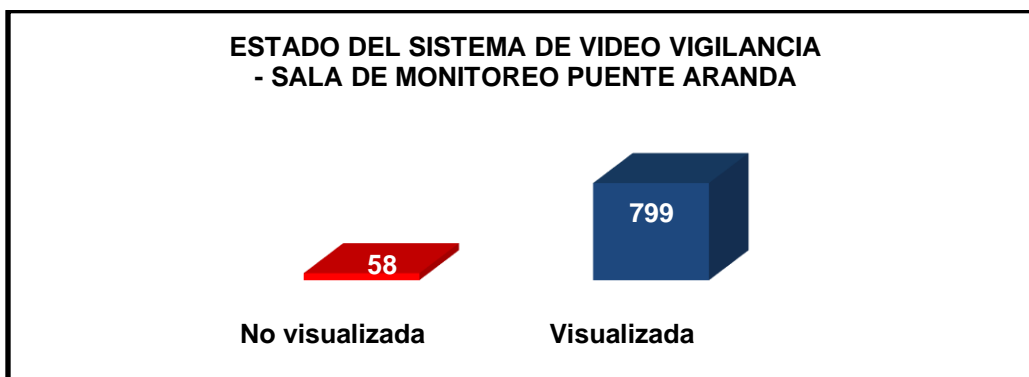


Ilustración 24. Estado del sistema de videovigilancia – Centro de Monitoreo Puente Aranda

CENTRO DE MONITOREO – BARRIOS UNIDOS

En el centro de monitoreo de Barrios Unidos se visualizan las localidades de E-11 Suba (**443** cámaras) y E-12 Barrios Unidos (**134** cámaras), para un total de **577** puntos de videovigilancia; se encuentra que hay **553** cámaras visualizadas y **24** cámaras sin visualización, en la tabla 185 se cuantifica el estado de responsabilidad de los puntos no visualizados.

| PROYECTO | ETB | SED | UT SMVC | IDU | TOTAL |
|------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| COLEGIOS | - | 13 | - | - | 13 |
| FONDO VIGILANCIA | 2 | - | - | - | 2 |
| PROYECTO ESU | 3 | - | - | - | 3 |
| PROYECTO 732 | - | - | 3 | 2 | 5 |
| ALCALDÍAS | - | - | 1 | - | 1 |
| TOTAL | 5 | 13 | 4 | 2 | 24 |

Tabla 185. Puntos No visualizados - Centro de Monitoreo Barrios Unidos

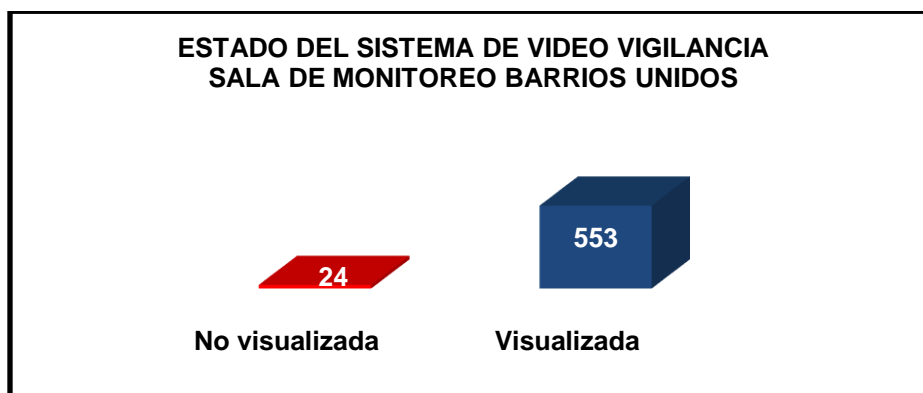


Ilustración 25. Estado Del Sistema De Videovigilancia – Centro de Monitoreo Barrios Unidos

CENTRO DE MONITOREO – ENGATIVÁ

En el centro de monitoreo de Engativá se visualizan las localidades de E-9 Fontibón (177 cámaras) y E-10 Engativá (390 cámaras), para un total de 567 puntos de videovigilancia; se encuentra que hay 550 cámaras visualizadas y 17 cámaras sin visualización, en la tabla 186 se cuantifica el estado de responsabilidad de los puntos no visualizados.

| PROYECTO | SED | CODENSA | UT SMVC | IDU | TOTAL |
|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| COLEGIOS | 6 | - | - | - | 6 |
| PROYECTO 732 | - | 1 | 4 | 1 | 6 |
| ALCALDÍAS | - | - | 5 | - | 5 |
| TOTAL | 6 | 1 | 9 | 1 | 17 |

Tabla 186. Puntos No visualizados - Centro De Monitoreo Engativá

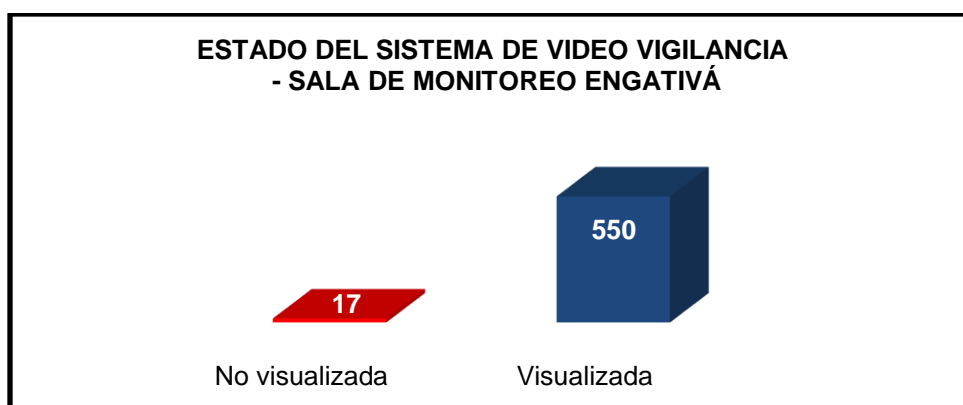


Ilustración 26. Estado Del Sistema De Videovigilancia – Centro de Monitoreo Engativá

CENTRO DE MONITOREO – TEUSAQUILLO

En el centro de monitoreo de Teusaquillo se visualiza la localidad de E-13 Teusaquillo (192 cámaras), para un total de 192 puntos de videovigilancia; se encuentra que hay 187 cámaras visualizadas y 5 cámaras sin visualización, en la tabla 187 se cuantifica el estado de responsabilidad de los puntos no visualizados. Se aclara que en la localidad de Teusaquillo se encuentra el subsistema Estadio, el cual cuenta con 58 cámaras distribuidas en sus instalaciones, las cuales se visualizan y graban de forma local, a consecuencia de lo anteriormente expresado estas cámaras, no se visualizan en ningún centro de monitoreo, por lo tanto, estas cámaras no se relacionan en la tabla 187 Puntos No visualizados – Centro de Monitoreo Teusaquillo.

| PROYECTO | ETB | UT SMVC | IDU | TOTAL |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| FONDO VIGILANCIA | - | 1 | - | 1 |
| PROYECTO ESU | 1 | - | 2 | 3 |
| PROYECTO 732 | - | 1 | - | 1 |
| TOTAL | 1 | 2 | 2 | 5 |

Tabla 187. Puntos No visualizados - Centro De Monitoreo Teusaquillo

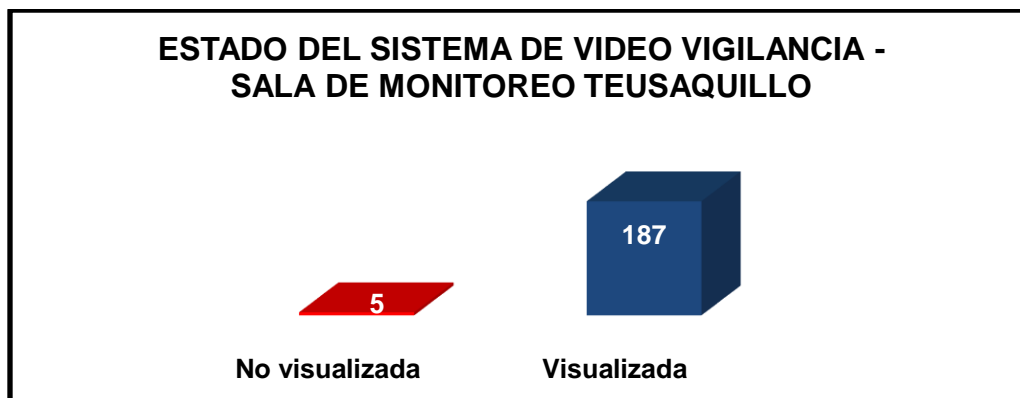


Ilustración 27. Estado Del Sistema De Videovigilancia – Centro de Monitoreo Teusaquillo

7.5.2 ACTIVIDADES C4

7.5.2.1 VISITA TÉCNICA DATACENTER (02/07/2020)

Siendo el día 2 de julio de 2020 a las 9:00 a.m., se reúnen los representantes de UT-SMVC, Consorcio Smarty Scain-2019, Interventoría NUSE-123, Bomberos y Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, con el fin de realizar visita técnica al Datacenter bomberos.

El objetivo de la visita es tener conocimiento técnico de la infraestructura que se tiene instalada en el Datacenter y que atiende a los sistemas de videovigilancia, NUSE123 y Radios. Se inicia la visita con la verificación en cuanto a la infraestructura eléctrica la cual comprende UPS, planta eléctrica y tableros de distribución. De igual forma se verifican los aires acondicionados.

Al respecto se tienen las siguientes observaciones:

- ✓ Se recomienda generar un diagrama Unifilar, donde se identifiquen las acometidas eléctricas que operan desde la entrada de CODENSA hasta las UPS y Planta Eléctrica.
- ✓ Se recomienda generar un estudio de cargas eléctricas que llegan y salen de las UPS que interconectan el Datacenter.
- ✓ Se recomienda generar un diagrama unifilar, donde se identifiquen y marquillen las acometidas eléctricas de punto a punto que salen desde las UPS hasta los tableros de distribución (PDU) de cada uno de los Rack que operan dentro del Datacenter. Esto en base a que el personal que generó el acompañamiento desconoce esta información.
- ✓ Se recomienda generar validaciones sobre la operatividad de las transferencias de Planta eléctrica.
- ✓ Se recomienda generar la reparación del aire acondicionado que no se encuentra operando dentro del Datacenter, en la actualidad solo opera con un aire de los dos existentes.

En cuanto a la operación del sistema de videovigilancia se verifica que el sistema opera de manera estable, sin embargo, se identifican algunas novedades las cuales se informan al

personal de UT SMVC que acompañan la visita para su atención. Dichas novedades se mencionan a continuación:

- ✓ Se identificó que en el Rack 20, operan servidores PIVOT-3. En la inspección realizada se identifica que un equipo presenta una alarma "testigo de alarma activo".
- ✓ Se identificó que en el Rack 20, opera un Switch JUNIPER EX455 "SAN", el cual se encuentra con una alarma "testigo de alarma activo".
- ✓ Se identificó que en el Rack 24, se deben validar las acometidas que generan la operación de las PDU "CTO-28-29-30 / FPC1 Y FPC2", ya que se identifica que no cuentan con testigo de conectividad operativa. De igual manera se aprovechó la visita realizada y se informó a los ingenieros administradores del Datacenter.
- ✓ Se identificó que en el Rack 29, operan los equipos de ISS- Inteligente Security System. En la inspección realizada se identifican dos equipos que cuentan con tarjetas de red sin operación (tarjeta #2). Los otros equipos cuentan con las tarjetas #2 sin tráfico o gestión de operación.

Se identificó que en el Rack 31, opera un Switch JUNIPER EX3400 "Admon", el cual se encuentra con una alarma "testigo de alarma activo".

7.5.2.2 ACTUALIZACIÓN CÓDIGOS CÁMARAS (03/07/2020)

Atendiendo la solicitud de Pedro Sierra, se realiza la actualización de códigos MEBOG para las cámaras que se relacionan a continuación

| CODIGO ANTERIOR | CODIGO NUEVO | COD_OAIEE | COD_SSCJ | CAMARA |
|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 3568 | 4181 | 18054-2387 | SCJ17E060050 | CL 51 SUR KR 11B |
| 1181 | 1549 | 12098-2526 | SCJ18ESP00003 | KR 20 CL 89A |
| 3628 | 4930 | 06042-2839 | SCJ18ESP00007_1 | CL 77 SUR KR 74B |
| 3632 | 4931 | 06042-2842 | SCJ17FJ0002 | CL 77 SUR KR 74B |
| 2041 | 8702 | 16109-1364-27 | ESU-227 | MOVILES- CL 6 KR 31 |

Tabla 188. Actualización Códigos Cámaras

Este cambio obedece a reubicaciones que se hicieron para estos puntos de cámara y es con el fin de mantener el orden numérico dentro de las localidades.

7.5.2.3 TOURS PROYECTO ALCALDÍAS (14/07/2020)

Se realiza verificación de las cámaras BOSCH reportadas con fallas en la configuración del tour, dicha revisión es efectuada por personal de Seguritech. Se realiza actualización de firmware y se configura el tour correctamente. Se encontraron 35 cámaras con novedad, 30 de las cuales quedan con el tour activo, para los 5 restantes se cuenta con la novedad que las cámaras fueron cambiadas por el contratista de mantenimiento, por lo cual, es de su competencia la corrección de la configuración del tour. Se verifican la totalidad de cámaras del proyecto Alcaldías que se visualizan en el centro de monitoreo de Kennedy correspondientes a 413 cámaras. Las 35 cámaras reportadas con novedad se encuentran en especial seguimiento por parte de Interventoría.

7.5.2.4 REVISIÓN CÁMARAS CENTROS COMERCIALES (18/07/2020)

Se realiza verificación de las cámaras de Centros Comerciales pertenecientes al proyecto de integración de terceros con el VMS ISS SECUROS del sistema de videovigilancia de Bogotá.

En resumen, se encontró lo siguiente:

| PROYECTO | No visualizada | Visualizada | Visualizada con novedad | Total general |
|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| Centros Comerciales | 44 | 110 | 48 | 202 |
| Total general | 44 | 110 | 48 | 202 |

Tabla 189. Estado Centros Comerciales

Se revisan 202 cámaras perimetrales que hacen parte de 59 Centros Comerciales. Pendiente por integrar las cámaras correspondientes al Centro Comercial Plaza Claro.

7.5.2.5 FALLA PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD (25/07/2020)

Se presenta falla en el sistema de videovigilancia de Bogotá afectándose la conectividad de 2014 cámaras, así como en los enlaces de los centros de monitoreo de Engativá, Ciudad Bolívar y Puente Aranda. La falla inicia sobre las 10:00 horas, ETB informa de falla en equipo CORE principal en la central de Chico la cual afecta el enrutamiento de servicios. ETB realiza cambios de configuración en los equipos afectados, se consigue normalización del tráfico de la red de videovigilancia a las 14:00 horas, sin embargo, la solución es temporal. A las 18:45 horas, realiza cambio de tarjetas sobre el equipo afectado generando afectación de aproximadamente 10 minutos en las salas de Teusaquillo y Barrios Unidos. A las 01:30 horas del 26 de julio de 2020, se realizan maniobras de reinicio en el equipo CORE lo que afecta la conectividad de 1045 cámaras, luego de los trabajos de ETB se logra estabilidad y normalización del sistema de videovigilancia hacia las 07:00 horas. Se confirma tráfico en el enlace principal de 13,5 Gbps.

7.6 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

7.6.1 SUBSISTEMAS

7.6.1.1 VISITA A COLEGIOS

Para el subsistema colegios, por parte de la interventoría se gestionó los permisos por parte del contratista de mantenimiento. Para el respectivo ingreso a cada una de las instituciones educativas que cuentan con cámaras de videovigilancia, y no se obtuvo una respuesta positiva por parte de la Secretaría de Educación, para realizar visitas técnicas. Es de aclarar que, durante el mes de julio de 2020, el contratista UT-SMVC, realizó mantenimientos preventivos a 2 Instituciones Educativas. (VER 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ANEXO INFORME DE JULIO\PREVEN COLEGIOS)

| No | INSTITUCION EDUCATIVA | LOCALIDAD | FECHA DE VISITA |
|----|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1 | SAN ISIDRO LABRADOR | CIUDAD BOLIVAR | 02/07/2020 |
| 2 | ANTONIO VILLAVICENCIO | ENGATIVÁ | 01/07/2020 |

Tabla 190. Mantenimientos preventivos a subsistema Colegios**7.6.1.2 VISITA A CAI'S**

Mediante la solicitud de atención a CAI emitida por la Policía Metropolitana de Bogota (MEBOG), se realizó el escalamiento para su respectiva atención por parte del contratista de mantenimiento UT SERVICIOS MNT0 VIGILANCIA CIUDADANA 2019 (UTSMVC), con el fin de poder establecer una solución a la falla presentada.

Durante el periodo de ejecución del 780 de 2019 contrato, el contratista de mantenimiento UT SERVICIOS MNT0 VIGILANCIA CIUDADANA 2019, realizó mantenimientos Correctivos a CAI. (VER 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ANEXO INFORME DE JULIO\CORREC CAI)

| FECHA DE VISITA MNT0 | CANTIDAD |
|----------------------|----------|
| 23/07/2020 | 1 |
| TOTAL | 1 |

Tabla 191. Visitas de mantenimiento correctivo subsistema CAI**7.6.1.3 VISITA A ESTADIO**

Durante el periodo objeto del presente informe, el contratista de mantenimiento UT SERVICIOS MNT0 VIGILANCIA CIUDADANA 2019, realizó visita de mantenimiento correctivo al Estadio Nemesio Camacho El Campín. (VER 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ANEXO INFORME DE JULIO\CORREC ESTADIO)

| FECHA DE VISITA MNT0 | CANTIDAD |
|----------------------|----------|
| 23/07/2020 | 1 |
| 25/07/2020 | 2 |
| TOTAL | 3 |

Tabla 192. Visitas de mantenimiento correctivo subsistema ESTADIO**7.6.1.4 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROYECTO TRANSMILENIO**

El detalle de las actividades ejecutadas a cada uno de los puntos objeto de mantenimiento correctivo se encuentra en el anexo correspondiente. (VER 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ANEXO INFORME DE JULIO\CORREC TRANSMILENIO). En la tabla 194, se puede apreciar la cuantificación de mantenimientos correctivos por día

| FECHA DE VISITA MNT0 | CANTIDAD |
|----------------------|----------|
| 01/07/2020 | 1 |
| 08/07/2020 | 1 |

| FECHA DE VISITA MNTO | CANTIDAD |
|----------------------|----------|
| 09/07/2020 | 1 |
| 10/07/2020 | 1 |
| 18/07/2020 | 1 |
| TOTAL | 5 |

Tabla 193. Mantenimientos correctivos diarios Trasmilenio

7.6.1.5 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROYECTO CTP

A la fecha 30 de julio 2020 al proyecto CTP, se realizó mantenimiento correctivo, por parte del contratista de mantenimiento UTSMVC. El detalle de las actividades ejecutadas a cada uno de los puntos objeto de mantenimiento correctivo se encuentra en el anexo correspondiente. (VER 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ANEXO INFORME DE JULIO\CORREC CTP).

| FECHA DE VISITA MNTO | CANTIDAD |
|----------------------|----------|
| 14/07/2020 | 1 |
| 20/07/2020 | 1 |
| 21/07/2020 | 1 |
| 22/07/2020 | 1 |
| 23/07/2020 | 1 |
| 25/07/2020 | 1 |
| TOTAL | 6 |

Tabla 194. Mantenimientos correctivo-diarios CTP.

7.6.1.6 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESTACIONES DE POLICÍA

A la fecha 30 de julio de 2020, al proyecto Estaciones de Policia, se realizó mantenimiento correctivo, por parte del contratista de mantenimiento UTSMVC. La información de la actividad realizada en cada fecha, se encuentra en el anexo (VER 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ANEXO INFORME DE JULIO\CORREC ESTACIONES DE POLICIA). En la tabla 195, se puede apreciar la cuantificación de los correctivos ejecutados en el mes de julio de 2020.

| FECHA DE VISITA MNTO | CANTIDAD |
|----------------------|----------|
| 01/07/2020 | 4 |
| 03/07/2020 | 2 |
| 10/07/2020 | 1 |
| 17/07/2020 | 1 |
| 18/07/2020 | 1 |
| TOTAL | 9 |

Tabla 195. Mantenimientos correctivo diarios Estaciones de Policia.

7.6.2 VISITAS DOMOS CIUDADANOS

Durante el periodo de ejecución del contrato 780 de 2019, el contratista de mantenimiento UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019, realizó en el mes de julio de 2020, mantenimientos correctivos a los puntos de videovigilancia.

7.6.2.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROYECTO FVS

El detalle de las actividades ejecutadas a cada uno de los puntos objeto de mantenimiento correctivo se encuentra en el anexo correspondiente. (VER 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ANEXO INFORME DE JULIO\CORREC FVS)

En la tabla 196. Se puede apreciar la cuantificación de mantenimientos correctivos por día.

| FECHA DE VISITA MNTO | CANTIDAD |
|-----------------------------|-----------------|
| 01/07/2020 | 1 |
| 02/07/2020 | 4 |
| 03/07/2020 | 3 |
| 04/07/2020 | 2 |
| 05/07/2020 | 1 |
| 07/07/2020 | 1 |
| 08/07/2020 | 1 |
| 09/07/2020 | 5 |
| 11/07/2020 | 1 |
| 14/07/2020 | 1 |
| 15/07/2020 | 1 |
| 16/07/2020 | 1 |
| 17/07/2020 | 1 |
| 25/07/2020 | 2 |
| 26/07/2020 | 1 |
| 27/07/2020 | 1 |
| 28/07/2020 | 1 |
| 29/07/2020 | 1 |
| TOTAL | 29 |

Tabla 196. Mantenimientos correctivos diarios proyecto FVS

7.6.2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROYECTO 350

El detalle de las actividades ejecutadas a cada uno de los puntos objeto de mantenimiento correctivo se encuentra en el anexo correspondiente (VER 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ANEXO INFORME DE JULIO\CORREC 350)

-

En la tabla 197, se puede apreciar la cuantificación de mantenimientos correctivos por día.

| FECHA DE VISITA MNTO | CANTIDAD |
|----------------------|-----------|
| 01/07/2020 | 2 |
| 02/07/2020 | 3 |
| 03/07/2020 | 3 |
| 04/07/2020 | 3 |
| 06/07/2020 | 1 |
| 07/07/2020 | 2 |
| 08/07/2020 | 1 |
| 09/07/2020 | 1 |
| 10/07/2020 | 2 |
| 11/07/2020 | 2 |
| 13/07/2020 | 1 |
| 15/07/2020 | 4 |
| 16/07/2020 | 5 |
| 17/07/2020 | 2 |
| 18/07/2020 | 2 |
| 19/07/2020 | 1 |
| 22/07/2020 | 2 |
| 23/07/2020 | 2 |
| 24/07/2020 | 1 |
| 27/07/2020 | 1 |
| 28/07/2020 | 1 |
| TOTAL | 42 |

Tabla 197. Mantenimientos correctivos diarios Proyecto 350**7.6.2.3 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROYECTO ESU**

El detalle de las actividades ejecutadas a cada uno de los puntos objeto de mantenimiento correctivo se encuentra en el anexo correspondiente. (VER 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ANEXO INFORME DE JULIO\CORREC ESU). En la tabla 198, se puede apreciar la cuantificación de mantenimientos correctivos por día.

| FECHA DE VISITA MNTO | CANTIDAD |
|----------------------|----------|
| 01/07/2020 | 1 |
| 02/07/2020 | 4 |
| 03/07/2020 | 1 |
| 04/07/2020 | 1 |
| 05/07/2020 | 1 |
| 06/07/2020 | 1 |
| 07/07/2020 | 3 |
| 08/07/2020 | 1 |
| 09/07/2020 | 2 |
| 10/07/2020 | 3 |
| 15/07/2020 | 3 |
| 16/07/2020 | 1 |
| 17/07/2020 | 2 |
| 18/07/2020 | 1 |
| 19/07/2020 | 1 |
| 21/07/2020 | 2 |
| 22/07/2020 | 2 |
| 23/07/2020 | 1 |

| FECHA DE VISITA MNTO | CANTIDAD |
|-------------------------|-----------|
| 24/07/2020 | 1 |
| 26/07/2020 | 1 |
| 27/07/2020 | 1 |
| 28/07/2020 | 1 |
| TOTAL | 35 |

Tabla 198. Mantenimientos correctivos diarios proyecto ESU

7.6.2.4 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROYECTO 732

El detalle de las actividades ejecutadas a cada uno de los puntos objeto de mantenimiento correctivo se encuentra en el anexo correspondiente (VER 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ANEXO INFORME DE JULIO\CORREC 732). En la tabla 199 se puede apreciar la cuantificación de mantenimientos correctivos por día.

| FECHA DE VISITA MNTO | CANTIDAD |
|-------------------------|------------|
| 01/07/2020 | 4 |
| 02/07/2020 | 4 |
| 03/07/2020 | 6 |
| 04/07/2020 | 2 |
| 05/07/2020 | 3 |
| 06/07/2020 | 7 |
| 07/07/2020 | 4 |
| 08/07/2020 | 7 |
| 09/07/2020 | 6 |
| 10/07/2020 | 5 |
| 11/07/2020 | 2 |
| 12/07/2020 | 4 |
| 13/07/2020 | 3 |
| 14/07/2020 | 10 |
| 15/07/2020 | 5 |
| 16/07/2020 | 5 |
| 17/07/2020 | 4 |
| 18/07/2020 | 9 |
| 19/07/2020 | 1 |
| 21/07/2020 | 3 |
| 22/07/2020 | 5 |
| 23/07/2020 | 6 |
| 24/07/2020 | 5 |
| 25/07/2020 | 3 |
| 27/07/2020 | 1 |
| 28/07/2020 | 3 |
| 29/07/2020 | 1 |
| 30/07/2020 | 2 |
| TOTAL | 120 |

Tabla 199. Mantenimientos correctivos diarios Proyecto 732

7.6.2.5 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROYECTO ALCALDÍAS

El detalle de las actividades ejecutadas a cada uno de los puntos objeto de mantenimiento correctivo se encuentra en el anexo correspondiente (VER 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ANEXO INFORME DE JULIO\CORREC ALCALDÍAS). En la tabla 200, se puede apreciar la cuantificación de mantenimientos correctivos por día

| FECHA DE VISITA MNTO | CANTIDAD |
|---------------------------------|-----------------|
| 01/07/2020 | 9 |
| 02/07/2020 | 9 |
| 03/07/2020 | 4 |
| 04/07/2020 | 5 |
| 05/07/2020 | 4 |
| 06/07/2020 | 3 |
| 07/07/2020 | 11 |
| 08/07/2020 | 10 |
| 09/07/2020 | 3 |
| 10/07/2020 | 5 |
| 11/07/2020 | 1 |
| 13/07/2020 | 6 |
| 14/07/2020 | 3 |
| 15/07/2020 | 1 |
| 16/07/2020 | 10 |
| 17/07/2020 | 10 |
| 18/07/2020 | 8 |
| 19/07/2020 | 4 |
| 21/07/2020 | 11 |
| 22/07/2020 | 14 |
| 23/07/2020 | 12 |
| 24/07/2020 | 11 |
| 25/07/2020 | 2 |
| 26/07/2020 | 2 |
| 27/07/2020 | 2 |
| 28/07/2020 | 1 |
| 29/07/2020 | 2 |
| TOTAL | 163 |

Tabla 200. Mantenimientos correctivos diarios proyecto alcaldías

7.6.3 GRÁFICAS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS

7.6.3.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS POR PROYECTO JULIO 2020

Durante el mes de julio de 2020, el UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA contratista CIUDADANA 2019, realizo las siguientes cantidades de servicios por proyecto:

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (PROYECTO) | 350 | ESU | FVS | CAI | CTP | TRANSMILENIO | ESTADIO | 732 | ALCALDÍAS | ESTACIONES DE POLICIA |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|---------|-----|-----------|-----------------------|
| 1-30 JULIO 2020 | 42 | 35 | 29 | 1 | 6 | 5 | 3 | 120 | 163 | 9 |

Tabla 201. Mantenimientos correctivos 1 al 30 julio de 2020 por proyecto

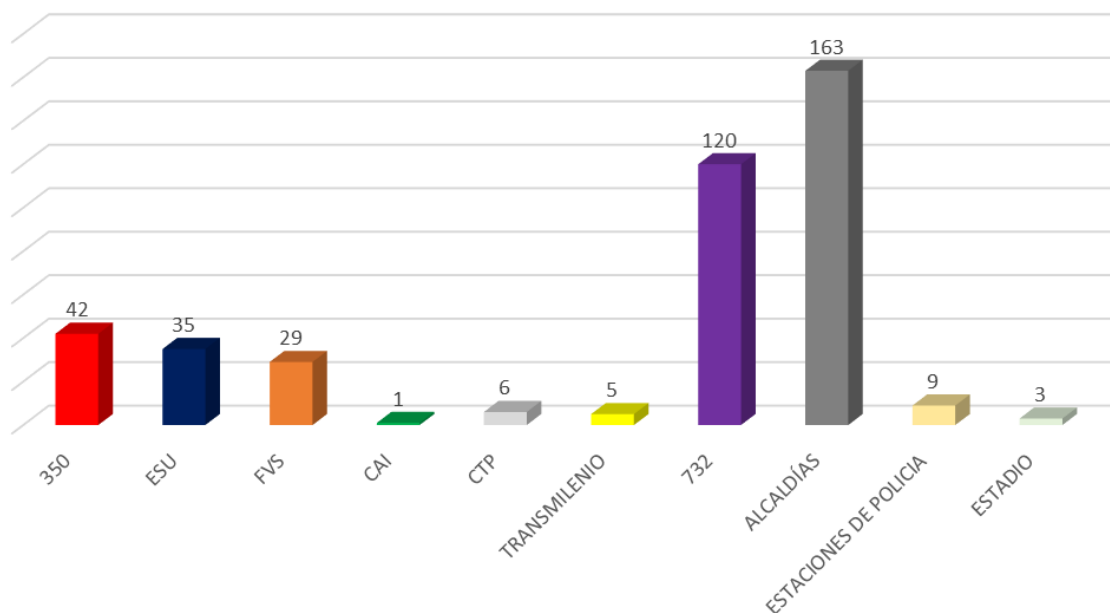


Ilustración 28. Mantenimientos correctivos del 1 al 30 julio de 2020 por proyecto

7.6.3.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS POR PROYECTO DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL (7 SEPTIEMBRE 2019 AL 30 JULIO DE 2020)

Durante el periodo del 7 septiembre 2019 al 30 julio de 2020, el contratista UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019, ha realizado las siguientes cantidades de servicios por cada uno de los proyectos objeto de interventoría:

| MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 7 SEPTIEMBRE 2019 AL 30 DE JULIO 2020 | |
|--|----------|
| PROYECTO | CANTIDAD |
| 350 | 317 |
| ESTADIO | 11 |
| PARQUE SIMÓN BOLIVAR | 9 |
| ESU | 481 |
| FVS | 421 |
| TRANSMILENIO | 76 |
| 732 | 1180 |
| ALCALDÍAS | 1053 |
| CAI | 49 |
| COLEGIOS | 87 |
| CTP | 20 |
| ESTACIONES DE POLICIA | 17 |

Tabla 202. Mantenimientos correctivos- 7 sep 2019 al 30 julio 2020 por proyecto.

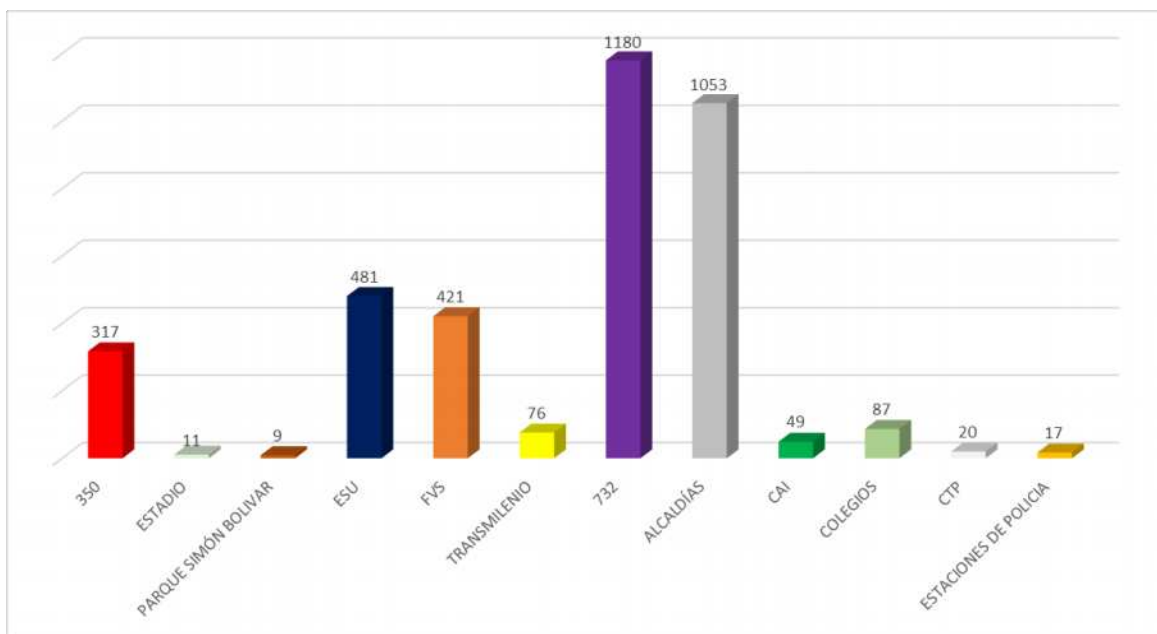


Ilustración 29. Mantenimientos correctivos del 7 de septiembre 2019 al 30 de julio 2020

7.6.3.3 MANTENIMIENTOS EJECUTADOS EN LAS LOCALIDADES

| LOCALIDAD | CANTIDAD |
|-----------------------|-------------|
| ANTONIO NARIÑO | 68 |
| BARRIOS UNIDOS | 95 |
| BOSA | 303 |
| CHAPINERO | 201 |
| CIUDAD BOLÍVAR | 333 |
| ENGATIVÁ | 302 |
| FONTIBÓN | 158 |
| KENNEDY | 330 |
| LA CANDELARIA | 59 |
| LOS MÁRTIRES | 163 |
| PUENTE ARANDA | 165 |
| RAFAEL URIBE URIBE | 199 |
| SAN CRISTÓBAL | 167 |
| SUBA | 311 |
| TEUSAQUILLO | 285 |
| TUNJUELITO | 82 |
| USAQUÉN | 114 |
| USME | 119 |
| SANTAFÉ | 267 |
| TOTAL, GENERAL | 3721 |

Tabla 203. Mantenimientos ejecutados en las localidades

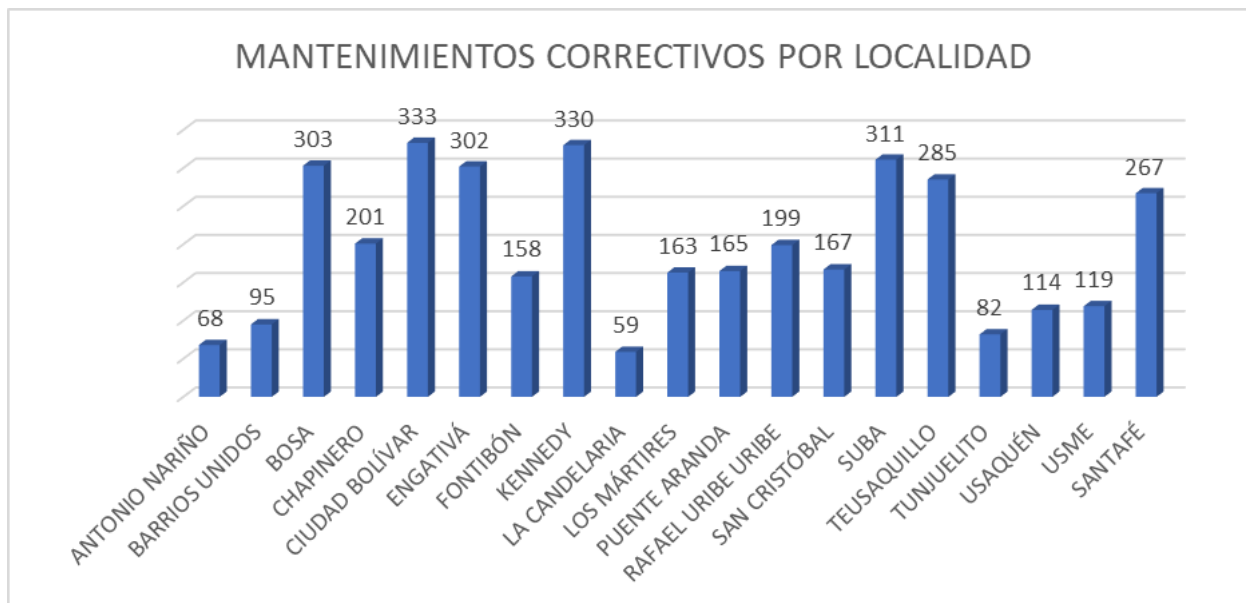


Ilustración 30. Correctivos por localidad

7.7 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

A continuación, se cuantifican los mantenimientos preventivos realizados en el mes de julio de 2020, los cuales se muestran a continuación:

La tabla 204, hace referencia a los subsistemas, que se han realizado en el servicio preventivo completo.

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UBICACIÓN MES DE JULIO DE 2020 | |
|---|----------|
| ESTADIO | COLEGIOS |
| 1 | 2 |

Tabla 204. Total, Mantenimientos preventivos por ubicación mes de julio de 2020

Para la tabla 205, se relaciona los preventivos por ubicación que se han realizado del subsistema Colegios y Estadio, igualmente se relaciona los preventivos por punto de cámara proyectos de domos ciudadanos correspondientes a los proyectos FVS, ESU y 350.

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE JULIO DE 2020 | | | | |
|---|---------|----------|-----|-----|
| 350 | ESTADIO | COLEGIOS | ESU | FVS |
| 34 | 1 | 2 | 31 | 22 |

Tabla 205. Total, Mantenimientos preventivos, julio de 2020.

SERVICIOS REALIZADOS CON CARRO CANASTA

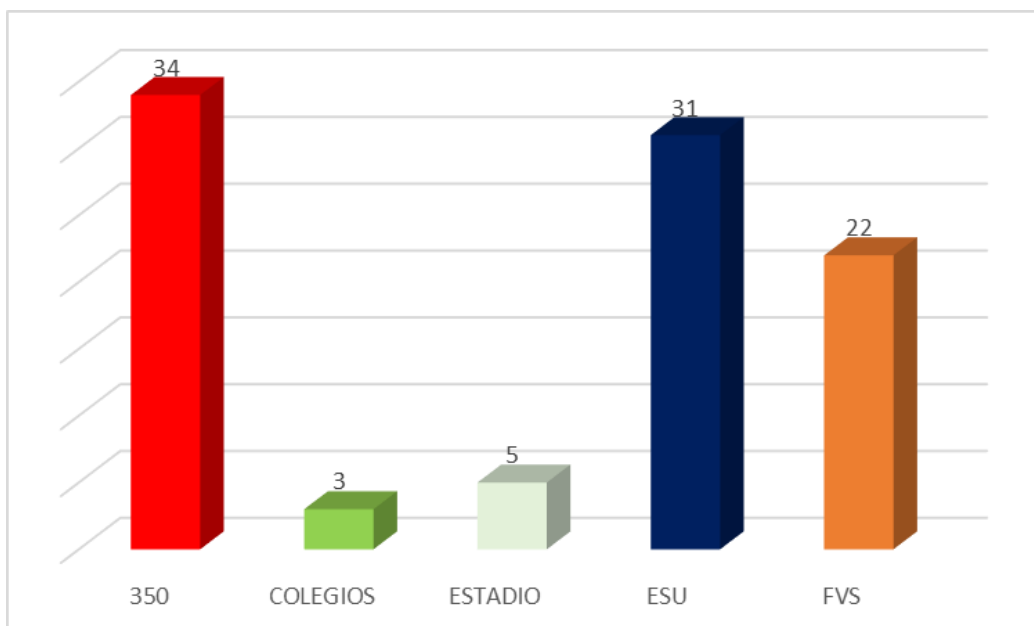


Ilustración 31. Mantenimiento preventivo realizados por punto de cámara con carro canasta

Se relaciona por parte de la interventoría, el medio de acceso con el que se realizó, estos mantenimientos preventivos:

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CARRO CANASTA MES DE JULIO DE 2020 | | | | |
|---|----------|---------|-----|-----|
| 350 | COLEGIOS | ESTADIO | ESU | FVS |
| 34 | 3 | 5 | 31 | 22 |

Tabla 206. Mantenimiento preventivo realizados por punto de cámara con carro canasta

Para la tabla 206, se relaciona los puntos de cámara realizados con carro canasta para los subsistemas de estadio y colegios, teniendo en cuenta que estos subsistemas para el caso de colegio se realiza mantenimientos preventivos en rack, los cuales se asocian a un mantenimiento preventivo por ubicación, al igual que en el subsistema Estadio las 59 cámaras y 2 racks que se encuentra relacionado el detalle en la ruta (VER 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ANEXO INFORME DE JULIO\PREVEN ESTADIO). Se aclara que para los proyectos FVS, ESU y 350, el medio de acceso es a través de un carro canasta.

En la tabla 207 se relaciona el consolidado de los mantenimientos preventivos, realizados desde el 30 de abril del 2020 al 30 de julio de 2020, donde se puede observar que los subsistemas CAI, COSECS, CTP, TRANSMILENIO, ESTADIO, COLEGIOS, C4 Y DATA CENTER BOMBEROS, ya fueron realizados en su totalidad el mantenimiento preventivo para dichos subsistemas. Para el subsistema colegios y los proyectos FVS, ESU Y 350, quedaron pendientes con la ejecución de los mantenimientos preventivos por parte del contratista de mantenimiento, dado que no fue posible por parte de la Secretaría de Educación la gestión de ingresos a las instituciones educativas y por parte de domo ciudadanos, el punto contaba con mantenimiento correctivos recientes dentro de los 30 días calendario.

| PREVENTIVOS POR UBICACIÓN CONSOLIDADO | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|--------------|-------|----------|-----|----|----------------------|---------|
| FVS | ESU | 350 | CAI | TRANSMILENIO | COSEC | COLEGIOS | CTP | C4 | DATA CENTER BOMBEROS | ESTADIO |
| 341 | 296 | 365 | 155 | 7 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabla 207. Total, Consolidado de mantenimientos preventivos por ubicación

7.7.1 GRAFICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UBICACIÓN O PUNTO DE CÁMARA

Durante el periodo del mes de julio de 2020, el contratista de mantenimiento UTSMVC ha realizado los siguientes mantenimientos preventivos:

POR UBICACIÓN

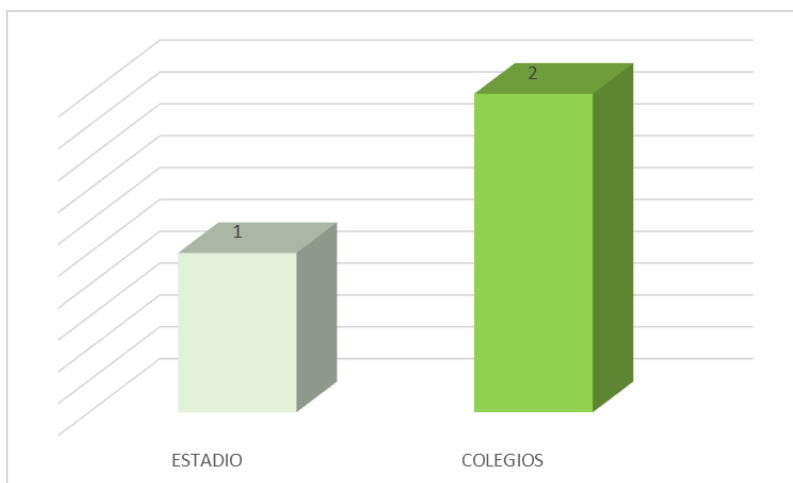


Ilustración 32. Mantenimiento preventivo por ubicación

POR PUNTO DE CÁMARA

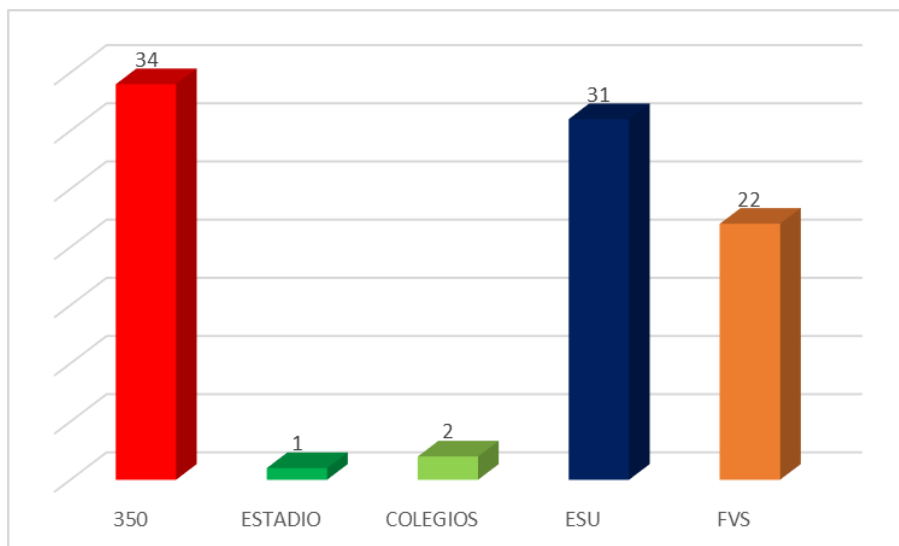


Ilustración 33. Mantenimiento preventivo por punto de cámara

7.7.2 INFORMACIÓN REFERENTE A LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS EN LA PLATAFORMA ISS SECUROS Y LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

En el marco de la ejecución de los mantenimientos preventivos a puntos ciudadanos se encontraron novedades en la configuración de alarmas, (Apertura de gabinete y ausencia de energía) y en los sistemas de puesta a tierra de cada punto como se muestra en las siguientes ilustraciones por proyecto:

Proyecto FVS:

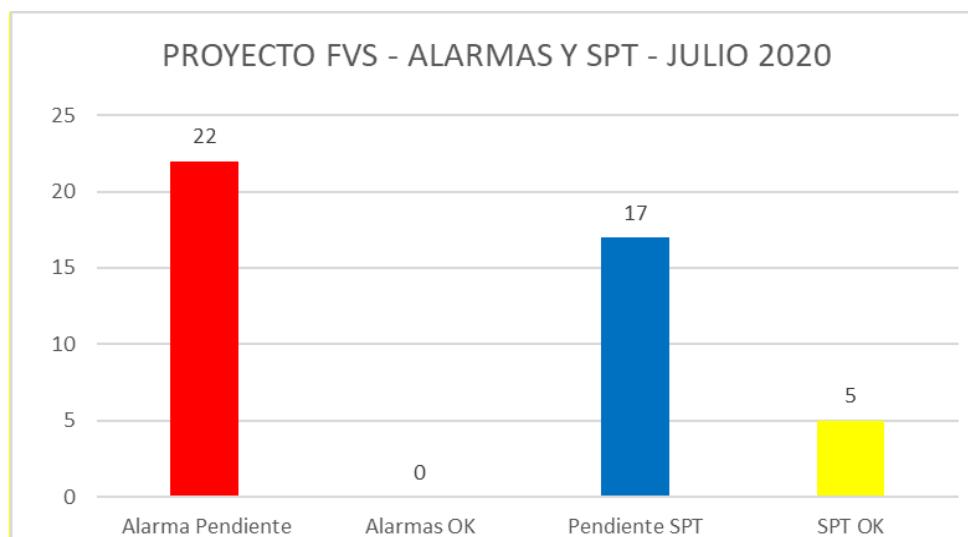


Ilustración 34. Novedades de alarmas y SPT - Proyecto FVS

En la ilustración 33, se puede deducir que la mayoría de puntos de videovigilancia que corresponde a este proyecto, en los 22 puntos visitados en el mes de julio de 2020 se presentó que, ninguna alarma se configuró en la plataforma de **ISS SECUROS**, esto se debe a que en los puntos se encuentran novedades tales como, falla en cableado, sin cableado, falla en sensores, ausencia de sensores y puntos donde se encuentran instaladas cámaras de marca **INDIGO VISIÓN**, la cual presenta restricciones al momento de configurarlas y ponerla en funcionamiento.

| NOVEDAD PRESENTADA EN SITIO -FVS | PUNTOS |
|--|-----------|
| CONFIGURACION OK | 0 |
| VISUALIZANDO DESDE ONVIF | 0 |
| NO APLICA SISTEMA ALARMA | 4 |
| SISTEMA SIN CABLEADO Y/O REQUIERE CAMBIO DEL MISMO | 13 |
| TAMPER Y/O RELEVO DAÑADO | 5 |
| TOTAL | 22 |

Tabla 208. Observaciones - Alarmas - FVS

Para los sistemas de puesta a tierra se evidencia que de los 22 puntos visitados 5 puntos cuentan con las condiciones previstas para el mantenimiento preventivo, pero de los 17 restantes se evidenciaron novedades como (No tiene caja, Sin varilla, Fondo de concreto). Se realizó el reporte de las novedades presentadas en sitio en las actas 55, 57, 58 y 59 de seguimiento con la SDSCJ. para el mes de julio de 2020.

| NOVEDAD PRESENTADA EN SITIO -FVS | PUNTOS |
|-------------------------------------|-----------|
| SIN SPT - REQUIERE OBRA CIVIL | 2 |
| NO APLICA SPT | 3 |
| FONDO DE CONCRETO | 1 |
| TAPA ROTA Y SIN VARILLA | 10 |
| RIESGO BIOLÓGICO - RIESGO ELÉCTRICO | 0 |
| SISTEMA OK | 6 |
| TOTALES | 22 |

Tabla 209. Observaciones - SPT – FVS

Proyecto ESU:

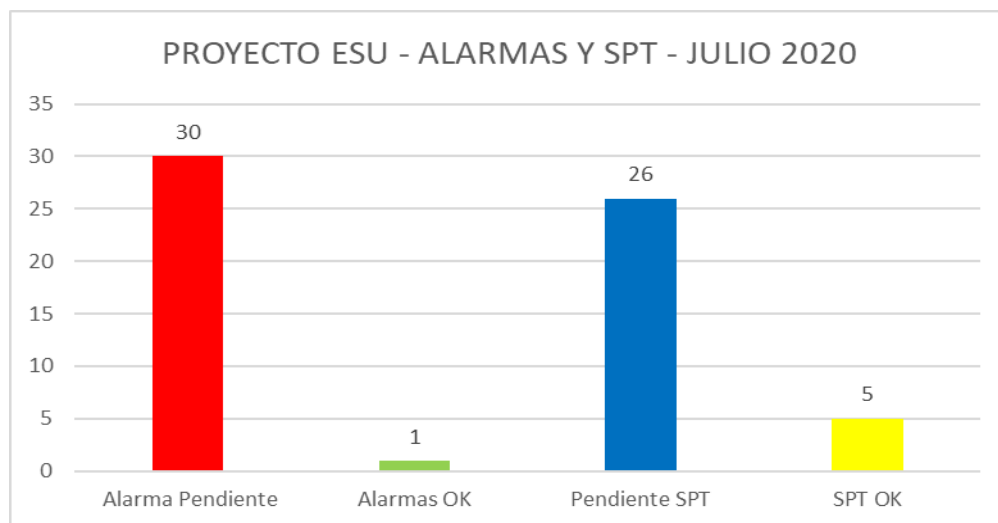


Ilustración 35. Novedades alarmas y SPT - Proyecto ESU

De la ilustración 34, se deduce que la mayoría de puntos de videovigilancia que corresponde a este proyecto, en los 31 puntos atendidos en el mes de Julio de 2020, ninguno fue configurado en la plataforma de **ISS SECUROS**, y 1 punto fue configurado en la plataforma **ONVIF**, 4 puntos no Aplica la configuración de la alarma, los restantes 26 se encuentran novedades tales como, falla en cableado, sin cableado cambio del mismo, lo cual dificulta la puesta en funcionamiento.

| NOVEDAD PRESENTADA EN SITIO - ESU | PUNTOS |
|--|-----------|
| CONGIFURACION OK | 0 |
| VISUALIZANDO DESDE ONVIF | 1 |
| NO APLICA SISTEMA ALARMA | 4 |
| SISTEMA SIN CABLEADO Y/O REQUIERE CAMBIO DEL MISMO | 26 |
| TAMPER Y/O RELEVO DAÑADO | 0 |
| TOTAL | 31 |

Tabla 210. Observaciones - Alarmas - ESU

En los sistemas de puesta a tierra quedaron pendientes 26 puntos con novedades como (No tiene caja, Sin varilla, Fondo de concreto), y solo 5 puntos cumplen con los requerimientos para ser atendidos por mantenimiento preventivo. Se realizó el reporte de las novedades presentadas en sitio en las actas 55, 57, 58 y 59 de seguimiento con la SDSCJ. para el mes de julio de 2020.

| NOVEDAD PRESENTADA EN SITIO - ESU | PUNTOS |
|-------------------------------------|-----------|
| SIN SPT - REQUIERE OBRA CIVIL | 5 |
| NO APLICA SPT | 0 |
| FONDO DE CONCRETO | 13 |
| TAPA ROTA Y SIN VARILLA | 7 |
| RIESGO BIOLÓGICO - RIESGO ELÉCTRICO | 0 |
| SISTEMA OK | 5 |
| TOTALES | 31 |

Tabla 211. Observaciones - SPT – ESU

Proyecto 350:

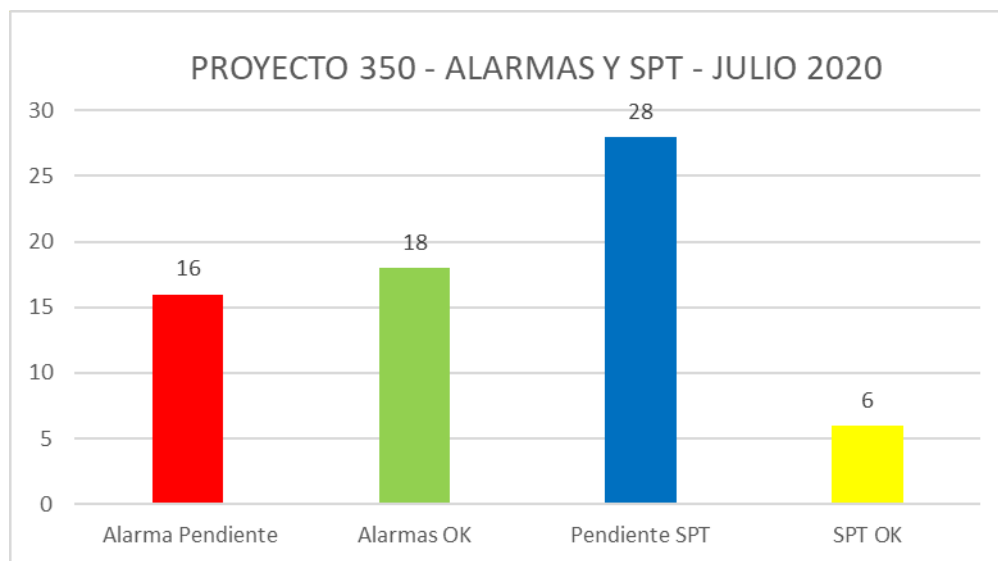


Ilustración 36. Novedades alarmas y SPT - Proyecto 350

De la ilustración 35, se deduce que la mayoría de puntos de videovigilancia que corresponde a este proyecto, en los 34 puntos atendidos en el mes de Julio de 2020, ninguno fue configurado en la plataforma de **ISS SECUROS**, y 18 puntos fueron configurados en la plataforma **ONVIF**, los restantes 16 requieren la novedad de falla en cableado, sin cableado, lo cual dificulta la puesta en funcionamiento.

| NOVEDAD PRESENTADA EN SITIO - 350 | PUNTOS |
|--|-----------|
| CONFIGURACION OK | 0 |
| VISUALIZANDO DESDE ONVIF | 18 |
| NO APLICA SISTEMA ALARMA | 0 |
| SISTEMA SIN CABLEADO Y/O REQUIERE CAMBIO DEL MISMO | 16 |
| TAMPER Y/O RELEVO DAÑADO | 0 |
| TOTAL | 34 |

Tabla 212. Observaciones - Alarmas - 350

En los sistemas de puesta a tierra quedaron pendientes 28 puntos con novedades como (No tiene caja, Sin varilla), y solo 6 puntos cumplen con los requerimientos para ser atendidos por mantenimiento preventivo. Se realizó el reporte de las novedades presentadas en sitio en las actas 55, 57, 58 y 59 de seguimiento con la SDSCJ para el mes de julio de 2020.

| NOVEDAD PRESENTADA EN SITIO - 350 | PUNTOS |
|--|---------------|
| SIN SPT - REQUIERE OBRA CIVIL | 1 |
| NO APLICA SPT | 0 |
| FONDO DE CONCRETO | 0 |
| TAPA ROTA Y SIN VARILLA | 27 |
| RIESGO BIOLÓGICO - RIESGO ELÉCTRICO | 0 |
| SISTEMA OK | 6 |
| TOTALES | 34 |

Tabla 213. Observaciones - SPT - 350

7.8 LIMPIEZAS DE ACRILICO

7.8.1 CANTIDAD DE PUNTOS VISITADOS POR EL CONTRATISTA UTSMVC

En la tabla 214, se cuantifican la cantidad diaria de limpiezas de acrílicos ejecutadas y en la tabla 215 se cuantifican dichas limpiezas por proyecto. (VER 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ANEXO INFORME DE JULIO\ACRILICOS).

| FECHA DE VISITA | CANTIDAD |
|------------------------|-----------------|
| 01/07/20 | 10 |
| 02/07/20 | 9 |
| 03/07/20 | 10 |
| 04/07/20 | 10 |
| 06/07/20 | 10 |
| 07/07/20 | 6 |
| 08/07/20 | 9 |
| 09/07/20 | 4 |
| 10/07/20 | 2 |
| 13/07/20 | 8 |
| 14/07/20 | 8 |
| 15/07/20 | 5 |
| 16/07/20 | 7 |
| 17/07/20 | 6 |
| 18/07/20 | 7 |
| 21/07/20 | 2 |
| 22/07/20 | 7 |
| 23/07/20 | 6 |
| 25/07/20 | 8 |
| 28/07/20 | 2 |
| 29/07/20 | 7 |
| 30/07/20 | 1 |
| TOTAL | 144 |

Tabla 214. Limpieza de acrílicos en puntos de cámaras diarios

| No. | PROYECTO | CANTIDAD |
|--------------|-----------|------------|
| 1 | 732 | 38 |
| 2 | ALCALDÍAS | 95 |
| 3 | ESU | 2 |
| 4 | FVS | 9 |
| TOTAL | | 144 |

Tabla 215. Limpieza de acrílicos por proyecto

Conforme a los datos presentados en la tabla 215 en la siguiente ilustración, se describe la cantidad de limpiezas de acrílicos en el período del 1 al 30 de julio 2020, ejecutados de manera consolidada en los proyectos:

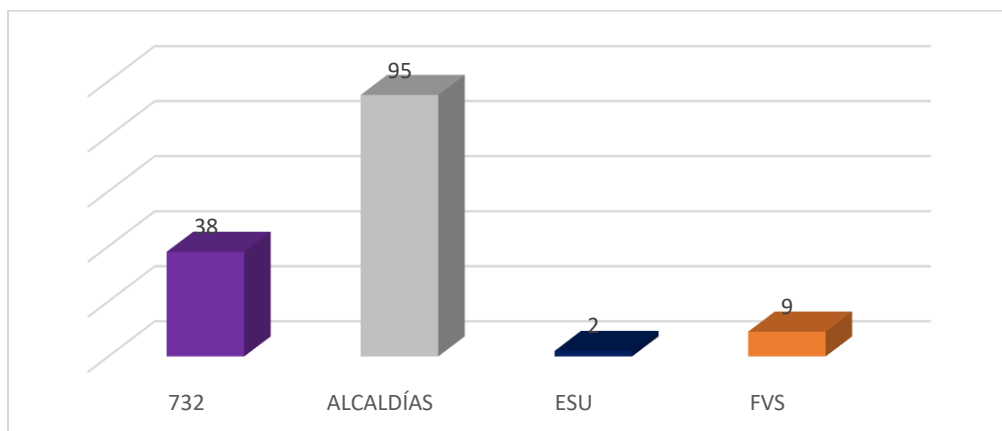


Ilustración 37. Limpieza acrílicos puntos de videovigilancia 1 la 30 julio de 2020

Adicional a los datos presentados, en la siguiente grafica se describe la cantidad de limpiezas de acrílicos en el período del 7 de septiembre de 2019 al 30 julio de 2020, ejecutados de manera consolidada en los proyectos.

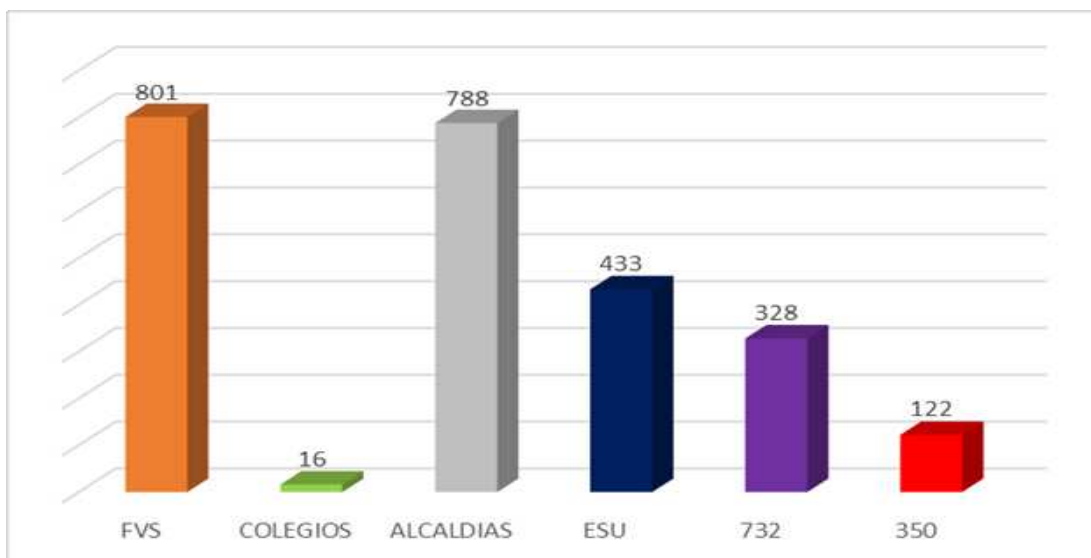


Ilustración 38. Limpiezas de acrílico del 7 septiembre 2019 al 30 de julio de 2020

7.8.2 NOVEDADES LIMPIEZA ACRÍLICO

Durante el periodo objeto del presente informe, la Interventoría evidenció que en las visitas realizadas por el contratista UTSMVC se encontraron novedades de acrílico sucio.

Se aclara, que estos puntos se le remite por parte de la interventoría al contratista de mantenimiento UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019 semanalmente con el reporte del estado del sistema, para que sean atendidos nuevamente por garantía, sin generar costo alguno o adicional al proyecto. En la tabla 216 se cuantifica por día dichas novedades.

| FECHA DE VISITA | CANTIDAD |
|------------------------|-----------------|
| 01/07/2020 | 2 |
| 02/07/2020 | 3 |
| 03/07/2020 | 3 |
| 04/07/2020 | 2 |
| 06/07/2020 | 7 |
| 08/07/2020 | 2 |
| 09/07/2020 | 2 |
| 13/07/2020 | 3 |
| 14/07/2020 | 5 |
| 15/07/2020 | 1 |
| 16/07/2020 | 2 |
| 17/07/2020 | 1 |
| 18/07/2020 | 1 |
| 25/07/2020 | 2 |
| 28/07/2020 | 2 |
| TOTAL | 38 |

Tabla 216. Novedades Limpieza de acrílicos puntos de cámaras

Los puntos de videovigilancia detallados se pueden encontrar en el anexo ((VER Ruta: 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ANEXO INFORME DE JULIO/ACRÍLICO SUCIO).

7.9 VISITAS FALLIDAS DOMOS CIUDADANOS

Durante el periodo objeto del presente informe, la Interventoría evidenció, novedades, reportadas por el contratista UT Servicios MNTO Vigilancia ciudadana 2019 a punto de videovigilancia, las cuales son:

- ✓ Obras civiles correspondiente a contratistas del IDU en sitio.
- ✓ Lluvias constantes.
- ✓ Intervención de Vías arteriales en el turno diurno.
- ✓ Postes desaplomados
- ✓ Puntos de cámara que se encontraba operativos y se cancela visita por dicha novedad.
- ✓ Puntos sin acceso, por encontrarse en bahías y se encontrabloqueados por vehículos parqueados en el sitio.

✓ Temas logísticos con el carro canasta del contratista de mantenimiento. El detalle para cada punto de cámara se puede consultar en su respectivo anexo. ((VER RUTA: 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ ANEXO INFORME DE JULIO/ NOVEDADES EN MANTENIMIENTO)).

7.10 VISITAS SITE SURVEY SOLICITADOS POR LA SDSCJ Y MEBOG

Durante el período objeto del presente informe, el contratista de mantenimiento UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019, realizó visitas de “Site Survey”, solicitadas por la SDSCJ.

| No | COD_INSTALACIÓN | COD_MEBOG | COD_OAIEE | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | PROYECTO | GRUPO CONTRATISTA IDU | FECHA DE VISITA |
|----|-----------------|-----------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 1 | PAQ62 | 5215 | 07084-4497 | CL 59 C SUR KR 88 C | BOSA | ALCALDIAS | 5 | 09/07/20 |
| 2 | SCJ17E07 0048 | 5112 | 07084-1760 | CL 59C SUR KR 87F | BOSA | 732 | 5 | 09/01/20 |

Tabla 217. Visita site survey en el mes de julio de 2020

Para los puntos relacionados en la tabla 217, se aclara que posterior a la visita la SDSCJ informó que no se realizarán traslados provisionales, por lo tanto, dichas ubicaciones definidas en las visitas no se tendrán en cuenta, para la reubicación de los puntos de videovigilancia.

7.11 HINCADOS DE POSTE

Durante el período objeto del presente informe, el contratista UT-SMVC 2019, realizó hincados para los siguientes puntos de videovigilancia ciudadana.

| FECHA DE VISITA | CANTIDAD |
|-----------------|----------|
| 08/07/2020 | 1 |
| 16/07/2020 | 1 |
| 21/07/2020 | 2 |
| 22/07/2020 | 4 |
| TOTAL | 8 |

Tabla 218. Postes Hincados en el mes de julio de 2020

Se aclara que las cantidades relacionadas en la tabla 218, corresponden 6 puntos de videovigilancia del proyecto FVS que se reubicarán por tema de modernización (ver capítulo 7.18), los 2 puntos restantes corresponden a reubicaciones aprobadas por la SDSCJ, la cual se relaciona 1 con el IDU y la otra con 1 punto del proyecto alcaldías.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

El detalle para cada punto de cámara se puede consultar en su respectivo anexo. ((VER RUTA: 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ ANEXO INFORME DE JULIO/HINCADOS))

7.12 PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA CON NOVEDAD DE OBRA CIVIL IDU

Durante el período objeto del presente informe la interventoría verifico los siguientes puntos que cuentan con novedad de obras civiles y los cuales se relacionan a continuación:

| NO. | CÓDIGO O MEBOG | CÓDIGO O OAIEE | DIRECCIÓN O AIEE | PROYECTO | OBSERVACIÓN | LOCALIDAD |
|-----|----------------|----------------|-------------------|----------|---|----------------|
| 1 | 2528 | 04033-1275 | KR 7 BIS CL 3 SUR | 350 | EN EJECUCIÓN, FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN 15 DE MARZO DE 2020, NUMERO DE CONTRATO 1521 DEL 2017, INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL MAESTRO ENCARGADO DEL PROYECTO ALBERTO GÓMEZ, NO HAY PERSONAL TRABAJANDO NO HAY MANERA DE SUBIR UNA GRÚA SE NECESITA BRAZO EXTRALARGO CARRERA 7 BIS CALLE 3 SUR | SAN CRISTÓBAL |
| 2 | 1169 | 11027-1588 | KR 92 CL 151 | 732 | OBRAS SOBRE CRA 92 CONSORCIO CHIA-SUBA CONTRATO DIRECTO CON LA ALCALDÍA LOCAL 340-2017, CÁMARA DENTRO DE OBRA APROXIMADAMENTE 1 MES MAS DE EJECUCIÓN, CÁMARA TIPO DOMO | SUBA |
| 3 | 2031 | 13109-1364-17 | CL 53 KR 66 A | ESU | OBRAS SOBRE COLL 53 PARQUE SIMÓN BOLÍVAR, CÁMARA TIPO DOMO DENTRO DE LA OBRA, APROX ENERO, CONSORCIO HIDRÁULICO, ENCARGADO ACUAPUNTO ING JAIRO MUÑOZ CONTRATO 1-01-25500-0715-2018 EAAB. | TEUSAQUILLO |
| 4 | 0560 | 02090-0773 | CL 67 KR 6 | FVS | OBRA SOBRE CRA 6 ENTRE CALLES 67 Y 66, NO HAY PERSONAL TRABAJANDO EN EL SITIO, NO HAY PERSONAL DE SEGURIDAD, NO HAY SEÑALIZACIÓN DE TRABAJOS NI IDENTIFICACIÓN DE QUIEN EJECUTA OBRA, SE PREGUNTO A VECINOS E INDICAN QUE LLEVAN MAS DE UNA SEMANA QUE NO VAN A TRABAJAR. CÁMARA TIPO DOMO EN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO SIN BRAZO. | CHAPINERO |
| 5 | 4543 | 19065-0694 | CL 58C SUR TV 28 | ESU | OBRA SOBRE TRANSV 28 SUR CLL 59 Y58 C, ESTA PARA OCTUBRE O NOVIEMBRE CÁMARA TIPO DOMO DENTRO DE LA OBRA CONSORCIO CORREDORES C Y S CONTRATO 1-01-25100-1466-2018, EAAB. | CIUDAD BOLÍVAR |
| 6 | 6714 | 10072-2996 | CL 90 KR 111A | 732 | OBRA SOBRE CRA 111 A X CLL 90, CÁMARA DENTRO DE LA OBRA NO SE PUEDE ACCEDER A ELLA, SE VALIDA CORTE DE CABLE ELÉCTRICO DEJADO EN PUNTA EN OTRO POSTE APROXIMADAMENTE AGOSTO TERMINA OBRA, CONSORCIO CRS JUAN AMARILLO TEL 9371279 CONTRATO 1-01-32100-1434-2018 | ENGATIVÁ |
| 7 | 1173 | 11028-1609 | KR 91 CL 131 | 732 | OBRA SOBRE CRA 92 DESDE CLL 116 HASTA 138 CONSORCIO SAN PATRICO Y UNION TEMPORAL | SUBA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| NO. | CÓDIGO MEBOG | CÓDIGO OAIEE | DIRECCIÓN OAIEE | PROYECTO | OBSERVACIÓN | LOCALIDAD |
|-----|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|---|-------------|
| | | | | | UTAR CONTRATO 1725-2014 APROXIMADAMENTE OBRA HASTA NOVIEMBRE EN ESE PUNTO CÁMARA ESTA FUERA DE OBRA SE PUEDE ACCEDER EN LA NOCHE VIA PRINCIPAL SE ENCONTRÓ CABLE FOLTO EN AL BASE DEL POSTE. | |
| 8 | N/A | 08079-0492 | COL SALUDCO OP SUR - CL 26 SUR KR 89 | COLEGIOS | EL PUNTO SE ENCUENTRA INTERVENIDO POR EL IDU, POR LA OBRA GUAYACANES Y SE DEBE TRASLADAR UNA VEZ SE REQUIERA POR EL IDU | KENNEDY |
| 9 | 5581 | 10072-2996 | CL 11 Y 11 A AV CALI | ESU | EL PUNTO SE ENCUENTRA INTERVENIDO POR LA OBRA VÍA GUAYACANES POR EL CONTRATISTA CONCA Y S.A, SE DESCONOCE FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA. | KENNEDY |
| 10 | 2033 | 13109-1364-19 | AK 68 CL 53 | ESU | SE ENCUENTRA INTERVENIDO POR LA OBRA DEL IDU QUE SE ESTA REALIZANDO OR LA CALLE 53, SE DESCONOCE FECHA DE FINALIZACIÓN. | TEUSAQUILLO |
| 11 | 5009 | 07086-0702 | CL 59 SUR KR 89A | FVS | CODENSA S.A E.S.P., INFORMÓ LA EXCLUSIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD POR FALLA ELÉCTRICA PARA EL PUNTO DE CÁMARA FVS-3009, ESTO OBEDECE A LA AFECTACIÓN ENCONTRADA CON OBRAS ADELANTADAS POR EL IDU. SE SOLICITA SE REALICE EL CAMBIO ATRIBUYENDO LA RESPONSABILIDAD A UN TERCERO QUEDANDO CODENSA A LA ESPERA DE REALIZAR LOS TRABAJOS UNA VEZ CONCLUYAN LAS OBRAS EN LA ZONA Y EXISTA VIGENCIA CONTRACTUAL. | BOSA |
| 12 | 5112 | 07084-1760 | CL 59C SUR KR 87F | 732 | NO SE HA REALIZADO POR QUE LA UBICACIÓN FINAL NO SE HA REALIZADO LAS CANALIZACIONES DE ACOMETIDA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL IDU PAVCO. | BOSA |
| 13 | 5808 | 08079-3667 | KR 89 CL 9 SUR | ALCALDÍAS | NO SE HA REALIZADO POR QUE LA UBICACIÓN FINAL NO SE HA REALIZADO LAS CANALIZACIONES DE ACOMETIDA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL IDU CONCA Y S.A. | KENNEDY |
| 14 | 5215 | 07084-4497 | CL 59 C SUR KR 88 C | ALCALDÍAS | NO SE HA REALIZADO POR QUE LA UBICACIÓN FINAL NO SE HA REALIZADO LAS CANALIZACIONES DE ACOMETIDA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL IDU PAVCO. | BOSA |

Tabla 219. Puntos videovigilancia con novedades obra civil IDU

Se aclara que la información contenida en la tabla 219, se reportó semanalmente a la supervisión del contrato mediante las actas de seguimiento 53, 55, 57, 58 y 59, correspondiente al mes de julio de 2020.

7.13 VISITAS PARQUE SIMÓN BOLIVAR

Durante el periodo objeto del presente informe, el contratista de mantenimiento UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019, no realizó visita de mantenimiento

correctivo al Parque Simón Bolívar, debido a que no presento ningún tipo de falla en el mes de julio de 2020. Cabe resaltar que dichas actividades de mantenimiento correctivo no fueron necesarias, dado que este subsistema opero correctamente durante el mes informado. Se aclara que durante el presente mes objeto del presente informe realizo mantenimiento preventivo a los 3 puntos de cámara que se encuentran instalados al interior del parque Simón Bolívar.

El detalle para cada punto de cámara se puede consultar en su respectivo anexo. (VER RUTA: 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ANEXO INFORME DE JULIO/PREVEN FVS)

7.14 DESMONTE DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA

Durante el periodo objeto del presente informe, el contratista de mantenimiento UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019, realizó desinstalación de punto de videovigilancia, las cuales se relacionan a continuación:

| FECHA DE VISITA | CANTIDAD |
|-----------------|----------|
| 08/07/2020 | 1 |
| 15/07/2020 | 1 |
| 17/07/2020 | 1 |
| 18/07/2020 | 2 |
| TOTAL | 5 |

Tabla 220. Desmonte de puntos de videovigilancia

El detalle para cada punto de cámara se puede consultar en su respectivo anexo. ((VER RUTA: 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ANEXO INFORME DE JULIO/DESINSTALACIÓN EQUIPOS)

Los puntos desmontados corresponden a 4 puntos relacionados con el IDU obra via guayacanes y 1 punto del proyecto alcaldías, los cuales se aprobaron por la SDSCJ, mediante acta 54 y 56 del mes de julio de 2020 y mediante oficio con consecutivo CSS-P136-00192-2020 del 7 de julio de 2020.

Se aclara que, de los 5 puntos de videovigilancia desinstalados, los equipos de 3 de estos puntos de cámaras se encuentran en custodia del contratista UTSMVC (VER CAPITULO 7.21.2) Y 2 se volvieron a instalar nuevamente (ver capítulo 7.15).

7.15 MONTAJE DE PUNTO DE VIDEOVIGILANCIA

Durante el periodo objeto del presente informe, el contratista de mantenimiento UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019, realizó la instalación de los puntos de videovigilancia, las cuales se relacionan a continuación:

| FECHA DE VISITA | CANTIDAD |
|-----------------|----------|
| 08/07/2020 | 1 |
| 16/07/2020 | 1 |
| TOTAL | 2 |

Tabla 221. Montaje de puntos de videovigilancia.

Los puntos de cámara relacionados en la tabla 221, corresponden a 1 punto de cámara traslado por solicitud del IDU y aprobado por la SDSCJ en el acta de seguimiento 54 del mes de julio de 2020 y el otro punto corresponde a 1 punto de cámara del proyecto alcaldías mediante oficio con consecutivo CSS-P136-00192-2020 del 7 de julio de 2020, cuya actividad fue aprobada por la supervisión.

El detalle para cada punto de cámara se puede consultar en su respectivo anexo. ((VER RUTA: 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ ANEXO INFORME DE JULIO/INSTALACIÓN EQUIPOS)

7.16 INSTALACIÓN DE SPT

Durante el período objeto del presente informe la interventoría se generaron visitas para la instalación de SPT en puntos de videovigilancia, por parte del contratista de mantenimiento.

| No | CODIGO MEBOG | DIRRECCION | PROYECTO | LOCALIDAD | OBSERVACION | FECHA DE VISITA |
|----|--------------|---------------------------------|----------|----------------|---|-----------------|
| 1 | 145 | CALLE 11 Y 11 A XAVCIUDADDECALI | ESU | KENNEDY | SE INICIA EJECUCIÓN DE TIERRAS SOBRE EL PUNTO ESU 145 EN LA CALLE 11 CON AV CALI, SE HACE USO DE 2 BULTOS DE FAVIGEL, VARILLA DE TIERRAS, VARILLA EN ACERO, PERRO DE SEGURIDAD, 1 KIT DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, LA TAPA SE DEJA SOLDADA EN UN SOLO PUNTO YA QUE EL PUNTO NO CUENTA CON ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA UPS NO CARGA EL SOLDADOR. | 10/07/2020 |
| 1 | 145 | CALLE 11 Y 11 A XAVCIUDADDECALI | ESU | KENNEDY | SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE TIERRAS SOBRE EL PUNTO ESU,145 EN LA CALLE 11 CON AV CALI, SE HACE USO DE 2 BULTOS DE FAVIGEL, VARILLA DE TIERRAS, VARILLA EN ACERO, PERRO DE SEGURIDAD, 1 KIT DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, LA TAPA SE DEJA SOLDADA EN UN SOLO PUNTO YA QUE EL PUNTO NO CUENTA CON ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA UPS NO CARGA EL SOLDADOR. | 11/07/2020 |
| 2 | 1166 | CL 67 KR 19 | FVS | BARRIOS UNIDOS | SE REALIZA SPT Y SE INSTALAN LOS ELEMENTOS: 1 VARILLA COOPER WELL DE 2.40 MTS. 2 DOS BULTOS DE | 27/07/2020 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| No | CODIGO MEBOG | DIRRECCION | PROYECTO | LOCALIDAD | OBSERVACION | FECHA DE VISITA |
|----|--------------|---------------|----------|----------------|--|-----------------|
| | | | | | FAVIGEL DE 25 KILOS 3 5 MTS. DE CABLE DESNUDO DOS CEROS 4 75 CM. DE VARILLA CORRUGADA. 5 15 MTS DE CABLE NO. 8 6 KIT DE SOLDADURA EXOTÉRMICA OBSERVACIONES: SE REALIZA SOLDADURA A LA TAPA DE LA CAJA DE INSPECCIÓN SE REALIZA REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SPT. | |
| 3 | 1323 | CL 71 A KR 17 | FVS | BARRIOS UNIDOS | SE INSTALA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SENCILLO CON SISTEMA ANTIRROBO | 25/07/2020 |

Tabla 222. SPT instalados en el mes de julio de 2020

7.17 INSTALACIÓN DE EQUIPOS COSEC

Durante el periodo objeto del presente informe, el contratista de mantenimiento UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019, realizó la instalación de equipos o elementos para los Cosec Puente Aranda y Ciudad Bolívar:

| FECHA DE VISITA | COSEC |
|-----------------|----------------|
| 06/07/2020 | CIUDAD BOLÍVAR |
| 18/07/2020 | PUENTE ARANDA |
| 23/07/2020 | PUENTE ARANDA |
| 25/07/2020 | CIUDAD BOLÍVAR |

Tabla 223. Visita para instalación en los Cosec's Puente Aranda y Ciudad Bolivar

| No | DESCRIPCIÓN | C. BOLÍVAR | PTE ARANDA | TOTAL |
|----|--------------------------------|------------|------------|-------|
| 1 | MONITORES DE VISUALIZACION 46" | - | 4 | 4 |
| 2 | SILLAS ERGONOMICA | 10 | 10 | 20 |
| 3 | APOYA PIES | 10 | 10 | 20 |
| 4 | CONVERSORES DE VIDEO | 0 | 4 | 4 |
| 5 | LUMINARIAS | 14 | 6 | 20 |
| 6 | EXTINTORES | 2 | 2 | 4 |

Tabla 224. Equipos instalados en Cosecs

El detalle de la visita se puede consultar en su respectivo anexo. ((VER RUTA: 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ ANEXO INFORME DE JULIO/COSEC)

7.18 MODERNIZACIÓN PROYECTO FVS

Se culmina la modernización de los 9 puntos de videovigilancia, correspondientes al proyecto FVS y se relaciona a continuación, el estado de ejecución:

- ✓ 8 gabinetes nuevos
- ✓ 1 sistema puesta a tierra con anillo
- ✓ 1 sistema puesta a tierra normal
- ✓ 5 acometidas eléctricas conectadas
- ✓ 6 postes nuevos
- ✓ 3 postes existentes

De acuerdo al cronograma del contratista de mantenimiento queda pendiente:

- ✓ La instalación de 5 sistemas de puesta a tierra con anillo y la instalación de 1 sistema de puesta a tierra normal.
- ✓ La conexión de 4 acometidas eléctricas.

Se aclara que para los sistemas puesta a tierra solo se contemplaron desde el inicio 8 SPT, teniendo en cuenta que el punto 1312 del proyecto FVS, en su ubicación actual el poste existente no cuenta con espacio para la construcción de la caja de inspección. En el punto 4030 de FVS se debe adosar tubería al poste existente, teniendo en cuenta que es un poste de alumbrado público y no se puede comunicar internamente pues no cuenta con los ductos. Los puntos de videovigilancia restantes no se pudo realizar la instalación de los 5 SPT y la conexión de las 4 acometidas eléctricas, dado que no estaban instaladas las acometidas eléctricas, ni construidas las cajas de inspección, por tal motivo no fue posible su ejecución.

El detalle de la visita se puede consultar en su respectivo anexo. ((VER RUTA: 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ ANEXO INFORME DE JULIO\C MODERNIZACIÓN FVS)

7.19 PUNTOS SOLICITADOS A TRASLADAR POR EL IDU

La interventoría **Consortio Smarty Scain 2019**, se permite informar las actividades realizadas a los 13 puntos de videovigilancia solicitados por el IDU, para el respectivo traslado, las cuales se relacionan a continuación:

- ✓ 4 puntos de videovigilancia desinstalados.
- ✓ 1 de los 4 puntos desinstalados, se realizó su instalación en la ubicación final definida en el site survey.
- ✓ 3 postes en custodia de los contratistas del IDU, para los cuales se realizó acta y se remitió dicha información vía correo electrónico con consecutivo P136-SSCJ-01209-2020-ENVIÓ DE INFORMACIÓN DE LAS ACTAS REALIZADAS EN CAMPO DE LOS POSTES DE CÁMARA ENTREGADOS EN CUSTODIA A LOS CONTRATISTAS DEL IDU.
- ✓ 9 puntos de videovigilancia que están solicitados por el IDU, pero que en el momento no se requirió su traslado.

El detalle de la visita se puede consultar en su respectivo anexo. (VER RUTA: 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ ANEXO INFORME DE JULIO\C PUNTOS SOLICITADOS POR IDU)

7.20 EQUIPOS O REPUESTOS INSTALADOS

Los repuestos relacionados en la tabla 220. Relación de equipos y repuestos instalados en julio 2020 y su correspondiente individualización y caracterización se encuentran en cada unas de las actas de servicio de mantenimiento correctivo para el mes objeto del presente informe, que han sido entregadas a la interventoría para su respectiva revisión.

La tabla 225 corresponde a una cuantificación total de los elementos reemplazados.

| No | Equipo | Cantidad |
|-----------|------------------------|-----------------|
| 1 | ACOPLE | 4 |
| 2 | CORAZA 3/4 | 1 MTRS |
| 3 | ELECTRODO | 23 |
| 4 | DOMO | 75 |
| 5 | CÁMARA FIJA | 1 |
| 6 | PATCHCORD UTP 5 METROS | 15 |
| 7 | PATCHCORD UTP 2 METROS | 10 |
| 8 | TERMINAL DE CORAZA 3/4 | 1 |
| 9 | TARJETA SNMP | 4 |
| 10 | PATCHCORD BNC | 3 |
| 11 | UPS 1KVA | 9 |
| 12 | TRANSFORMADOR | 5 |
| 13 | CABLE UTP | 60 |
| 14 | JACK | 1 |
| 15 | FUENTE DE CÁMARA | 2 |
| 16 | CABLE ENCAUCHETADO | 60 |

Tabla 225. Relación de equipos y repuestos instalados en julio 2020.

7.21 VISITAS A BODEGA

Durante el periodo objeto del presente informe, esta interventoría realizó la visita a la bodega del contratista UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019, para realizar la verificación de los equipos en stock de la SDSCJ y Contratista; al igual que los elementos pendientes por devolver al almacén de la SDSCJ. A continuación, se amplía la información:

7.21.1 BIENES PROPIEDAD DE UTSMVC

En este ítem, se relaciona todos los equipos que son propiedad del contratista de mantenimiento. Ver el detalle en el anexo (INVENTARIO EQUIPOS UT-SMVC JULIO 2020.)

| EQUIPOS PROPIEDAD UTMVC | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------|
| No | EQUIPO | CANTIDAD |
| 1 | ACOPLES | 40 |
| 2 | CORONAS | 5 |
| 3 | TPLINK-S/N 2151448002447 | 1 |
| 4 | SW FIBRA 4 PTS S/N 015077A02627 | 1 |
| 5 | VENTILADORES | 9 |
| 6 | VARILLA SPT | 31 |
| 7 | FUENTES DE 24 VOLTIOS | 10 |
| 8 | DISCOS DUROS | 8 |
| 9 | CÁMARAS PTZ INDIGOVISIÓN | 9 |
| 10 | MONITOR SAMSUNG | 1 |
| 11 | TRANSFORMADOR | 9 |
| 12 | UPS 500WATT | 3 |
| 13 | UPS 1 KVA | 19 |

Tabla 226. Equipos propiedad UTMVC

7.21.2 BIENES PROPIEDAD DE LA SDSCJ

Para esta parte, se relaciona todos los equipos que son propiedad de La Secretaría Distrital Seguridad, Convivencia y Justicia. Ver el detalle en el anexo (INVENTARIO EQUIPOS UTMVC JULIO 2020/SDSCJ).

| EQUIPOS PROPIEDAD SDSCJ | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------|
| No | EQUIPO | CANTIDAD |
| 1 | BRAZOS ESTACION POLICIA | 2 |
| 2 | MONITORES 19" SAMSUNG | 37 |
| 3 | GABINETE MÉTALICO | 13 |
| 4 | DVR COLEGIOS | 3 |
| 5 | CÁMARA CTP SAMSUNG | 1 |
| 6 | UPS SIN BATERIA 500 WATT | 13 |
| 7 | UPS SIN BATERIA 1KVA POWEST TITAN | 5 |
| 8 | UPS SIN BATERIA 1KVA CDP | 6 |
| 9 | UPS SIN BATERIA 2KVA FENTON | 1 |
| 10 | UPS ALPHA 1KVA | 25 |
| 11 | TECLADOS JOYSTICK | 12 |
| 12 | GABINETE FORTEDE | 1 |
| 13 | INVERSORES PANEL SOLAR | 12 |
| 14 | GABINETES CIUDADANOS DESINSTALADOS | 4 |
| 15 | DEMARCADOR ETB | 4 |
| 16 | ROUTER ETB | 4 |
| 17 | FUENTE 24V | 1 |
| 18 | DOMO | 1 |
| 19 | UPS 1KVA CDP | 2 |
| 20 | TRANSFORMADOR | 3 |

Tabla 227. Equipos propiedad SDSCJ

7.21.3 BIENES PARA ENTREGAR ALMACEN DE LA SDSCJ

Para este ítem, se relaciona todos los equipos que son propiedad de la SDSCJ para dar de baja ya que sus términos de garantía han vencido y por lo tanto se debe devolver el equipo

al almacén de la SDSCJ. Ver el detalle en el anexo (UBICACIÓN EQUIPOS PENDIENTES POR ENTREGAR JULIO 2020).

| EQUIPOS PENDIENTES POR DEVOLUCIÓN ALMACÉN SDSCJ | | |
|---|-------------------------------------|----------|
| No | EQUIPO | CANTIDAD |
| 1 | DOMO BOSCH | 41 |
| 2 | DOMO INDIGOVISIÓN IR | 52 |
| 3 | DOMO INDIGOVISIÓN 520-EVR-30X | 18 |
| 4 | DOMO INDIGOVISIÓN 510 | 14 |
| 5 | DOMO INDIGOVISIÓN ULTRA 2K | 24 |
| 6 | DOMOS SAMSUNG COLEGIOS | 64 |
| 7 | FIBRIDGE | 5 |
| 8 | CÁMARAS FIJAS | 13 |
| 9 | CODIFICADOR | 59 |
| 10 | UPS 1KVA CDP | 8 |
| 11 | UPS 1KVA POWEST TITAN | 4 |
| 12 | SWITCH QP-COM | 2 |
| 13 | SWITCH-DELL | 3 |
| 14 | DVR COLEGIOS | 4 |
| 15 | FUENTES DE CÁMARA | 42 |
| 16 | JOYSTICK TECLADO COLEGIOS | 9 |
| 17 | DISCOS DUROS 1TB | 18 |
| 18 | CÁMARAS FIJAS DE TRANSMILENIO | 4 |
| 19 | CÁMARAS VANDALIZADAS | 7 |
| 20 | CELDAS DE PANEL SOLAR DESINSTALADOS | 39 |
| 21 | BATERIAS DE PANEL SOLAR | 24 |
| 22 | TARJETAS SNMP | 9 |
| 23 | BRAZOS | 10 |
| 24 | TRANSFORMADOR | 17 |

Tabla 228. Elementos o equipos a reintregar almacén de la SDSCJ

7.22 MESA DE AYUDA

La Interventoría realizó la verificación de funciones de la MESA DE AYUDA implementada por la UT SMVC; como resultado se obtuvo lo siguiente:

La mesa de ayuda cuenta con 3 ingenieros en 3 turnos de 8 horas distribuidas de la siguiente manera: de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. de lunes a domingo. Esta actividad se está realizando desde el inicio del contrato 780 de 2019 hasta la fecha del presente informe.

Por asunto de emergencia sanitaria (COVID-19), la secretaria autorizó el uso de una VPN para soporte remoto, siendo instalada en el equipo de mesa de ayuda del contratista; teniendo en cuenta que en las instalaciones de C4 limitaron el acceso del personal a una persona por turno; generando así desplazamiento hacia COSECs de más personal del contratista

El perfil profesional de los ingenieros con los que cuenta la mesa de ayuda, se ajusta con las condiciones descritas en el anexo 1 – Especificaciones técnicas del contrato 780 de 2019, las cuales son (no obstante, la interventoría solicitó al contratista que, de realizar cambios en el personal, hicieran llegar las hojas de vida a la oficina de la interventoría con el fin de verificar dicha información):

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

- ✓ Una (1) certificación de capacitación o entrenamiento técnico en SecurOS ISS, expedida por el fabricante.
- ✓ Una (1) certificación de capacitación o entrenamiento técnico en PIVOT3, expedida por el fabricante.
- ✓ Una (1) certificación de capacitación o entrenamiento técnico en redes, routing, switching, ITIL, CCNA, CCNP o Procera, expedida por el fabricante.
- ✓ La mesa de ayuda cuenta con 2 líneas telefónicas y planes de datos que suman 10G, una estación de trabajo con capacidad de visualizar y gestión de las cámaras desde el C4; adicionalmente, cuenta con un canal de ancho de banda de 20 Megas para el acceso a la plataforma WEB.
- ✓ La mesa de ayuda envía reportes diarios con la bitácora de actividades, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la interventoría.
- ✓ La mesa de ayuda envía actualmente reporte cada 4 horas con la cantidad de cámaras en estado Off Line y estado On-Line.

De lo anterior, se manifiesta que, en el mes de julio de 2020, no se presentó ningún cambio por parte del contratista de mantenimiento UT SERVICIOS MNTO VIGILANCIA CIUDADANA 2019, con respecto al personal de mesa de ayuda y se verificó mediante acta de seguimiento 126 del 30 de julio de 2020.

7.23 APLICATIVO WEB

La interventoría realizó la verificación del cumplimiento del aplicativo WEB de acuerdo con las obligaciones contractuales establecidas en el Anexo 4 – Especificaciones Técnicas del aplicativo WEB para el seguimiento y control del sistema de videovigilancia; de la cual, a lo largo de la ejecución se han obtenido las siguientes conclusiones y observaciones:

REUNIÓN DE VERIFICACIÓN APLICATIVO WEB REALIZADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2020

El 30 de julio de 2020, se realiza video llamada con el contratista de mantenimiento UT SMVC e Interventoría quienes al final de la presente acta registran sus nombres y cargos, con el fin de hacer seguimiento al proyecto.

La interventoría se permite informar al contratista UTSMVC, que con respecto al aplicativo web GLPI, cumple con los entregables que debe generarse por parte del aplicativo web GLPI, de acuerdo al Anexo 4, del Contrato No. 1020-2019.

La interventoría se permite validar el cumplimiento:

| REPORTES GENERADOS POR LA APLICACIÓN GLPI | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---------------|------------------|
| Hoja de vida de un punto, de una ubicación o de un subsistema. | X | |
| Hoja de vida de todos los puntos, de todas las ubicaciones o de todos los subsistemas. | X | |
| Estado del sistema de video vigilancia por localidad, por subsistema o por proyecto/contrato. | X | |
| Listado de puntos sin visualización con su respectivo diagnóstico, código SDSCJ y ubicación (localidad y georreferencia). | X | |
| Listado de tickets abiertos y cerrados durante un periodo específico, detallando el punto o ubicación con su diagnóstico, código sdscj y ubicación (localidad y georreferencia). | X | |
| Listado de elementos utilizados de la bolsa de recursos durante un periodo específico, detallando fecha de utilización, valor, punto o ubicación relacionada con código sdscj y ubicación (localidad y georreferencia). | X | |

| | | |
|---|---|--|
| Listado de visitas de mantenimiento ejecutadas durante un periodo específico, detallando fecha de ejecución, valor, punto o ubicación relacionada con código sdsj y ubicación (localidad y georreferencia). | X | |
|---|---|--|

Tabla 229. Reportes generados por la aplicación GLPI

Se recomienda a la SDSCJ realizar el seguimiento periódico de la plataforma GLPI y sus entregables, en caso de que este se siga usando. Lo anterior teniendo en cuenta que las empresas que conformaron la UT-Servicios Mantenimiento Vigilancia Ciudadana 2019, en la actualidad tienen adjudicado el contrato de mantenimiento bajo el nombre de la Unión Temporal Mantenimiento Bogotá 2020. El entregable del aplicativo web, se relaciona en el acta de seguimiento final No 59 del 30 de julio de 2020, en la cual se aprueba el contenido de dicho entregable.

7.24 SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y MEDIO AMBIENTE

Como parte de las obligaciones del Consorcio Smarty - Scain 2019, se realizaron acompañamientos que permitieron identificar, verificar y exigir a UNION TEMPORAL SERVICIOS DE MATENIMIENTO VIGILANCIA CIUDADANA (UTSMVC). las acciones correctivas necesarias para que la ejecución de cualquier actividad relacionada con el proyecto sea segura.

7.24.1 Objetivo.

Reportar los aspectos en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de la empresa UNION TEMPORAL SERVICIOS DE MATENIMIENTO VIGILANCIA CIUDADANA (UTSMVC) que se presentan durante el desarrollo de las actividades ejecutadas del mes de julio del 2020.

7.24.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

7.24.2.1 Equipo de trabajo del implementador

Conforme a la ejecución de las labores realizadas por UNION TEMPORAL SERVICIOS DE MATENIMIENTO VIGILANCIA CIUDADANA (UTSMVC). dentro del periodo anteriormente mencionado, la interventoría realizó el acompañamiento respectivo en campo, supervisando, recomendando y exigiendo que los vehículos y el personal del contratista cumplan con la normatividad legal nacional vigente aplicable en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente acorde a las actividades de **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**.

En consecuencia, de lo anterior, la interventoría relaciona el listado de acompañamiento realizado, los hallazgos encontrados y las acciones llevadas a cabo para prevenir, mitigar y corregir cualquier situación que pueda generar un riesgo laboral o ambiental.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| FECHA | LUGAR | PUNTO | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | CONCEPTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|------------|----------------|--------------|--|---|---|
| 02/07/2020 | TEUSAQUILLO | ESU-164 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. |  |
| 02/07/2020 | USME | SCJ17050086 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. NO SE IMPLEMENTA P.M.T, SE REALIZA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. SE DETIENEN ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN EL PUNTO |  |
| 03/07/2020 | CIUDAD BOLÍVAR | SCJ17E190015 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE, TENIENDO EN CUENTA QUE ES VISITA CONJUNTA CON ETB Y CODENSA. |  |
| 06/07/2020 | KENNEDY | 350-4985 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. |  |
| 06/07/2020 | KENNEDY | P93 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. |  |
| 07/07/2020 | BOSA | ALB12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. |  |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| FECHA | LUGAR | PUNTO | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | CONCEPTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|------------|---------------|--------------|--|--|---|
| 07/07/2020 | BOSA | PAQ10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. |  |
| 08/07/2020 | FONTIBÓN | AL243 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. NO SE IMPLEMENTA P.M.T. SE REALIZA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. |  |
| 08/07/2020 | PUENTE ARANDA | AL1956 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA DOS JUEGOS DE SEÑALES MÓVILES PARA EL P.M.T. |  |
| 08/07/2020 | SAN CRISTÓBAL | CVID21724 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. |  |
| 08/07/2020 | LOS MÁRTIRES | SCJ17E140018 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA DOS JUEGOS DE SEÑALES MÓVILES PARA EL P.M.T. |  |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| FECHA | LUGAR | PUNTO | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | CONCEPTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 09/07/2020 | CHAPINERO | ESTADIO EL CAMPIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE REALIZA LIMPIEZA DE CÁMARAS FIJAS DENTRO DEL CAMPIN UTILIZANDO ESCALERA. |  |
| 10/07/2020 | CHAPINERO | DOMO 050 ESTADIO EL CAMPIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE REALIZA LIMPIEZA DE DOMOS DENTRO DEL ESTADIO EL CAMPIN CON PÉRTIGA. |  |
| 10/07/2020 | CHAPINERO | DOMO 051 ESTADIO EL CAMPIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE REALIZA LIMPIEZA DE DOMOS DENTRO DEL ESTADIO EL CAMPIN CON PÉRTIGA. |  |
| 10/07/2020 | CHAPINERO | DOMO ST052 ESTADIO EL CAMPIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE REALIZA LIMPIEZA DE DOMOS DENTRO DEL ESTADIO EL CAMPIN CON PÉRTIGA. |  |
| 10/07/2020 | CHAPINERO | DOMO ST055 ESTADIO EL CAMPIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE REALIZA LIMPIEZA DE DOMOS DENTRO DEL ESTADIO EL CAMPIN CON PÉRTIGA. |  |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| FECHA | LUGAR | PUNTO | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | CONCEPTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|------------|----------------|--------------------------------|--|---|---|
| 10/07/2020 | CHAPINERO | DOMO ST56 ESTADIO EL CAMPIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE REALIZA LIMPIEZA DE DOMOS DENTRO DEL ESTADIO EL CAMPIN CON PÉRTIGA. |  |
| 13/07/2020 | CUIDAD BOLÍVAR | AL414 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA PMT TÍPICO #48 CON DOS JUEGOS DE SEÑALES MÓVILES. |  |
| 13/07/2020 | KENNEDY | CVID21921 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS NO CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA PMT TÍPICO #51 CON DOS JUEGOS DE SEÑALES MÓVILES, HACEN FALTA LAS SEÑALES MÓVILES DE BANDERERO, OBRA EN LA VÍA Y 30 KM. |  |
| 13/07/2020 | KENNEDY | PCE18965 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA PMT TÍPICO #48 CON DOS JUEGOS DE SEÑALES MÓVILES. SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES MÓVILES POR DESGASTE Y USO. |  |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| FECHA | LUGAR | PUNTO | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | CONCEPTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|------------|----------|--------------|--|---|---|
| 13/07/2020 | SANTAFÉ | SCJ17E030039 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA PMT TÍPICO #45. |  |
| 14/07/2020 | BOSA | FS_70119 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA PMT TÍPICO #2, CON AUXILIAR DE TRÁNSITO POR EL FLUJO DEL SITP YA QUE QUEDA CERCA EL PARQUEADERO. |  |
| 14/07/2020 | USME | MB154 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA PMT TÍPICO #2.. |  |
| 14/07/2020 | ENGATIVÁ | SCJ17E100043 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS NO CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA PMT TÍPICO #49, HACEN FALTA 13 CONOS YA QUE ESTE TÍPICO REQUIERE DE 25 CONOS. |  |
| 15/07/2020 | SANTAFÉ | CCEL04_011 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. TRASLADO DE POSTE | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA PMT TÍPICO #2. SE REALIZA TRASLADO DEL POSTE DE LA CÁMARA. SE DETIENEN ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN EL PUNTO. |  |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| FECHA | LUGAR | PUNTO | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | CONCEPTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|------------|------------------------|------------|--|---|---|
| 15/07/2020 | TUNJUELITO EL REDENTOR | ESU-201 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA PMT TÍPICO #49. |  |
| 16/07/2020 | PUENTE ARANDA | 350-5060 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA PMT TÍPICO #49. UBICANDO LA GRÚA SOBRE EL ANDÉN POR DISTANCIA DEL POSTE A LA VÍA VERIFICANDO QUE QUEDA EN PERFECTO ESTADO EL ADOQUÍN. |  |
| 16/07/2020 | SANTAFÉ | CCEL04_011 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA PMT TÍPICO #2. |  |
| 21/07/2020 | KENNEDY | AL201 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS NO CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA PMT TÍPICO #49, HACEN FALTA 13 CONOS YA QUE ESTE TÍPICO REQUIERE DE 25 CONOS Y ESTÁN EN MAL ESTADO. |  |
| 21/07/2020 | KENNEDY | AL1285 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. |  |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| FECHA | LUGAR | PUNTO | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | CONCEPTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|------------|----------------|---|--|---|---|
| 22/07/2020 | SUBA | CCEL11_053 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. |  |
| 22/07/2020 | KENNEDY | PCE20645 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA DOS JUEGOS DE SEÑALES MÓVILES PARA LA TIPOLOGÍA DEL PMT |  |
| 23/07/2020 | SANTAFÉ | CCEL04_011 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. |  |
| 23/07/2020 | CHAPINERO | FS.-0206 TORRE 3 SUR OCCIDENTE ESTADIO EL CAMPIN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE REALIZA ASCENSO POR TORRE UTILIZANDO ESLINGA EN Y. |  |
| 23/07/2020 | ANTONIO NARIÑO | SCJ17E150025 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA DOS JUEGOS DE SEÑALES MÓVILES PARA LA TIPOLOGÍA DEL PMT |  |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| FECHA | LUGAR | PUNTO | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | CONCEPTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|------------|----------------|--------------|--|---|---|
| 24/07/202 | BOSA | P362 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA DOS JUEGOS DE SEÑALES MÓVILES PARA LA TIPOLOGÍA #3 DEL PMT. |  |
| 24/07/2020 | BOSA | PAQ54 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. |  |
| 27/07/2020 | CIUDAD BOLÍVAR | AL505 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA TIPOLOGÍA #51 DEL PMT. |  |
| 27/07/202 | CIUDAD BOLÍVAR | AL2275 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA DOS JUEGOS DE SEÑALES MÓVILES PARA LA TIPOLOGÍA #3 DEL PMT. |  |
| 27/07/202 | SAN CRISTÓBAL | SCJ17E040117 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA TIPOLOGÍA #46 DEL PMT. |  |
| 28/07/2020 | CHAPINERO | FVS-1176 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA TIPOLOGÍA #2 DEL PMT. SE REALIZA TRASLADO DE EQUIPOS, CAMA Y |  |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| FECHA | LUGAR | PUNTO | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | CONCEPTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | GABINETE DE POSTE. | |
| 28/07/2020 | LOS MÁRTIRES | FVS-4218 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA TIPOLOGÍA #2 DEL PMT. |  |
| 28/07/2020 | SANTA FE | SCHO_3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. SE IMPLEMENTA TIPOLOGÍA #3 DEL PMT. |  |
| 29/07/2020 | KENNEDY | AL1278 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. NO SE IMPLEMENTA PMT YA QUE ES VÍA CERRADA Y ZONA DE HURTO, SE SEÑALIZA Y DEMARCA LA ZONA DE TRABAJO. |  |
| 29/07/2020 | BOSA | CCEAD_L7_23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. TENIENDO EN CUENTA QUE ES VISITA CONJUNTA CON ETB. |  |
| 30/07/2020 | LOS MÁRTIRES | SCJ17E140040 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. NO SE IMPLEMENTA PMT POR CARROS PARQUEADOS EN AMBOS COSTADOS DE LA CL 8, SE REALIZA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. |  |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.


| FECHA | LUGAR | PUNTO | ACTIVIDAD Y CONTRATISTA | CONCEPTO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------|--|---|
| 30/07/2020 | CIUDAD BOLÍVAR | SCJ17E190089 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO. U.T.S.M.V.C | ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD LEGAL NACIONAL VIGENTE. TENIENDO EN CUENTA QUE ES VISITA CONJUNTA CON ETB. SE DETIENEN ACTIVIDADES POR LLUVIAS EN EL PUNTO. SE IMPLEMENTAN DOS JUEGOS DE SEÑALES MÓVILES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TÍPICO #28. |  |

Tabla 230. Actividad de mantenimiento

Las evidencias fotográficas se muestran en el Anexo “Evidencias en Puntos” del proveedor UTSMVC.

Incidentes.

Durante algunos acompañamientos se identifica potencial peligro frente al incumplimiento en el área de seguridad y salud en el trabajo (PMT), durante la ejecución de actividades en campo en la locación Bogotá.

Por parte de la interventoría se genero las observaciones en las actas de inspeccion; las cuales se encuentra en la Carpeta de evidencias de puntos.

El día 13 de julio 2020, se identifica un potencial peligro frente al incumplimiento del PMT donde se evidencia tipología propuesta N° 51 sin señalización obra en la via, 30km y banderero en el punto CVID21921 acuerdo al PMT propuesto por el contratista y aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá. Por lo tanto, esta interventoria emite las observaciones en campo y genera no conformidad por PMT, el técnico firma el acta de inspeccion y realiza las actividades bajo su responsabilidad y propio riesgo (VER RUTA: 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\2.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO\ ANEXO EVIDENCIAS PUNTOS /JULIO 13)

El día 13 de julio 2020 se identifica un potencial peligro frente a la exigencia del uso de señalización en buen estado donde se le recomienda realice mantenimiento dado su uso y desgaste. (¿Obra en el via a cuantos metros?), el área de Seguridad dy Salud en el Trabajo de esta interventoria emite las observaciones en campo y genera recomendación frente a la señalización, el técnico firma el acta de inspeccion (VER RUTA: 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\2.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO\ ANEXO EVIDENCIAS PUNTOS /JULIO 13)



Ilustración 39. Evidencia fotografica de la novedad – señal desgaste

El día 14 de julio 2020 se identifica un potencial peligro en el punto SCJ17E100043 frente al incumplimiento del PMT donde el contratista propone el típico N° 49 debidamente aprobado con 25 conos por la Secretaria Distrital de Bogota y solo tienen 12 conos en el lugar, al consultar con los técnicos en campo indican no tener información por lo cual se indica la divulgación y capacitación en el PMT aprobado por la Secretaris Distrital de Movilidad el 10 julio 2020 (VER RUTA: 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\2.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO\ANEXO EVIDENCIAS PUNTOS /JULIO 14)

El día 21 de julio 2020 se identifica un potencial peligro en el punto AL201 frente al incumplimiento del PMT donde el contratista propone el típico N° 49 debidamente aprobado con 25 conos por la Secretaria Distrital de Bogota y solo tienen 12 conos en el lugar, adicionales conos en mal estado; aunque este típico fue aprobado para parques por la Secretaria Distrital de Movilidad se deja consignado en acta de inspección la importancia de tener los conos en buen estado (VER RUTA: 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\2.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO\ ANEXO EVIDENCIAS PUNTOS /JULIO 21)



Ilustración 40. Evidencia fotografica de la novedad

Accidentes de trabajo.

No se registra ocurrencia de accidentes para el mes de julio 2020, pero el día 22 julio 2020 según correo electrónico el contratista informa que uno de sus trabajadores quien realiza actividades en el C4 presenta prueba para COVID – 19 Positiva, por lo tanto, se

inicia cerco epidemiológico al interior de la interventoría y no se encuentra hallazgos para posibles contagios.

7.24.3 Observaciones y/o recomendaciones.

- ✓ Se recomienda contar en campo con la documentación requerida para la implementación del P.M.T. (Típicos y COI de preventivos aprobados). Es importante dar continuidad a la solicitud de COI para preventivos todos los jueves ante la Secretaría Distrital de Movilidad y Correctivos en el momento de la ocurrencia.
- ✓ Se sugiere la implementación completa del PMT correspondiente frente a la secretaria de Movilidad. (PMT vigente del 10 de julio 2020 al 9 septiembre de 2020). Las observaciones y exigencias frente a la implementación deben realizarse para evitar accidentes de trabajo a futuro o cancelación de actividades.
- ✓ Se recomienda capacitar y/o actualizar al personal en el plan de manejo de tráfico.
- ✓ Se sugiere iniciar con el cumplimiento del PMT en todas las actividades en campo conforme a lo establecido en su documento avalado por SMD. Tal como se les ha indicado frente al tiempo de alcance de las actividades solo se cuenta con hora de parqueo situación que deben subsanar el tiempo indicado no es suficiente.
- ✓ Se recomienda el mantenimiento o cambio de la señalización móvil por desgaste o daño con el fin de evitar accidentes. Frente a las situaciones de mantenimiento de señalización es conocido por el contratista mediante correos, actas de seguimiento y actas de no conformidades en campo.

7.24.4 Recepción y verificación de informes del contratista

A la fecha de corte del presente documento, el contratista de mantenimiento realizó la entrega del informe correspondiente al mes junio de 2020, para el cual la interventoría envió sus respectivas observaciones con consecutivo P136-UTMTO-01156-2020, el día 14 de julio 2020 y se aprobó una vez se subsanaron las novedades que presentaba el informe con consecutivo el día P136-UTMTO-01166-2020 el día 15 de julio de 2020.

El archivo se encuentra dentro de los anexos del informe mensual de la interventoría. Capeta Mantenimiento, subcarpeta Matriz De Control Con Soportes ((VER RUTA: 11. JULIO 2020\ANEXOS INFORME JULIO 2020\MANTENIMIENTO\4. OTROS ANEXOS\ ANEXO INFORME DE JULIO/INFORME JULIO)

7.25 ANÁLISIS DE RIESGOS

| CAUSA | EVENTO | CONSECUENCIA | GESTIÓN INTERVENTORÍA |
|---|---|--|---|
| EL NO CUMPLIMIENTO CON LOS PERFILES REQUERIDOS PARA INICIAR LAS | ES POSIBLE QUE NO SE CUMPLA CON LOS ENTREGABLES DE MESA DE AYUDA. | GENERAR UN NO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 780 DE 2019. | SE HA MANTENIDO COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA MANIFESTÁNDOLE SE ENTREGUE LAS HOJAS DE |

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

| CAUSA | EVENTO | CONSECUENCIA | GESTIÓN INTERVENTORÍA |
|---|--|---|--|
| ACTIVIDADES DE MESA DE AYUDA. | | | VIDA DEL PERSONAL QUE VA A ESTAR EN LA MESA DE AYUDA. |
| EL NO CUMPLIMIENTO CON EL APLICATIVO WEB, POR EL TIPO DE REPORTES QUE SE GENERAN POR MEDIO DE ESTE. | ES POSIBLE QUE NO SE CUMPLAN CON LOS REPORTES QUE EL APLICATIVO WEB GENERE, NO SE PUEDA LLEVAR UNA ADECUADA TRAZABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. | GENERAR UN INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO 780 DE 2019. NO PODER ENTREGAR REPORTES SOLICITADAS POR EL CLIENTE. | SE HA MANTENIDO COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA DONDE SE LE HA MANIFESTADO LOS REPORTES QUE DEBE GENERAR EL APLICATIVO WEB. |
| MALOS DIAGNÓSTICOS EN EL ESTADO DE VIDEO VIGILANCIA. | VISITAS A SITOS POR DIAGNÓSTICOS FALLIDOS. | ES POSIBLE QUE SE GENEREN PENALIZACIONES POR ANS POR LOS MALOS DIAGNÓSTICOS DE LA MESA DE AYUDA. | SE HA ENTREGADO AL CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO LOS CONTACTOS Y LOS PROTOCOLOS PARA REALIZAR EL ESCALAMIENTO DE LAS FALLAS DIAGNOSTICADAS. |
| DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA QUE SE PRESENTA EN EL PAÍS A CAUSA DEL COVID-19. | ES POSIBLE QUE NO SE LOGRE REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DADO QUE EJERCEN DIFERENTES VARIABLES, FRENTE A LOS ESTADOS DE SALUD Y LAS NUEVAS MEDIDAS SANITAS IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. | OCASIONARÍA UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | LA INTERVENTORÍA, SOLICITÓ PROTOCOLOS, PLANES DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO AL CONTRATISTA UNION TEMPORAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIGILANCIA CIUDADANA (UTSMVC) . FRENTE A COVID – 19 CON EL FIN DE PREVENIR Y MITIGAR CONTAGIO DEL PERSONAL. ASÍ, TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE AJUSTEN LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y EL PERSONAL. |
| EL CUMPLIMIENTO DEL PMT, FRENTE A LOS ENVIO DE PUNTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA GESTION COI. | ES POSIBLE QUE NO SE LOGRE REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS DADO QUE EJERCEN DIFERENTES VARIABLES, FRENTE A LA AUTORIZACION DE COI POR PARTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD. | OCASIONARÍA UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO FRENTE A LAS ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS | LA INTERVENTORÍA, SOLICITÓ PMT VIGENTE, COI PARA PREVENTIVOS Y COI PARA CORRECTIVOS PARA LA VALIDACION Y POSTERIOR ENVIO A LA SECREATRIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA AL CONTRATISTA UNION TEMPORAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIGILANCIA CIUDADANA (UTSMVC) . CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DOCUMENTO EMITIDO POR LA SECREATRIA DE MOVILIDAD, PREVENIR ACCIDENTES DE TRANSITO. ASÍ, TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE AJUSTEN LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO. |

Tabla 231. Analisis de riesgos

7.26 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ De los 5012 puntos de cámara que hacen parte del sistema de videovigilancia de Bogotá, al finalizar el mes de julio de 2020, hay 4808 puntos de cámara que se visualizan desde el C4, lo que representa el 95.93% de la totalidad del sistema. Es importante tener en cuenta que hay 110 puntos de cámara atribuidos a terceros; al retirar los 110 puntos de cámara atribuidos a terceros del estado del sistema, los puntos de cámara a ser evaluados son de 4902, de estos se encuentran visualizados 4808 representando el 98.08%, estando fuera de servicio 94 puntos de cámara lo que representa el 1,92%, estos puntos son atribuibles a los diferentes contratistas encargados de su mantenimiento (ETB, CODENSA, UT SMVC Y TRANSMILENIO).
- ✓ Para el mes de julio de 2020, se realizó un total de 836 solicitudes de diagnóstico; se dio solución a 636 puntos quedando operativos, 200 solicitudes de diagnóstico que aún están en proceso, de acuerdo a la información contenida en la siguiente tabla y representada en la ilustración 41: Solicitudes de diagnostico

Complementando la información anterior de los 636 puntos se discrimina que los escalamientos fueron realizados así:

La interventoría dió la autorización para realizar la visita de mantenimiento correctivo a 231 puntos de cámara por parte de la UT-SMVC 2019.

La interventoría dió la autorización para realizar la visita de mantenimiento correctivo a 17 puntos de cámara por parte de CODENSA.

La interventoría dió la autorización para realizar la visita de mantenimiento correctivo a 11 puntos de cámara por parte de ETB.

Lo anterior es expuesto en la tabla 232 Clasificación de solicitudes de diagnostico.

| CLASIFICACIÓN | SOLICITUDES DE DIAGNOSTICO |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| OPERATIVO | 636 |
| EN PROCESO | 200 |
| TOTAL DE PUNTOS REPORTADOS | 836 |
| ESCALAMIENTOS | |
| ESCALADO CODENSA | 17 |
| ESCALADO ETB | 11 |
| AUTORIZADO (VISITAS) | 231 |

Tabla 232. Clasificación de solicitudes de diagnostico

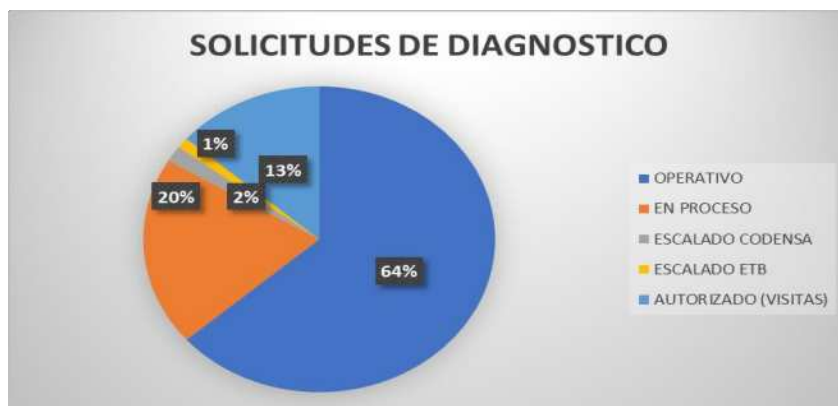


Ilustración 41. Solicitudes de diagnostico

- ✓ Los proyectos con mayor cantidad de diagnósticos solicitados a la UT SMVC es el proyecto Alcaldías con 310 puntos, lo que equivale al 38% de la totalidad de las solicitudes de diagnóstico y el proyecto 732 con 261 puntos de cámara, lo que equivale al 32% de la totalidad de las solicitudes de diagnóstico; el proyecto con menor solicitud de diagnóstico fue el proyecto Transmilenio con 56 puntos, lo que equivale al 7% de la totalidad de los diagnósticos solicitados; los puntos de cámaras reportados como Colegios, CAI, CTP, Centro de monitoreo son subsistemas, por lo cual no se toman como casos de menor solicitudes generadas para el mes de julio de 2020, la anterior información se encuentra contenida en la siguiente tabla y representada en la gráfica:

| CLASIFICACIÓN POR PROYECTO | SOLICITUDES DE DIAGNOSTICO POR PROYECTO |
|----------------------------|---|
| ESU | 63 |
| PROYECTO 350 | 64 |
| FVS | 62 |
| TRANSMILENIO | 56 |
| PROYECTO 732 | 261 |
| ALCALDIAS 601 | 310 |
| COLEGIOS | 5 |
| CAI | 2 |
| CENTRO DE MONITOREO | 12 |
| CTP | 1 |
| TOTAL | 836 |

Tabla 233. Clasificación de solicitudes por diagnostico en proyecto



Ilustración 42. Solicitudes de diagnostico por proyecto

- ✓ En el proyecto Alcaldías se solicitó el diagnostico de 310 puntos de cámara, los cuales 254 puntos están operativos lo que equivale a 60%, se encuentran 56 puntos de cámara en proceso de solucionar la novedad presentada; de acuerdo a la información contenida en la siguiente tabla y representada en la gráfica:

| PROYECTO ALCALDIAS | |
|---------------------------------|----------------------------|
| CLASIFICACIÓN | SOLICITUDES DE DIAGNOSTICO |
| OPERATIVO | 254 |
| EN PROCESO | 56 |
| ESCALADO ETB | 17 |
| ESCALADO CODENSA | 2 |
| AUTORIZADO (VISITAS) | 95 |
| DIAGNOSTICOS SOLICITADOS | 310 |

Tabla 234. Clasificación de solicitudes de diagnostico proyecto ALCALDÍAS



Ilustración 43. Solicitudes de diagnostico proyecto ALCALDÍAS

- ✓ En el proyecto TRANSMILENIO se solicitó el diagnóstico de 56 puntos, los cuales 35 puntos de cámara se encuentran operativos; los puntos solucionados remotamente son 34 los cuales realizaron configuración remota de los equipos; 21 puntos de cámara continúan en proceso de configuración o de ser visitados, de acuerdo a la información contenida en la siguiente tabla y representada en la gráfica:

| PROYECTO TRANSMILENIO | |
|---------------------------------|----------------------------|
| CLASIFICACIÓN | SOLICITUDES DE DIAGNOSTICO |
| OPERATIVO | 35 |
| EN PROCESO | 21 |
| AUTORIZADO (VISITAS) | 10 |
| DIAGNOSTICOS SOLICITADOS | 56 |

Tabla 235. Clasificación de solicitudes de diagnostico proyecto TRANSMILENIO

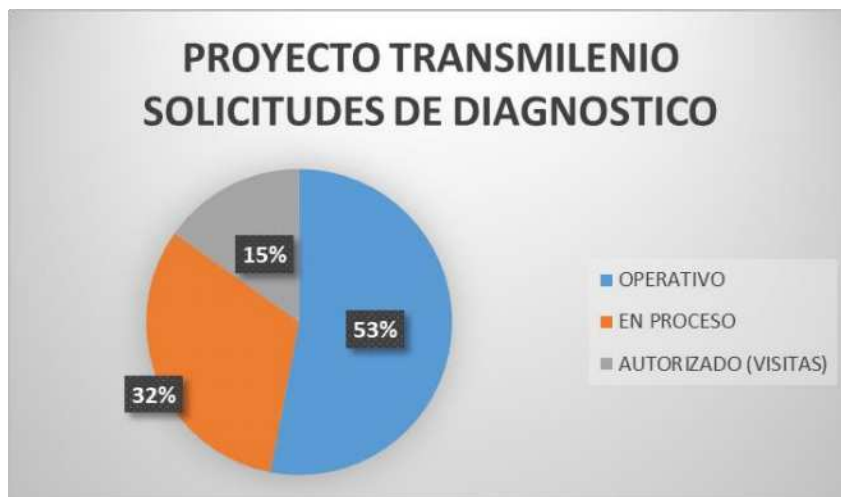


Ilustración 44. Solicitudes de diagnostico proyecto TRANSMILENIO

- ✓ La mayor falla encontrada en los diagnósticos solicitados a mesa de ayuda del contratista UTMVC es fuera de servicio con 447 puntos de cámara; 86 puntos de cámara con problemas de movilidad de PTZ y 127 puntos de cámara con problemas de visualización intermitente; las demás son en pequeñas cantidades no afectando en gran cantidad el estado del sistema; de acuerdo a la información contenida en la siguiente tabla:

| TIPO DE FALLA REPORTADA | |
|---------------------------------|-----|
| Fuera de Servicio (Fondo Negro) | 447 |
| Problema movilidad PTZ | 86 |
| Visualización Intermitente | 127 |
| Robotizado | 52 |
| Falla Stream de Visualización | 7 |
| Fuera de Servicio (Fondo Verde) | 3 |
| Imagen Morada | 10 |
| Imagen Oscura | 11 |
| Imagen Invertida | 5 |
| Ajustar Imagen | 20 |
| Pixelada | 14 |
| Mal apuntada | 2 |
| Sin Grabación | 2 |
| Sin Foco | 37 |
| Robotizada | 52 |
| Revisión punto de cámara | 3 |
| Ruido | 5 |
| Sincronización | 1 |
| Revisión punto de energía | 1 |
| Superposición de imágenes | 2 |

Tabla 236. Clasificación de fallas
