



**Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente**



REPORTE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Q1

Agencia Nacional de Compra y Contratación Pública -
Agencia Nacional de Contratación Pública

Grupo de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales

31 de marzo de 2025

Nota aclaratoria: este informe da alcance al informe del Q1 elaborado en el mes de abril de 2025. Se realizó ajuste al número de actividades programadas pasando de 44 a 45 en la vigencia 2025 (no estaba contabilizada la actividad 6 de la Subdirección de Negocios); también, a los porcentajes de avance del trimestre por dependencia, debido a que se ajustó la fórmula de cálculo del porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción 2025.

Los análisis y conclusiones que no incluían datos numéricos no fueron modificados.




CONTENIDO

- 1. Resumen Plan de Acción Institucional (PAI) 2025**
- 2. Cumplimiento PAI 2025 / Área de la ANCP-CCE**
- 3. Estado de Cumplimiento por dependencia PAI 2025**
- 4. Conclusiones de seguimiento - Segunda Línea de Defensa**

1. RESUMEN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI 2025


% Avance de ejecución

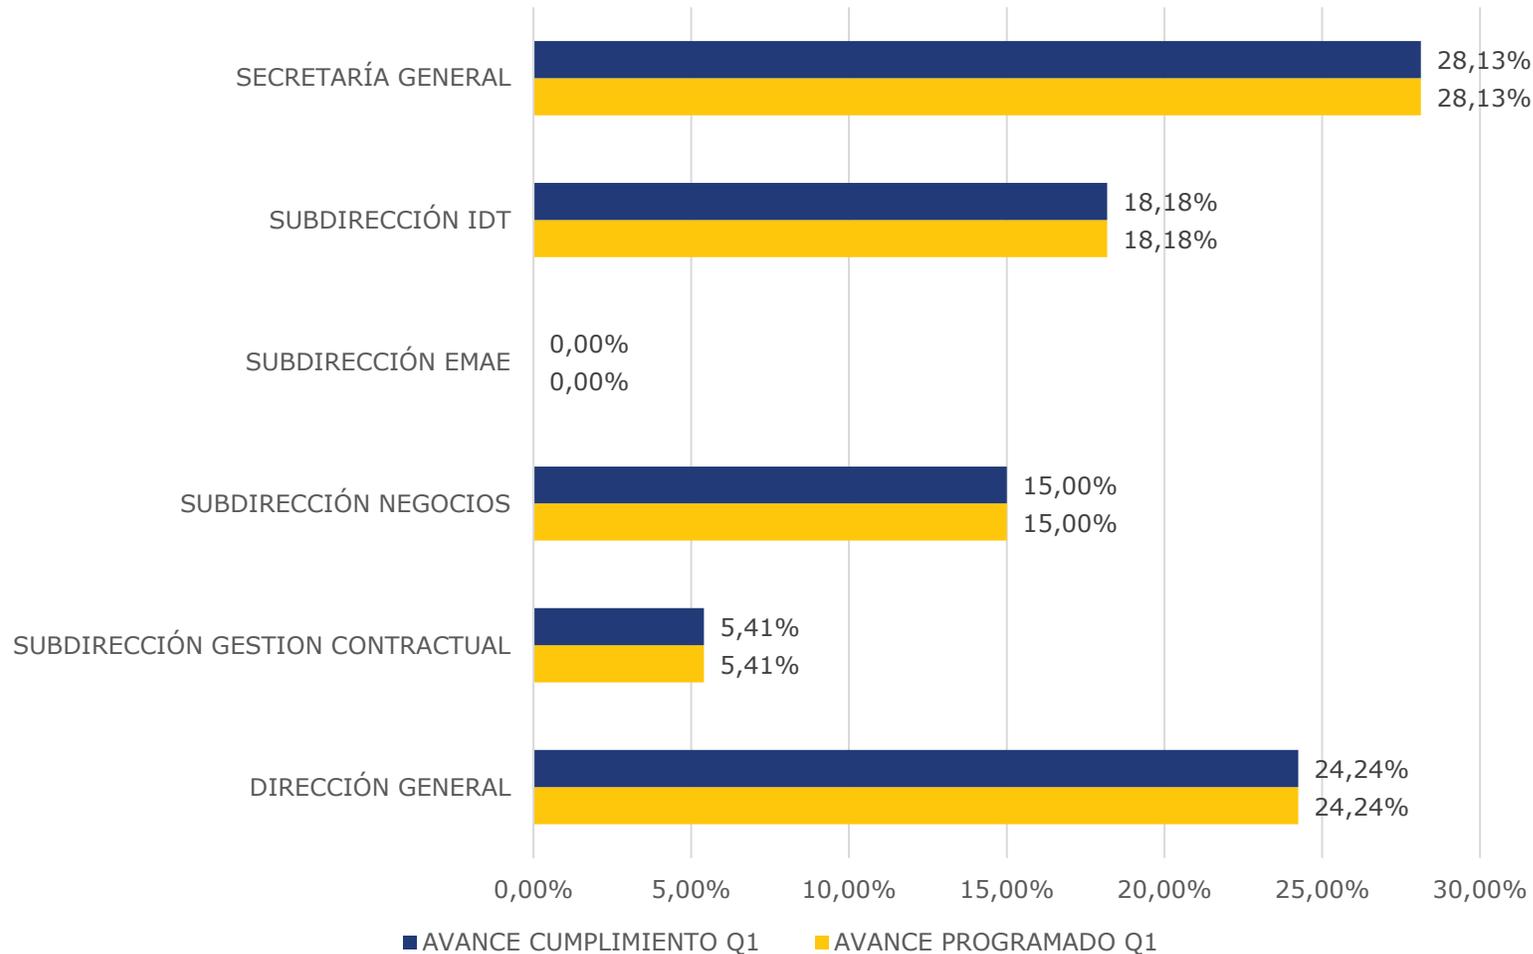

45
Acciones
programadas
en 2025

Total avance acumulado: 17,22%

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA PAI 2025

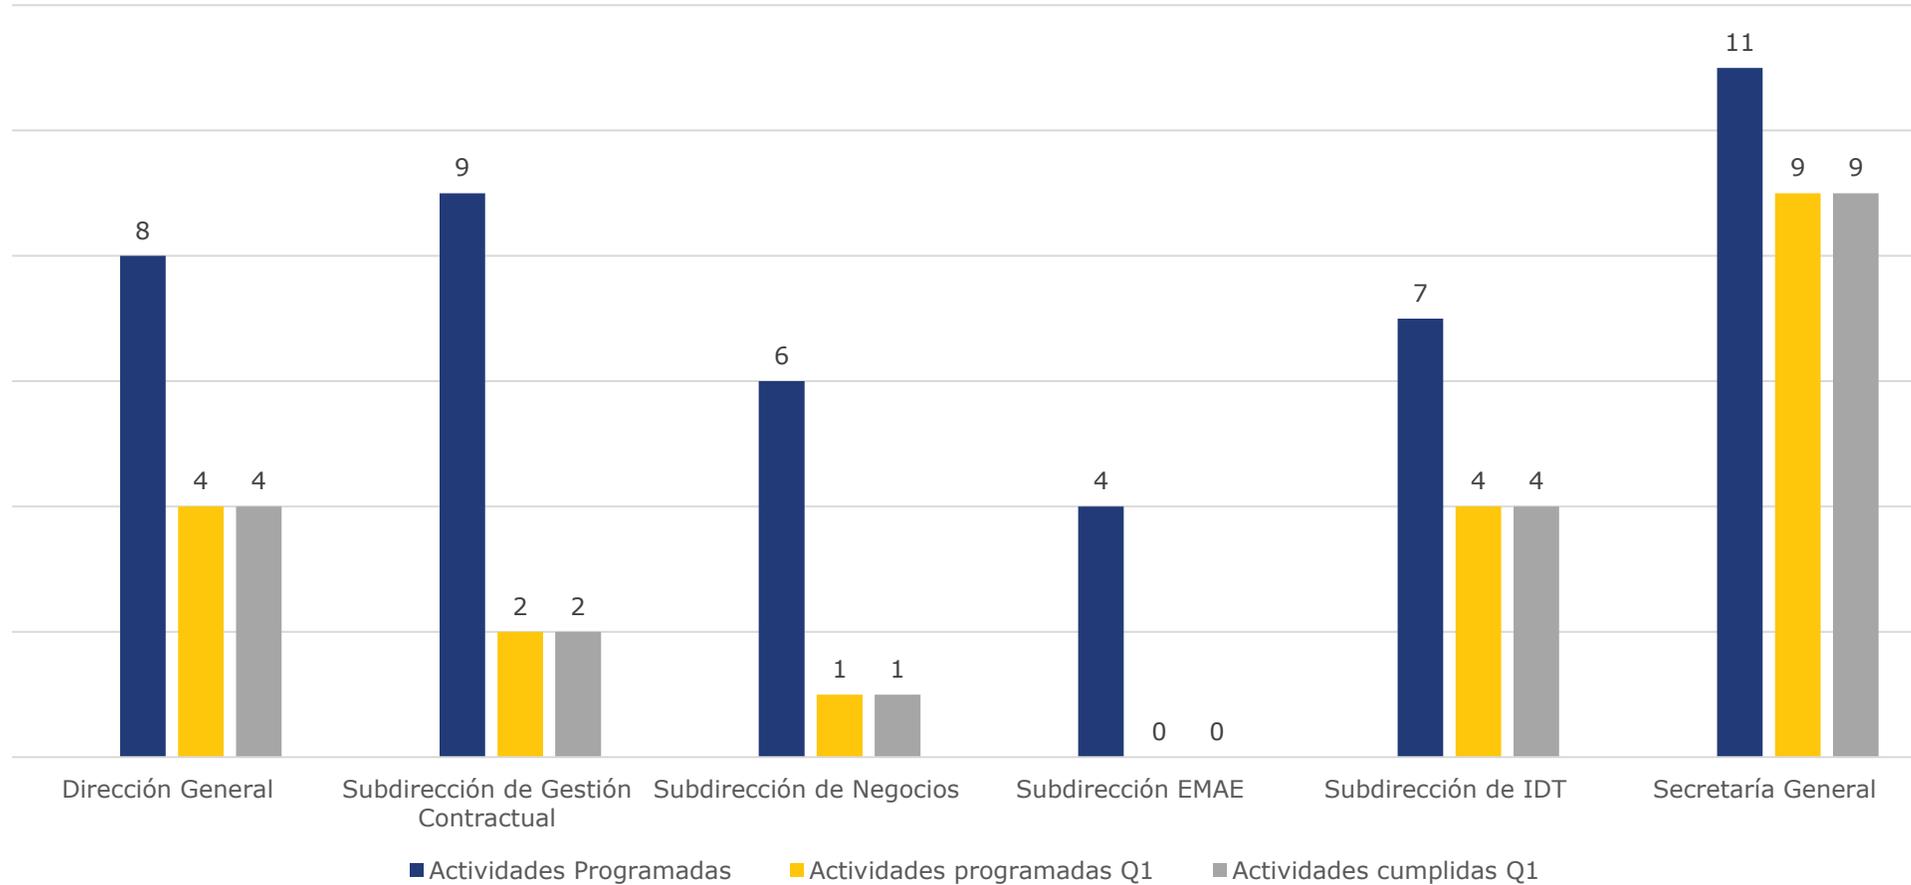

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA PAI 2025

| ID | Dependencia | Total acciones programadas 2025 | Actividades programadas Q1 | Actividades cumplidas 2025-Q1 | % Cumplimiento Q1 | % De avance acumulado por dependencia |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| DG | Dirección general | 8 | 4 | 4 | 100% | 24,24% |
| GC | Subdirección Gestión Contractual | 9 | 2 | 2 | 100% | 5,41% |
| SN | Subdirección de Negocios | 6 | 1 | 1 | 100% | 15,00% |
| EMAE | Subdirección de EMAE | 4 | 0 | 0 | No aplica | 0,00% |
| IDT | Subdirección de IDT | 7 | 4 | 4 | 100% | 18,18% |
| SG | Secretaría General | 11 | 9 | 9 | 100% | 28,13% |
| Total | | 45 | 20 | 20 | 100% | 17,22% |

CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA



2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2025

Dirección General

| ID | Producto/Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta Total | Unidad de Medida | Meta 1Q | Avance | % cumplimiento |
|------|--|---|----------|----------|------------|------------------|---------|--------|----------------|
| DG1 | Plan Estratégico de Comunicaciones | (1) Documento PEC PDF (4) Anexo Matriz de seguimiento | 7/01/25 | 31/12/25 | 5 | Número | 2 | 2 | 100% |
| DG2 | Elaborar informes de implementación de la estrategia de capacitaciones de la Entidad "Ruta de la Democratización de las Compras Públicas" | (1) Documento estrategia (4) Informes trimestrales de implementación. | 2/01/25 | 31/12/25 | 5 | Número | 2 | 2 | 100% |
| DG4 | Documentar el Sistema Integrado de Gestión | (1) Plan de trabajo (1) Matriz de partes interesadas necesidades y expectativas (1) Documento de Estrategia para la divulgación del SIG (1) Manual del SIG | 15/01/25 | 31/12/25 | 4 | Número | 1 | 1 | 100% |
| DG 8 | Formular, ejecutar, actualizar y evaluar el Plan Anual de Auditoría basada en riesgos 2025 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI . | (01) Plan Anual Auditoría basada en riesgos aprobado por el CICCI. (10) Monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría basada en riesgos 2025. (1) Informe de gestión de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2025 dirigido al CICCI, en donde se detallen las actividades ejecutadas por el equipo de Control Interno en cumplimiento de los roles designados por la normatividad vigente. | 2/01/25 | 31/12/25 | 12 | Número | 3 | 3 | 100% |

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2025

Subdirección de Gestión Contractual

2 Acciones

| ID | Producto/Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta Total | Unidad de Medida | Meta 1Q | Avance | % cumplimiento |
|-----|--|---|---------|----------|------------|------------------|---------|--------|----------------|
| GC4 | Indizar sentencias del Consejo de Estado que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública | (4) informes sobre sentencias del CE indizadas | 2/01/25 | 31/12/25 | 4 | Número | 1 | 1 | 100% |
| GC5 | Proyectar y revisar Conceptos Jurídicos. | (4) informes de Proyección y Revisión de Conceptos Jurídicos. | 2/01/25 | 31/12/25 | 4 | Número | 1 | 1 | 100% |

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2025

1 Acción

Subdirección de Negocios

| ID | Producto/Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta Total | Unidad de Medida | Meta 1Q | Avance | % cumplimiento |
|-----|--|--|---------|----------|------------|------------------|---------|--------|----------------|
| SN2 | Documentar la medición del porcentaje de proveedores de economía popular en el segmento de microempresa que participan en los mecanismos de agregación de demanda puestos en operación a partir del 2023 | (12) Reportes cualitativos mensuales de actores de la economía popular habilitados en los mecanismos de agregación de demanda (1) Documento anual que consolide la proporción de proveedores de economía popular (microempresas) incluidos en la TVEC, respecto a la totalidad de proveedores habilitados | 2/01/25 | 31/12/25 | 13 | Número | 3 | 3 | 100% |

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2025

Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico

| ID | Producto/Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta Total | Unidad de Medida | Meta 1Q | Avance | % cumplimiento |
|-------------|--|--|----------|----------|------------|------------------|---------|--------|----------------|
| IDT4 | Continuar con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | (1) Plan de trabajo y (3) informes trimestrales de avance | 15/02/25 | 15/12/25 | 4 | Unidad | 1 | 1 | 100% |
| IDT5 | Actualizar e implementar Plan Estratégico de Tecnologías -PETI | (1) Documento PETI (3) Informes trimestrales de avance | 15/01/25 | 15/12/25 | 4 | Unidad | 1 | 1 | 100% |
| IDT6 | Actualizar e implementar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | (1) Documento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (3) Informes trimestrales de avance | 15/01/25 | 15/12/25 | 4 | Unidad | 1 | 1 | 100% |
| IDT7 | Actualizar e implementar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y la Privacidad de la información | (1) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y la Privacidad de la información actualizado (3) Informes trimestrales de avance | 15/01/25 | 15/12/25 | 4 | Unidad | 1 | 1 | 100% |

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2025

Secretaría General

| ID | Producto/Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta Total | Unidad de Medida | Meta 1Q | Avance | % cumplimiento |
|------------|--|--|---------|----------|------------|------------------|---------|--------|----------------|
| SG2 | Formular y realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones -PAA | (1) Plan Anual de Adquisiciones publicado. (2) Informes de seguimiento al cumplimiento del PAA | 2/01/25 | 31/12/25 | 3 | Número | 1 | 1 | 100% |
| SG3 | Formular e implementar el Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos | (1) Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos (2) Informes semestrales de ejecución del Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos | 2/01/25 | 31/12/25 | 3 | Número | 1 | 1 | 100% |
| SG4 | Formular e implementar el Plan de manejo ambiental ANPCCE | (1) Documento plan de acción de manejo ambiental. (1) Informe de gestión anual del componente ambiental | 2/01/25 | 31/12/25 | 2 | Número | 1 | 1 | 100% |
| SG5 | Formular e implementar el Plan Estratégico de Talento Humano | (1) Plan Estratégico de Talento Humano (2) Informes semestrales de ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | 2/01/25 | 31/12/25 | 3 | Número | 1 | 1 | 100% |

2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2025

Secretaría General

| ID | Producto/Actividad | Entregable | Inicio | Fin | Meta Total | Unidad de Medida | Meta 1Q | Avance | % cumplimiento |
|-------------|---|---|---------|----------|------------|------------------|---------|--------|----------------|
| SG6 | Formular e implementar el Plan Institucional de Capacitación | (1) Plan Institucional de Capacitación (2) Informes semestrales de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | 2/01/25 | 31/12/25 | 3 | Número | 1 | 1 | 100% |
| SG7 | Formular e implementar el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos | (1) Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos (2) Informes semestrales de ejecución del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos | 2/01/25 | 31/12/25 | 3 | Número | 1 | 1 | 100% |
| SG8 | Formular e implementar el Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | (1) Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (2) Informes semestrales de ejecución del Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (1) Informe de evaluación del Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 2/01/25 | 31/12/25 | 4 | Número | 1 | 1 | 100% |
| SG9 | Implementar la Política de Gestión del Conocimiento | (1) Política de Gestión del Conocimiento (2) Informes semestrales de ejecución de la política de Gestión del Conocimiento | 2/01/25 | 31/12/25 | 3 | Número | 1 | 1 | 100% |
| SG11 | Monitorear con oportunidad las PQRSD de la Agencia. | (04) Informes trimestrales del cumplimiento de las PQRSD que se gestiona en la ANCP-CCE | 2/01/25 | 31/12/25 | 4 | Informe | 1 | 1 | 100% |

4. CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO

- El PAI 2025 cuenta con 45 actividades alineadas a los objetivos del Plan Estratégico Institucional. La ejecución de las veinte (20) actividades y los veintiséis entregables programadas **para el primer trimestre (Q1) de 2025 alcanzó un cumplimiento del 100%, representando un avance acumulado del 17,22%**. Esto refleja una planificación efectiva y una ejecución operativa oportuna.
- Se evidencian avances en temas clave como Comunicaciones, Talento humano, Gestión ambiental, Seguridad de la información y la Gestión del conocimiento, lo cual contribuye a la mejora en gestión institucional.
- Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se presentaron solicitudes de modificación de 2 actividades.

| No. | ID | FECHA DE SOLICITUD | Q PROGRAMADO DE LA ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE |
|-----|-------|--------------------|---------------------------|---|
| 1 | EMAE3 | 27/02/2025 | Q1 | Se modifica actividad, el entregable programado en Q1 [(01) Informe de la(s) Mesa(s) de trabajo con entidades estatales] y un entregable en el Q2 [(01) Documento que contiene recomendaciones para incentivar la compra de insumos, bienes y servicios locales en las compras estatales]. |
| 2 | GC2 | 17/03/2025 | Q4 | Se realiza la modificación de la actividad GC-02, por la necesidad de precisar la denominación del entregable asociado a la expedición de la circular externa. Inicialmente, el producto estaba definido como "Circular Única Expedida", mientras que en la actualización se requiere ajustar a "Circular Expedida", lo que permite una mayor claridad y alineación con las necesidades de los grupos de valor. |

- Se recomienda que las dependencias revisen mensualmente sus compromisos en el PAI, y las alertas realizadas por el grupo de planeación, y así puedan solicitar con oportunidad los ajustes en las actividades a las que haya lugar. Asimismo, es importante que se articulen y soliciten apoyo de las áreas que lo requieran para el cumplimiento de sus metas.



**Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente**

