CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Bogotá D.C., 03 AGO 2020

No. S-2020- _____ ARLOG-GUMOV 29.10

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Bogotá D C

Asunto: Informe de supervision Orden de Compra No. 46090-2020 Mes reportado JULIO

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
	FECHA:		FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCIÓN		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR TANQUETA LANZA AGUA	7M GROUP S.A.	Vigencia 2020 Principal Fecha inicio: 12/03/2020 Fecha deTermino: 30/10/2020	TANQUETAS	5	7,900,000,000.00			5	7,900,000,000.00	Informe ejecutivo avance de ejecución y ensamble de los vehículos tipo tanqueta para el mes de julio de la Orden de Compra No. 46090 (Comunicación oficial No. S-2020-022902/DIRAF-GUMOV-29 de fecha: 03/08/2020). Acta No. 279 / – DIRAF – GUMOV – 2.25 de fecha 30/07/2020, que trata de la reunión verificación avance de la fabricación de las tanquetas por parte de la empresa 7m group s.a., con el fin de supervisar la orden de compra no. 46090.
		VALOR TOTAL			7,900,000,000.00		-		7,900,000,000.00	

16. EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO CON LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES?		
	SI. X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL.	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL.	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
		Comunicación oficial No. S-2020-022902 / DIRAF-GUMOV-29 de fecha: 03/08/2020, Acta No. 279 / – DIRAF – GUMOV – 2.25 de fecha 30/07/2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Firma _____

Capitán LUIS DAVID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Cargo: Supervisior Orden de Compra No. 46090
Teléfonos: IP 20176

Elaborado por: CT. Luis David Rodriguez Hernandez
Fecha elaboración: 03/08/2020

S-2020-022914-DIRAF

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2020- 022902 / ARLOG – GUMOV .29

Bogotá D.C., 03 AGO 2020

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: informe de visita a la planta de fabricación tanqueta lanza agua mes de julio

En atención a la Orden de Compra No. 46090, cuyo objeto es la adquisición de tanquetas lanza agua para la Policía Nacional, suscrita a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos Blindados en Colombia CCE-561-1-AMP-2017, y debiendo realizar los controles de conformidad con las funciones de la supervisión establecidas en la Resolución 00090 del 15/01/2018, en mi calidad de supervisor de manera atenta informo a mi General, la actividad de visita a la planta donde se encuentran en fabricación los vehículos tipo tanqueta lanza agua, evidenciándose el avance de la ejecución de la orden de compra para el mes de julio de 2020, verificando que cumplan con las especificaciones y características técnicas del monocasco y el blindaje, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios en mención, así:

AVANCE FABRICACIÓN TANQUETAS

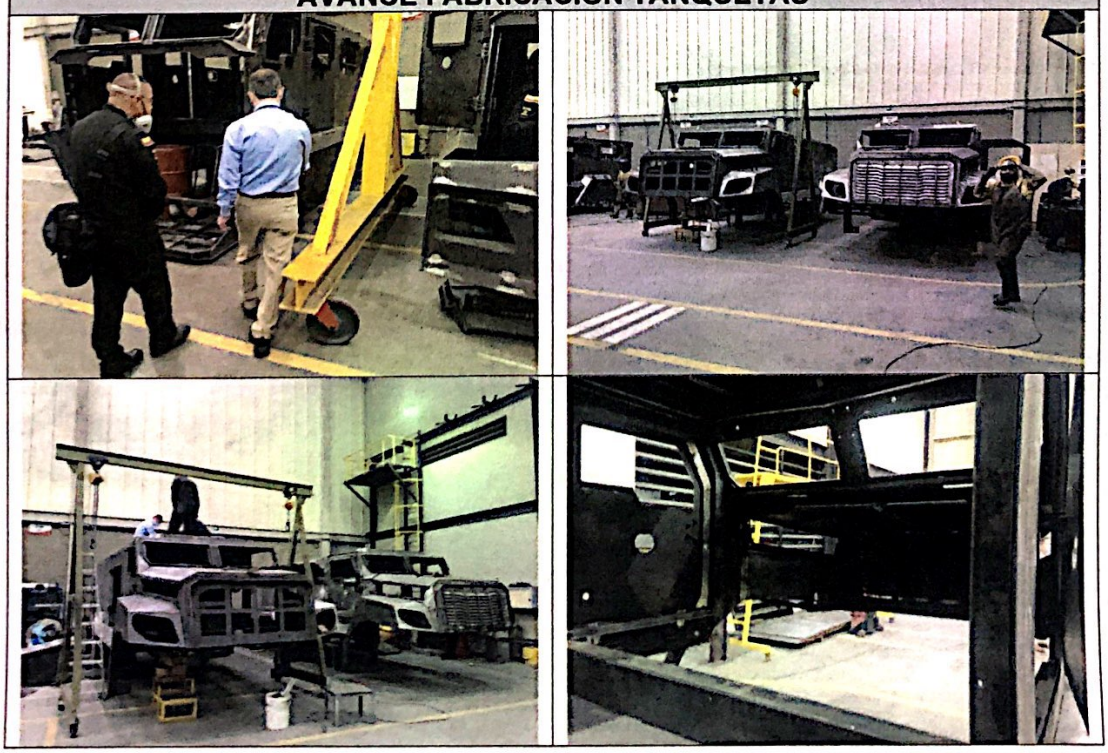

Escaneado con CamScanner

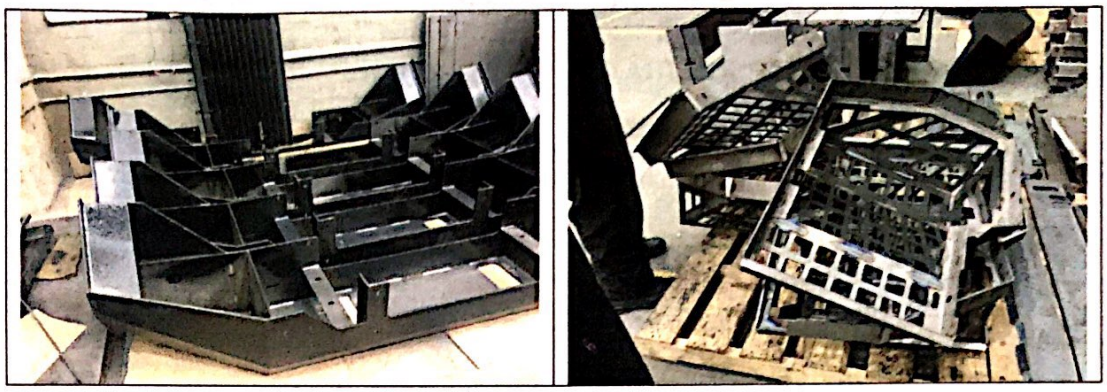

De lo anterior, informo a mi General que se contó con el acompañamiento del personal de la Unidad de los Escuadrones Móviles Antidisturbios, esto con el propósito de realizar el acompañamiento técnico y evidencien el avance de la construcción en esta etapa de la ejecución de la orden de compra en mención.

Atentamente,

Capitán **LUIS DAVID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**
Supervisor Orden de Compra No. 46090

Anexo: Acta No. 279 / – DIRAF – GUMOV – 2.25 de fecha 30/07/2020

Elaborado por: CT Luis David Rodríguez Hernández
Fecha de elaboración: 03/08/2020
Ubicación: Mis Documentos\Comunicaciones oficiales 2020

Calle 64G No. 90A-04 Barrio Álamos
Teléfonos: 5159000 ext. 20166
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha:	Bogotá D.C, 30/07/2020		
Hora de inicio:	**08:00**	**Hora de finalización:**	**10:00**
Lugar:	Instalaciones KOBE Centro Empresarial de Occidente bodega 27		

ACTA 279 / – DIRAF – GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA REUNIÓN VERIFICACIÒN AVANCE DE LA FABRICACIÓN DE LAS TANQUETAS POR PARTE DE LA EMPRESA 7M GROUP S.A., CON EL FIN DE SUPERVISAR LA ORDEN DE COMPRA No. 46090.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes.
2. Lectura del acta anterior.
3. Verificación de los compromisos.
4. Temas a tratar.

DESARROLLO

1. **Verificación de Asistentes**

Se procedió a la verificación de la asistencia del personal del ESMAD y el supervisor de la orden de compra y técnicos de la empresa 7M GROUP S.A., para dar inicio a la visita a la planta donde se realiza la fabricación de las tanquetas lanza agua en atención a la ejecución de la orden de compra No. 46090, con el fin de verificar el avance de fabricación de las mismas.

2. **Lectura del Acta anterior (No Aplica)**

3. **Verificación Compromisos (No Aplica)**

4. **Temas a Tratar**

Durante el desarrollo de la reunión se verificaron los siguientes puntos:

- Avance de la fabricación de las tanquetas lanza agua de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de vehículos blindados II" CCE-561-1-amp-2017.

- Presentación de los avances de la fabricación de las tanquetas lanza aguas y el diseño por parte de los ingenieros de la empresa 7M Group S.A.

- Fecha de la llegada de los chasis al país para iniciar el montaje de la carrocería de las tanquetas lanza agua.

- Cumplimiento de los plazos establecidos en el acuerdo marco de precios de los vehículos blindados.

- Seguimiento de manera mensual de la ejecución de la presente Orden de Compra.

- Fecha programada para la prueba balística ante INDUMIL y entrega de los resultados de las mismas.

Escaneado con CamScanner

- Explicación por parte del equipo técnico de ingenieros referente a la fabricación y ensamble de los sistemas neumáticos e hidráulicos de las tanquetas lanza agua.

COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Seguimiento al avance de la fabricación de las tanquetas lanza agua por parte de los técnicos de la empresa 7M Group.	7M Group y Policía Nacional	Permanente

CT. LUIS DAVID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Supervisor Orden de Compra No. 46090

Elaborado por: CT. Luis David rodriguez Hernández
Fecha de elaboración: 30/07/2020
Ubicación: Z:\PLANE/ACTAS

Calle 64G No. 90A 04
Teléfono(s) 5159000 ext 20176
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Escaneado con CamScanner

3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha:	Bogotá D.C, 30/07/2020		
Hora de inicio:	**08:00**	**Hora de finalización:**	**10:00**
Lugar:	Instalaciones KOBE Centro Empresarial de Occidente bodega 27		

ACTA 279 /– DIRAF – GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA REUNIÓN VERIFICACIÓN AVANCE DE LA FABRICACIÓN DE LAS TANQUETAS POR PARTE DE LA EMPRESA 7M GROUP S.A., CON EL FIN DE SUPERVISAR LA ORDEN DE COMPRA No. 46090.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
	Yona Jairo García Rivera	7M	yonn.garcia@7mcolombia.co	80011742	3123045317	
SI	Rosman Gonzalez Bonilla	ESMAD	rosman.gonzalez@correo.policia	80179270	3134313075	
PT	Hernán Camilo Padilla	ESMAD	hernan.padilla3095@correo.	1'019021439	3142844680	
PT	ALEXANDER PAEZ MARTINEZ	ESMAD	alexander.paez26707@correo.policia.	12.436707	3017611607	
PT.	YEISON JAVIER GAONA N.	ESMAD	YEISON.GAONA@correo.policia			
PT	Milton Jaime Ospino	ESMAD	Jaime.Ospino.7261@correo.	1744 7261	3184991950	
CT.	David Rodriguez	DIRAF-GUMOV	luis.rodriguez1218@correo	80282564	3213945727	

Carrera 59 No. 26-21 CAN
Teléfono(s) 5159000 ext 20176
Diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Escaneado con CamScanner
